



सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय
कैलाली



अर्ध वार्षिक समीक्षा गोष्ठी
आ.व. २०८२/०८३



स्थान: सभाकक्ष, आर्थिक मामीला मन्त्रालय, धनगढी, कैलाली
मिति: २०८२/१०/१२ र १३

प्रस्तुतकर्ता
ई. दीपक नेगी
कार्यालय प्रमुख

विषयसूची

परिचय

- कार्यालय परिचय
- स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

कार्यान्वयन

- वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था
- प्रमुख उपलब्धिहरू तथा प्रदेश गौरव र अन्य बहुवर्षीय आयोजनाहरू

समस्या, असल अभ्यास र सुझाव

- बेरुजु, सम्परीक्षण, कार्यान्वयनका समस्या तथा समाधान
- सुधारका प्रयास, नीतिगत/संस्थागत सहयोग अपेक्षा

कार्यालयको परिचय

समीक्षा गोष्ठी



3-4WD & 21-2WD



Rented



“सडक र सडक पुलको निर्माण मार्फत प्रदेशको दिगो विकास, समृद्धि र आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्ने”




Scope Area: All 13 Local Levels of Kailali District

IDO
Kailali



संगठन संरचना, दरबन्दी र पदपूर्ति अवस्था

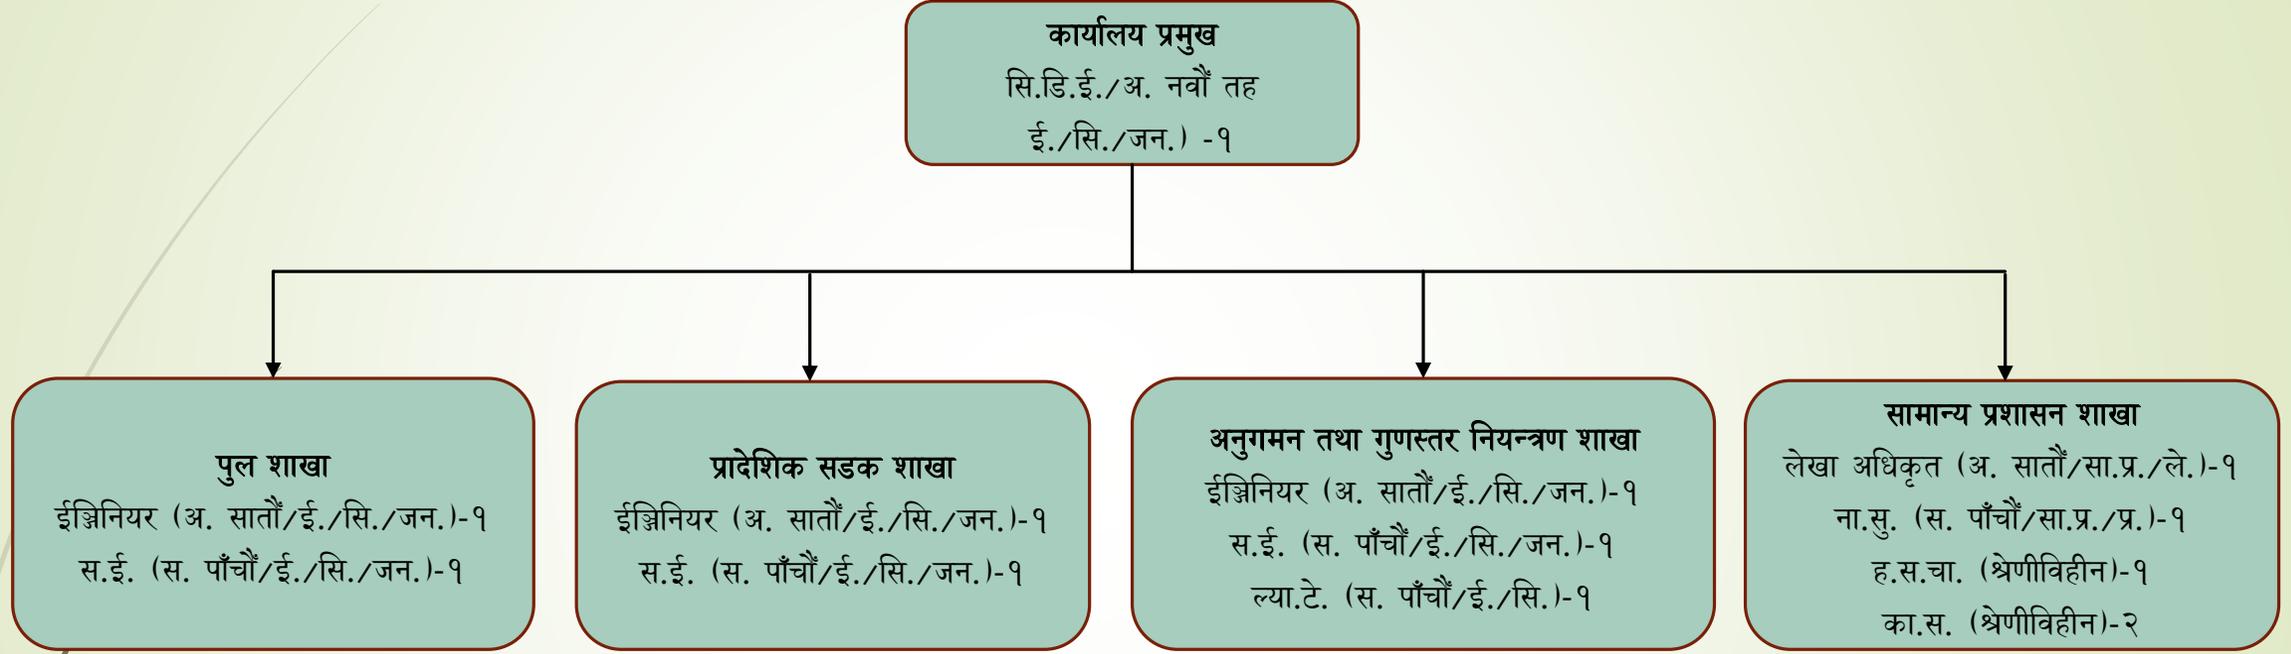

जम्मा स्वीकृत दरबन्दी संख्या: १३

संगठन संरचना, दरबन्दी र पदपूर्ति अवस्था

क्र.सं.	पद	सेवा/समूह	श्रेणी/तह	दरबन्दी संख्या	पदपूर्ति	रिक्त	कैफियत
१	सि.डि.ई	इन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/जनरल	रा.प. द्वितीय (अधिकृत नवौं/दशौं)	१	१	०	
२	ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/जनरल	रा.प. तृतीय (अधिकृत सातौं/आठौं)	३	३	०	१ जना संघीय काजबाट
३	लेखा अधिकृत	प्रशासन/लेखा	रा.प. तृतीय (अधिकृत सातौं/आठौं)	१	१	०	
४	सब ईन्जिनियर	इन्जिनियरिङ्ग/सिभिल/जनरल	रा.प.अनं. प्रथम (सहायक पाँचौं/अधिकृत छैठौं)	३	३	०	
५	ना.सु.	प्रशासन/सा.प्र.	रा.प.अनं. प्रथम (सहायक पाँचौं/अधिकृत छैठौं)	१	१	०	
६	ल्याब टेक्निसियन	इन्जिनियरिङ्ग/मेकानिकल	रा.प.अनं. प्रथम (सहायक पाँचौं)	१	१	०	
७	ह.स.चा.	इन्जिनियरिङ्ग/मेकानिकल	श्रेणी विहीन पाँचौं	१	१	०	करार
८	का.स.	प्रशासन/सा.प्र.	श्रेणी विहीन चौथो	२	२	०	करार
	जम्मा			१३	१३	०	

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम


समीक्षा गोष्ठी

कार्यक्रमगत बजेट			
सि.नं.	कार्यक्रम	स्वीकृत अन्तिम बजेट (रु. लाखमा)	कैफियत
१	३३७०१०१२३ पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१३७.५	प्रदेश
२	३३७०१०१२४ पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१७७५३	प्रदेश
३	३३७९११३८४ प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	२१७२	संघ
४	३३७९११३४४ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	२००	संघ
	जम्मा	२०२६२.५	

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

समीक्षा गोष्ठी

खर्च शिर्षकगत बजेट			
सि.नं.	कार्यक्रम	स्वीकृत अन्तिम बजेट (रू. लाखमा)	कैफियत
१	चालु बजेट	१३७.५	
२	पूँजीगत बजेट	२०१२५	
	जम्मा	२०२६२.५	




स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

समीक्षा गोष्ठी

आयोजना संख्यागत विवरण

■ संख्या ■ बजेट

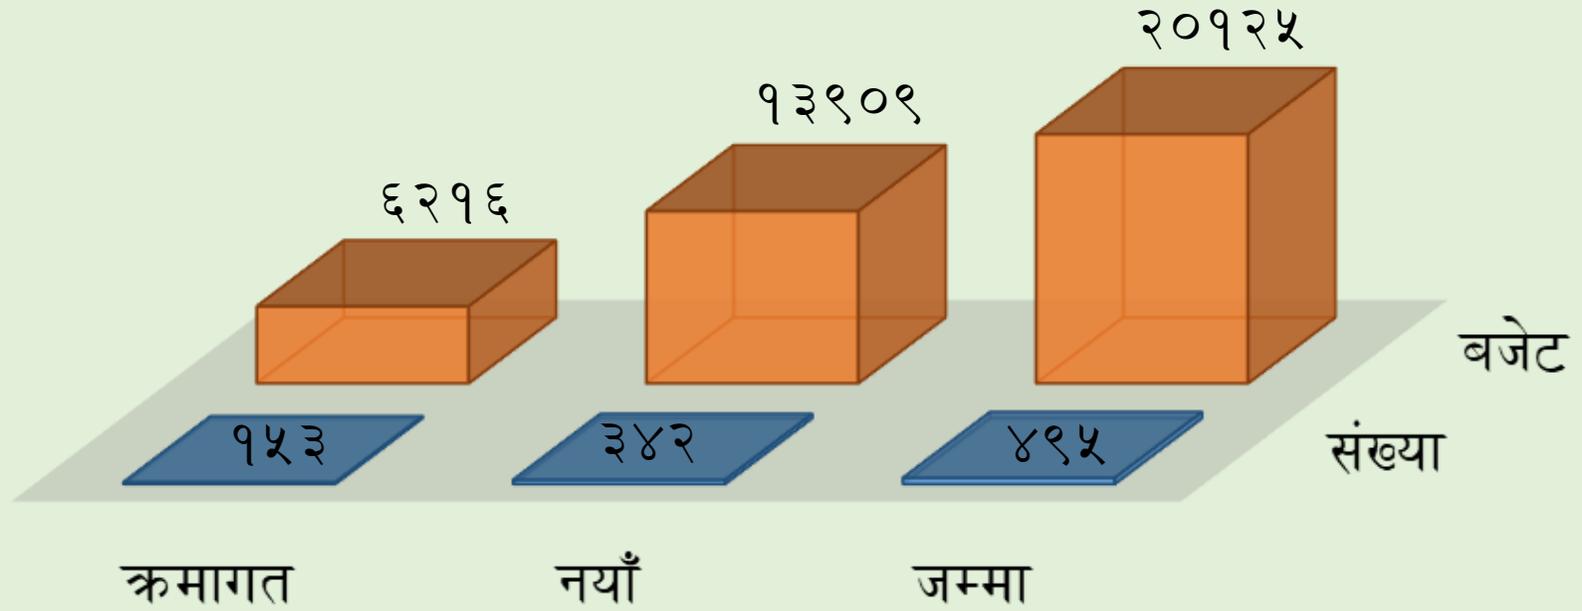


स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

समीक्षा गोष्ठी

आयोजना पूर्वाधारगत विवरण

सि.नं.	विवरण	आयोजना		आयोजना		कुल		कैफियत
		क्रमागत	बजेट (रु. लाखमा)	नयाँ	बजेट (रु. लाखमा)	संख्या	बजेट (रु. लाखमा)	
१	सडक	१४०	५२५१	३०२	१२७९९	४४२	१८०५०	
२	सडक पुल	१३	९६५	४०	१११०	५३	२०७५	
	जम्मा	१५३	६२१६	३४२	१३९०९	४९५	२०१२५	

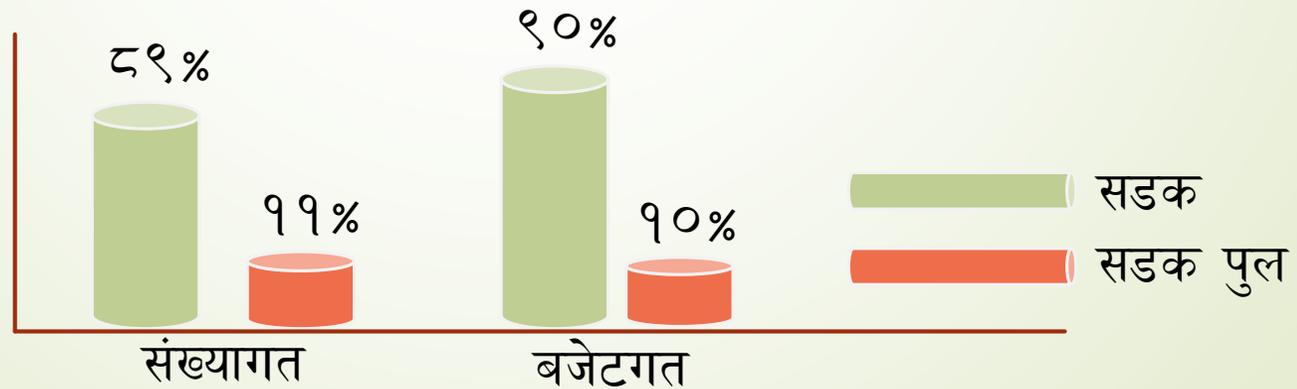

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

(बजेट रू. लाखमा)


समीक्षा गोष्ठी

आयोजना संख्यागत तथा बजेटगत विवरण (पालिकागत)

सि.नं.	पालिका	नयाँ आयोजना		क्रमागत आयोजना		जम्मा संख्या	जम्मा बजेट	क्षेत्रफल (बर्ग किमी)	बजेट घनत्व	योजना घनत्व	कैफियत
		संख्या	बजेट	संख्या	बजेट						
१	धनगढी	१४३	४२५३	५०	२०९६	१९३	६३४९	२७२	२३	०.७१	
२	गोदावरी	३३	१२००	१६	४०५	४९	१६०५	३०९	५	०.१६	
३	गौरीगंगा	२३	७७५	२०	३१८	४३	१०९३	२४४	४	०.१८	
४	घोडाघोडी	५	१०५	१०	१६४	१५	२६९	३५४	१	०.०४	
५	लम्कीचुहा	४२	१३८५	१३	१२०३	५५	२५८८	२२५	१२	०.२४	
६	टीकापुर	१५	२३५	७	१४१	२२	३७६	१२२	३	०.१८	
७	भजनी	६	२०५	४	११५	१०	३२०	१७६	२	०.०६	
८	चुरे	१०	२४१५	२	४८०	१२	२८९५	४९३	६	०.०२	
९	कैलारी	१६	४६८	५	१८२	२१	६५०	२३३	३	०.०९	
१०	मोहन्याल	१२	१२०५	१०	७३७	२२	१९४२	५५७	३	०.०४	
११	जोशीपुर	५	२०८	७	१४७	१२	३५५	६६	५	०.१८	
१२	बर्दगोरिया	१५	४२५	५	९६	२०	५२१	७७	७	०.२६	
१३	जानकी	१७	१०३०	४	१३२	२१	११६२	१०७	११	०.२	
	जम्मा	३४२	१३९०९	१५३	६२१६	४९५	२०१२५	३२३५	६	०.१५	

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

समीक्षा गोष्ठी

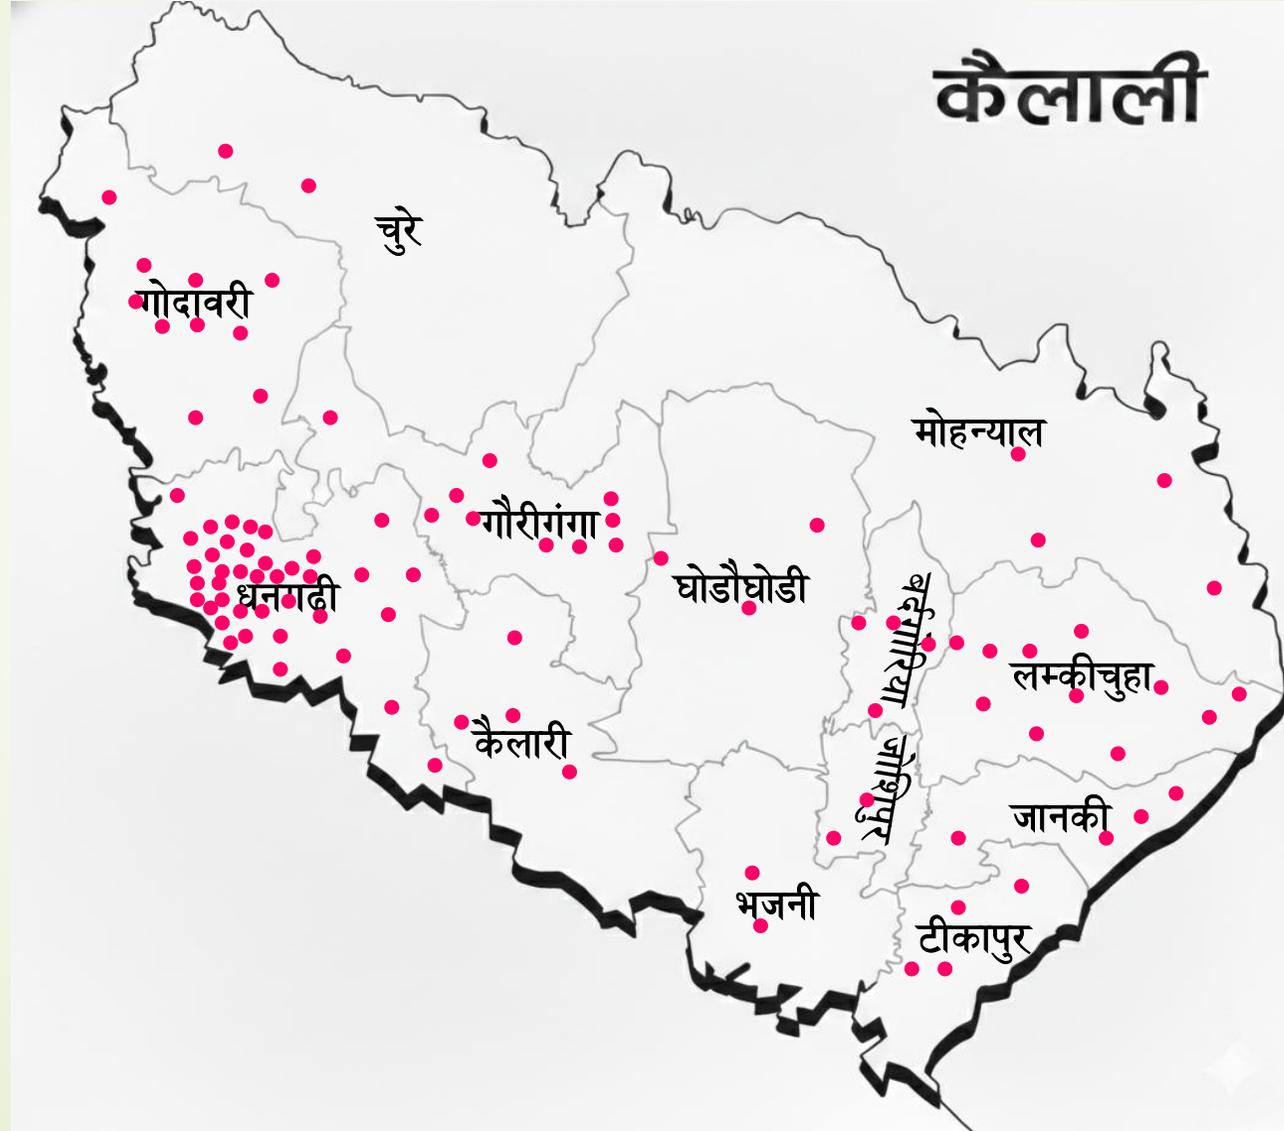

Top 3 in Budget

धनगढी	३२%
चुरे	१४%
लम्कीचुहा	१३%

Bottom 3 in Budget

घोडाघोडी	१.३%
भजनी	१.६%
जोशीपुर	१.८%

Key:
1 Dot=5 Projects

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम

समीक्षा गोष्ठी

क्लष्टर र १० लाखमूनी आयोजना संख्यागत विवरण (पालिकागत)

सि.नं.	पालिका	नयाँ आयोजना संख्या				कैफियत
		१० लाखमूनी	बजेट (रु. हजारमा)	क्लष्टरमा रहेका	बजेट (रु. लाखमा)	
१	धनगढी	१	३	५	२८०	
२	गोदावरी	४	९	४	३२५	
३	गौरीगंगा	३	९	२	२०५	
४	घोडाघोडी	१	१	०		
५	लम्कीचुहा	४	६	०		
६	टीकापुर	१	०	०		
७	भजनी	०		१	४५	
८	चुरे	२	३००	२	१४०	
९	कैलारी	०		१	४०	
१०	मोहन्याल	०		०		
११	जोशीपुर	०		०		
१२	बर्दगोरिया	०		०		
१३	जानकी	०		०		
	जम्मा	१६	३२८	१५	१०३५	

वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था

समीक्षा गोष्ठी


कार्यक्रमगत खर्च				
सि.नं.	कार्यक्रम	स्वीकृत अन्तिम बजेट (रु. लाखमा)	पुष महिनासम्मको खर्च (रु. लाखमा)	कैफियत
१	३३७०१०१२३ पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१३७.५	६१.८२	
२	३३७०१०१२४ पूर्वाधार विकास कार्यालयहरु	१७७.५३	२३.८८	
३	३३७९११३८४ प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (संघ सशर्त अनुदान)	२१७२	१८४	पेशकी
४	३३७९११३४४ स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना (संघ सशर्त अनुदान)	२००	०	
जम्मा		२०२६२.५	२६३३.८२	

वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था

समीक्षा गोष्ठी

बजेट शिर्षकगत खर्च

सि.नं.	कार्यक्रम	स्वीकृत अन्तिम बजेट (रू. लाखमा)	पुष महिनासम्मको खर्च (रू. लाखमा)	कैफियत
१	चालु बजेट	१३७.५	६१.८२	
२	पूँजीगत बजेट	२०१२५	२५७२	
	जम्मा	२०२६२.५	२६३३.८२	



वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था

समीक्षा गोष्ठी

सम्पन्न आयोजना संख्यागत विवरण				
सि.नं.	विवरण	आयोजना		कैफियत
		क्रमागत	सम्पन्न	
१	सडक	१४०	७३	
२	सडक पुल	१३	१	
	जम्मा	१५३	७४	४८%


वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था

समीक्षा गोष्ठी

ठेक्का व्यवस्थापन भएका आयोजना विवरण


सि.नं.	विवरण	नयाँ आयोजना		ठेक्का व्यवस्थापन भएका		ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी		कैफियत
		संख्या	बजेट (रू. लाखमा)	संख्या	बजेट (रू. लाखमा)	संख्या	बजेट (रू. लाखमा)	
१	सडक	३०२	१२७९९	२४६	८४०८	५६	५५०१	
२	सडक पुल	४०	१११०	५		३५		
	जम्मा	३४२	१३९०९	२५१	८४०८	९१	५५०१	

ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी विवरण

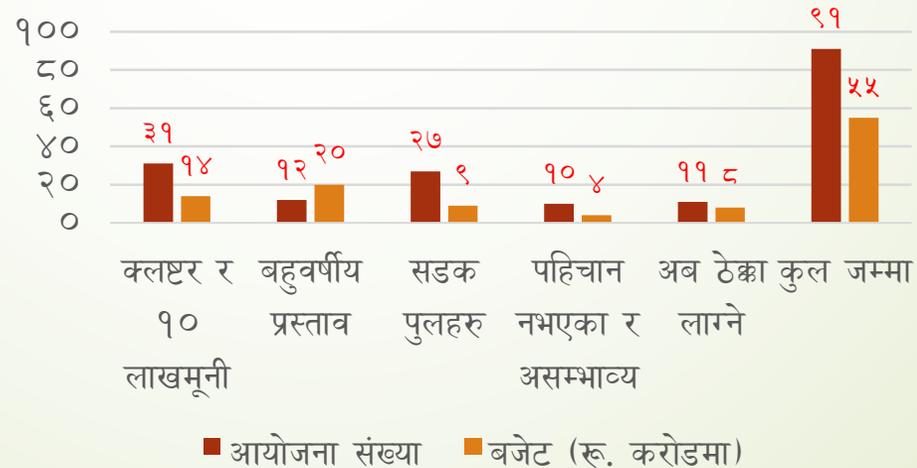

प्रमुख उपलब्धिहरू (Key Achievements)

समीक्षा गोष्ठी

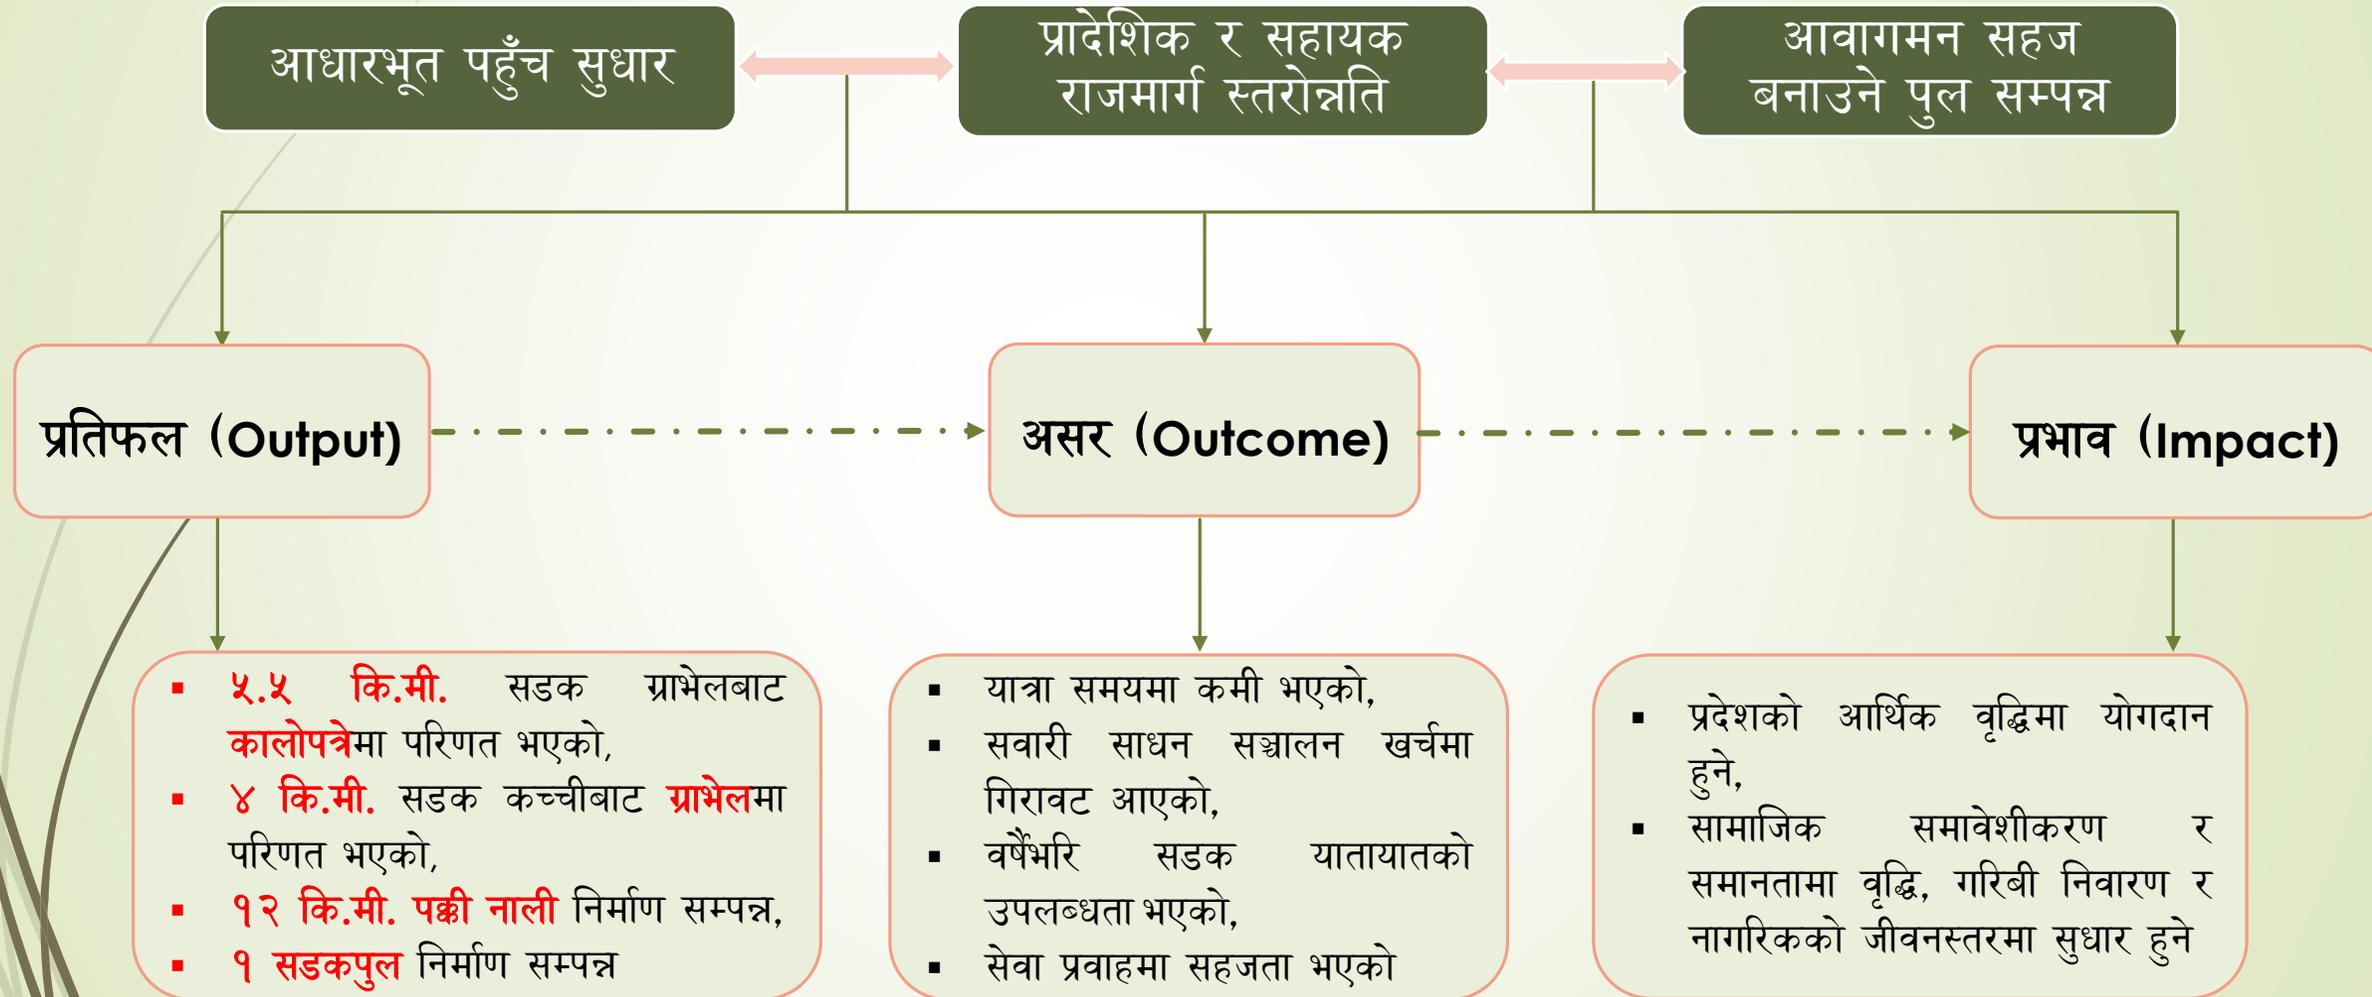

प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुको विवरण

समीक्षा गोष्ठी

रकम रु. लाखमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	सम्झौता म्याद	चालु आव विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	हालसम्मको खर्च	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	कैफियत
१	भजनी छोटीभन्सार खिमडी ठूलीगाड सडक	८८०	२०७७.४.१८	२०८२.०२.३०	०.०१	०	७९८	१००%	९०.७%	३.२ किमी कालोपत्रे सम्पन्न

वहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त अन्य आयोजनाहरूको विवरण

समीक्षा गोष्ठी

रकम रु. लाखमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	म्याद थप पछिको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	चालु आ.व. विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	हालसम्मको खर्च	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	बित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	कैफियत
१	कृष्ण मन्दीर देखि गोदावरी १२ बान्द्रे खाल सम्म सडक स्तरोन्नती गोदावरी नगरपालिका - वडा नं ३	५८४.२५	२०७७.०४.२४	२०८३.०३.२०	४०.००	०	२८४.००	६५	४८.६१	रुग्ण
२	कृष्ण मन्दीर देखि गोदावरी १२ बान्द्रे खाल सम्म सडक स्तरोन्नती गोदावरीनगरपालिका - वडा न ३	६६१.४१	२०७९.१२.१७	२०८२.०९.३०	४०.००	०	१४२.००	३०	२१.४७	रुग्ण
३	अण्डैया जाने बाटोमा सडक पुल कटनी नदी, गौरीगंगा नगरपालिका	५२८	२०७७.०३.३१	२०८१.०९.२०	५०.००	०	३८४.००	७४	७२.७३	रुग्ण
४	चौमाला पुरानो बजार नदीमा सडक पुल, कैलाली - गौरीगंगा नगरपालिका	७२३.८१	२०७७.०३.३१	२०८१.०३.२०	६०.००	०	३३०.००	५०	४५.५९	रुग्ण
५	सुर्मी नालामा पक्की पुल, कैलाली - कैलारी गाउँपालिका	४९६.९१	२०७७.०४.१८	२०८३.०३.२०	४०.००	०	३४३.००	७५	६९.०३	रुग्ण
६	कैलाली पुल देखि धनगढी ८ हुलाकी सडकको जिरो प्वाइन्ट सम्मको सडकधनगढी १२८ कैलाली	५३९३.८८	२०८०.०१.२७	२०८२.११.०१	२००.००	२००.००	५२००.००	९८	९६.४१	
७	शितलपुर सिमली सडक कालोपत्रे घोडाघोडी न.पा. ५	६८८.४१	२०७९.१२.१७	२०८२.१२.३०	५०.००	५०.००	१२७.००	३०	१८.४५	रुग्ण

वहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त अन्य आयोजनाहरूको विवरण

समीक्षा गोष्ठी

रकम रु. लाखमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	म्याद थप पछिको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	चालु आ.व. विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	हालसम्मको खर्च	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	बित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	कैफियत
८	चौकीडाडा कोल्मुडा हलौडे बयला फल्टुडे सडक स्तरोउन्नती गोदावरी र चुरे कैलाली	१३०.१९	२०८२.२.१९	२०८३.३.२०	५०.००	०	११.५०	२५	८.८३	
९	लालमाटी डोवाटा गर्वादरवार खैराला सडक, गौरिगंगा न पा , कैलाली	६३.०९	२०८२.०२.१९		५०.००	५०.००	६२.००	१००	९८.२७	
१०	पिपलचौतारा देखी यातायात कार्यालय सम्म बाटो निर्माण धुमनपा ५ कैलाली	१२२.०२	२०८२/०२/२०	०	५०.००	३२.६३	३२.६३	४५	२६.७४	
११	गोदावरी नगरपालिका वडा नं २ र ४ जोड्ने पुल	३७४.४७	२०८२/०३/२५		५०.००	०	३७.००	०	९.८८	
१२	शिवपुरमा पुल, गौरीगंगा	६९०.७६०	२०८२/०३/१९		५०.००	०	६०.००	२०	८.६९	
१३	जोशीपुर गा.पा. ५ घैला नालामा पक्कीपुल निर्माण जोशीपुर गा.पा. ५ कैलाली	२२२.६२०	२०८२/०३/१७		५०.००	०	१८.६८	१५	८.३९	
१४	चुहा देखि तोरीपुर जाने पथरिया नदीमा सडक पुल	४११.६४०	२०८२/०३/२०		५०.००	५०.००	८५.००	३५	२०.६५	
१५	कटनी नदीमा सडकपुल निर्माण कैलारी ७ रामपुर	६६६.७५०	२०८२/०३/१९		५०.००	५०.००	१०८.४६	४०	१६.२७	

वहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त अन्य आयोजनाहरूको विवरण

समीक्षा गोष्ठी

रकम रु. लाखमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	म्याद थप पछिको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	चालु आ.व. विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	हालसम्मको खर्च	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	बित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	कैफियत
१६	धर्मापुर गदरिया सडक पुल निर्माण, कैलाली - धनगढी उप महानगरपालिका - वडा न १८	२२९.६६०	२०८२/०३/१७		४०.००	०	१९.०८	३०	८.३१	
१७	वादे खोला सडकपूल, मोहन्याल गा पा, कैलाली	१२६०.९००	२०८२/०३/१७		२००.००	०	१११.१३	१०	८.८१	
१८	साघुरे खोला सडकपूल, मोहन्याल गा पा, कैलाली	११२१.६८०	२०८२/०३/१७		२५०.००	०	९८.८३	१५	८.८१	
१९	मोहना नदीमा पूल, गजरौला गोदावरी न पा ३ कैलाली र कृष्णपूर पा ५ कन्चनपूर, जोड्ने सडक पूल	४१२.०१०	२०८२/०३/२०		५०.००	०	३६.००	०	८.७४	
२०	चिसापानी सोल्टा सडक स्तरोउन्नती मोहन्याल	६०७.०००	२०८२/०३/१७		१५०.००	१५०.०००	२०३.९५	६०	३३.६०	
२१	लम्की खनेपानी देखी राजकाडा सम्म सडक कालोपत्रे लम्कीचुहा	४५६.९३०	२०८२/०३/१७		२००.००	५०.००	८९.३२०	३०	१९.५५	
२२	(केशर मार्ग) महेन्द्रराज मार्ग ईन्टेक हाईड्रो, कटासे खैरीफाटा जगतपुर हुदै टिकापुर तिन पालीका जोड्ने रणनैतीक मार्ग लम्कीचुहा	५६२.६७०	२०८२/०३/१७		२५०.००	७०.००	११९.०७०	३०	२१.१६	

वहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त अन्य आयोजनाहरूको विवरण

समीक्षा गोष्ठी

रकम रु. लाखमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	म्याद थप पछिको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	चालु आ.व. विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	हालसम्मको खर्च	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	बित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	कैफियत
२३	डुडेझारी टिकापुर सडक स्तरोउन्नती लम्कीचुहा नपा, जानकी गापा र टिकापुर, कैलाली	६०९.२१०	२०८२/०३/२५		२५०.००	०	०.००	१०	०.००	
२४	रुवस सडक तिनकुने चोक देखी हुलाकी सडक सम्म सडक स्तरोउन्नती वडा न २ धनगढी, कैलाली	१८९.७६०	२०८२/०३/२४		४०.००	३८.६०	७७.२०	४१	४०.६८	
२५	पुरानो भन्सार सडक तिल्केताल देखी हुलाकी सडक सम्म सडक स्तरोउन्नती वडा न २ धनगढी, कैलाली	१९१.४९०	२०८२/०३/१७		४०.००	१५.००	३०.००	३०	१५.६७	
२६	शिवपुरी चोक देखी तुल्सी चोक सम्म सडक स्तरोउन्नती वडा न ४ धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली	१९२.७८०	२०८२/०३/१९		४०.००	०	१६.३०	३०	८.४६	
२७	६ लेन सडक यातायात चोक देखी फाप्ला जाने सडक स्तरोउन्नती वडा न ३ धनगढी, कैलाली	२०५.१६०	२०८२/०३/१७		४०.००	३८.८००	५७.३४	३०	२७.९५	
२८	त्रिवेणी सडक शैलेश्वरी कलेज हुदै हुलाकी सडक सम्म सडक स्तरोउन्नती वडा न १ धनगढी कैलाली	२७८.५४०	२०८२/०३/१७		४०.००	०	२२.८०	३५	८.१९	

वहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त अन्य आयोजनाहरूको विवरण

समीक्षा गोष्ठी

रकम रु. लाखमा

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	म्याद थप पछिको सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति	चालु आ.व. विनियोजन	अर्धवार्षिक खर्च	हालसम्मको खर्च	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	बित्तिय प्रगति (प्रतिशत)	कैफियत
२९	लम्कीचुहा रिडरोड (जानकी गा पा को सिमाना अमौरा थापापुर चौरि चाकावाडी हुदै सेतीलोक मार्ग सम्म)	४३९.६५०	२०८२/०३/१७		३००.००	०	३८.१९०	१५	८.६९	
३०	राजीपुर बालुवागडा खनियाताल हुँदै खिमडि बाटो	९६.१२०	२०८२/०३/१७		५०.००	०	०.००	१५	०.००	
		१८६११.७७			२८५६.००	८३२.०३	८१८३.४८			

२९%

४४%

बेरुजु तथा सम्परीक्षणको अवस्था

समीक्षा गोष्ठी

रकम रु. लाखमा

आ.व.	कायम भएको बेरुजु	सम्परीक्षणको लागी लेखी पठाइएको	फर्छौट बेरुजु	बाँकी बेरुजु	कैफियत
२०७६/७७	११५९.६६			११५९.६६	
२०७७/०७८	१४.७०			१४.७०	
२०७८/०७९	६३८.६०	६.०३		६३८.६०	
२०७९/०८०	१०७.७३			१०७.७३	
२०८०/०८१	८३.७४	२२.८५	२	८१.७४	
२०८१/८२	लेखा परीक्षण नभएको				
कुल जम्मा	२००४.४३			२००२.४३	

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरू

समीक्षा गोष्ठी

क्र.स.	मुख्य समस्याहरू	समाधानका उपायहरू	कैफियत
1	Quantity-Quality Tradeoff	<ul style="list-style-type: none">Re-think, Re-adjustment and Re-calibration of Project Planning Process.Project Planning need to be integrated and harmonized with PRNMP.	<ul style="list-style-type: none">166 Projects/Person,1100 SqKm/Person

केही असल अभ्यासहरू

समीक्षा गोष्ठी



E-Monitoring & Real time Reporting System

1 Project Overview Sheet								
Project ID	PLRIP/SUPAWUG/01/2081-082							
Project Name	Construction and Upgrading of Sahajpur-Nigali Road, Kailali							
Location	Chure Rural Municipality, Kailali							
Start Date	4th May 2025							
Site Possession Date	18th May 2025							
Intended Completion date	17th May 2027							
For phase-1, Construction / Improvement works	17th May 2027							
For phase 2, PBM	5 years from date of issue of TOC for phase-1, including DLP							
Status	Ongoing							
Budget	22 Crore							
Estimated Amount	555,733,711.65							
Agreement Amount	363,099,235.33							
Client Name	Provincial Project Management Unit (PPMU) Dhangadhi Infrastructure Development Office, Kailali							
Contractor Name	G&J/Chhya-JV, Ghodaghodi-01, Kailali							
Activities	Roadway excavation, Embankment, Retaining structures, Culverts, Side drains, Pavement works/Bio engineering works, Bituminous works/DBSD and other road furniture work							
2 Client Details Sheet								
Client ID	Client Name	Contact Person	Mobile No	Email	Address	Designation	Working Years	
a)	PLRIP	IDO, Kailali	Pradeep Kumar Pant	9851005919	pradeepant321@gmail.com	Dhangadhi-05, Kailali	Project Support Engineer	21
b)		IDO, Kailali	Deepak Saud	9865877987			Sub Engineer	
c)		IDO, Kailali	Mina Bist	9866107405	minubist4444@gmail.com	Melau-8 Baidadi	Sub Engineer	3
d)		IDO, Kailali	Surya Prakash Joshi	9851185747			Engineer	
e)		IDO, Kailali	Deepak Negi	9848259435	deepaknegi494@gmail.com	Jhalari-	S.D.E	10
3 Contractor Details Sheet								
Contractor ID	Contractor Name	Contact Person	Mobile No	Email	Address	License No./Firm Registered Date	Experience Years	
PLRIP/SUPAWUG/01/2081-082	M/S Dhukucha/ANK/Joshi JV	Maresh Joshi	9841342758	joshibukder2074@gmail.com	Mahendranagar, Kanchan	155302073074 and 32111 10, 13		
4 Work/Task Tracking Sheet								
S.N.	Description	Unit	Qty as per BOQ	Qty-Completed	Progress (%)	Status	Remarks	
1	Site Clearance-Cleaning and grub	Sqm	30330	7240	4.2			
2	Roadway Excavation	Cum	94207.67	12600	13.37	On going		
3	EW in excavation of foundation	Cum	13388.24	1200	8.96	Ongoing		
4	Pavement Layers	Cum		0	0	Not started		
5	Random Rubble Masonry works	Cum	6066.23	80	1.31	Ongoing		
6	Plum Concrete works	Cum	6771.05	0	0	Not started		
7	Gabion Structures	Cum	8845.75	1880	21.36	Ongoing		
8	Plain and RCC works							
a)	M10/40	Cum	1088.37	6.52	0.78	Ongoing		
b)	M15/20	Cum	1978.65	0	0	Not started		

c)	M25/20	Cum	306.41	0	0	Net started			
9	Steel reinforcement in RCC works	MT	16.83	0	0	Net started			
10	Geo Textile	Sqm	6730.75						
11	Stone Soling Works	Cum	2073	12.96	0.62	Ongoing			
12	PPE Set	month	24	5	20.83	Ongoing			
13	First Aid	month	24	5	20.83	Ongoing			
14	Insurance	LS	1	1	100.00	Completed			
15	Information Board	Nos	2	2	100.00	Completed			
16	Site Lab	Month	24	2	8.33	Ongoing			
17	Regular Maintenance	Km-Month	24	3.381	14.08	Ongoing			
Total Physical Progress						3.5 Percent			
5 Financial Tracking Sheet									
Payment Bill	Project ID	Contractor ID	Invoice No	Amount	Mode	Status	Remarks		
0									
6 Tender Document Tracking Sheet									
Not Applicable- Under Construction									
Fiscal Year	Budget	Project Name	Design and Estimate Approved By	Approved Date	Tender Publish Date	Tender Approved By	Approval Date	Agreement Date	Remarks
Contract Signed on 4th May 2025		Upgrading Of Sahajpur Nigali Road,Chure Rural Municipality, Kailali	Jagat Prasad Joshi , PPMU Chief	2081-12-25	2081-12-29	Jagat Prasad Joshi , PPMU Chief	2082-3-8	4th May 2025	
7 Document Tracking Sheet									
Guarantee Type	Guarantee No	Issue Date	Expiry Date	Amount	Issue By	Approved Person	Contract ID	Remarks	
Performance Bond Guarantee	P02901F036178182	02 May 2025	2nd June 2032	47200000	PRABHU BANK LIMITED		PLRIP/SUPAWUG/01/2081-082		
Advanced Payment Guarantee		04 July 2025	03 Oct 2025	5211000	NABIL BANK				
8 Site Visits									
Office	Date								
Secretary	Ministry of Physical Infrastructure Development								
PPMU, Chief	PPMU								
IDO Chief	IDO, Kailali								
Site Incharge	IDO, Kailali								
Project Support Engineer	IDO, Kailali								
Social Mobilizer	IDO, Kailali								
	2082-10-9-24								
	2082-10-9-24								
	2082-10-9-24								
	Frequent								
	Frequent								
	Frequent								



Gabion works



Safety Orientation to workers



Meeting with Division forest office



81-82/127
81-82/125
81-82/129
PLRIP SAHAJPUR
78/80-28 Main
81/82-1

नीतिगत/संस्थागत सहयोग अपेक्षा

समीक्षा गोष्ठी



STRATEGIC ALLOCATION
Project Prioritization & Fiscal Responsibility

× SMALL PROJECTS **✓** STRATEGIC CLUSTERED PROJECTS



OPTIMIZED WORKFORCE
Smart Staffing for Sustainable Operations

× LIMITED STAFFING **✓** SKILLED O&M TEAMS

▶ MANPOWER MANAGEMENT & O&M REVIEW **🔒**




DIGITAL OVERSIGHT DIRECTIVE
E-MONITORING LEGAL FRAMEWORK
Instiutinalizing Tech for Accontuability

▶ **🔒**

निर्माण सम्पन्न आयोजनाका फोटोहरु

समीक्षा गोष्ठी

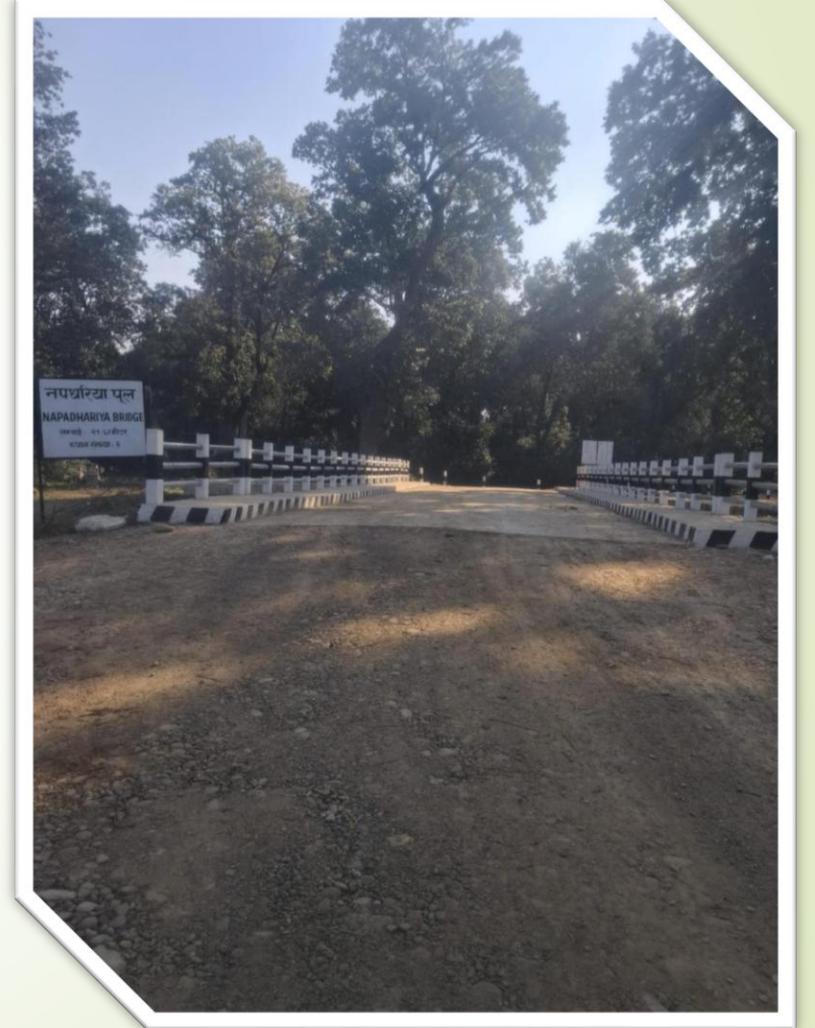

निर्माणाधिन आयोजनाका फोटोहरु

समीक्षा गोष्ठी



निर्माणाधिन आयोजनाका फोटोहरु

समीक्षा गोष्ठी



आयोजना अनुगमनसँग सम्बन्धित फोटोहरु

समीक्षा गोष्ठी



अन्य फोटोहरू

समीक्षा गोष्ठी



सडक विस्तारसँगै सौन्दर्य बढ्यो धनगढी सहरको

९६ प्रतिशत काम सम्पन्न, अब रडरोगन र फिनिसिङमात्र बाँकी



आफ्नो OTP लगायत अन्य व्यक्तिगत विवरण कसैलाई शेयर नजार्नुहोस् ।



सविता बुढा

बिहीबार, ०३ पुस २०८२, ०६:५२



©सतोगढी

सारांश

- धनगढीको मुख्य बजारको सडक विस्तार भएसँगै शहरको सौन्दर्य बढेको छ, जसमा २.३५ किलोमिटर सडक खण्डमा कालोपत्रेको काम सकिएको छ।
- सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत पुगेको छ भने वित्तीय प्रगति ९४ प्रतिशत पुगेको छ, जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम सक्ने देखिएको छ।
- सडक निर्माणमा सुरुमा बजेट अभाव र स्थानीय अवरोध आए पनि मेयरको पहलमा स्थानीयका सहयोगले सडक फराकिलो बनाउने काम सम्पन्न भएको छ।

*Thank You for
Listening*



धैर्यताका लागि धन्यवाद ।

