



नेपाल सरकार  
शहरी विकास मन्त्रालय  
स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग  
पुल्चोक, ललितपुर



## आ.व २०८२/८३ को अर्ध-वार्षिक प्रगति समिक्षा

मिति : २०८२/११/०१

शम्भु कार्की  
उप-महानिर्देशक


### प्रस्तुतीकरणमा समावेश भएका विषयहरू

- स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको दरबन्दी तथा मातहतका कार्यक्रम/आयोजना कार्यालयहरू
- विभागको कार्यक्षेत्र
- आ.व. २०८२/८३ को वार्षिक बजेट विनियोजन
- चालु आ.व. को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमको हालसम्मको कार्यान्वयन स्थिति
- बजेट रोक्का रहेका आयोजनाको विवरण
- चालु आ. व. २०८२/८३ मा हालसम्म भएका कार्यहरू
- आ.व. ०८२/८३ को अर्ध-वार्षिक अवधीसम्मको प्रगति विवरण
- आ.व. २०८३/८४ को अनिवार्य दायित्वको विवरण
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू
- तस्वीरहरू

## स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागको दरबन्दी

क्र.सं	पद	श्रेणी	सेवा	समूह	उपसमूह	स्वीकृत
१	महानिर्देशक	रा.प.प्रथम	इन्जि.	सिभिल	जनरल	१
२	उपमहानिर्देशक	रा.प.प्रथम	इन्जि.	सिभिल	जनरल	२
३	सि.डि.ई.	रा.प.द्वितीय	इन्जि.	सिभिल	जनरल	६
४	उपसचिव	रा.प.द्वितीय	प्रशासन	सा.प्र.	-	१
५	शाखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	प्रशासन	सा.प्र.	-	१
६	कानून अधिकृत	रा.प.तृतीय	न्याय	कानून	-	१
७	इन्जिनियर	रा.प.तृतीय	इन्जि.	सिभिल	जनरल	१२
८	कम्प्युटर इन्जिनियर	रा.प.तृतीय	विविध	-	-	१
९	लेखा अधिकृत	रा.प.तृतीय	प्रशासन	लेखा	-	१
१०	समाजशास्त्री	रा.प.तृतीय	प्रशासन	-	-	१
११	नायव सुब्बा	रा.प.अनं.प्रथम	प्रशासन	सा.प्र.	-	१
१२	लेखापाल	रा.प.अनं.प्रथम	प्रशासन	लेखा	-	१
१३	कम्प्युटर अपरेटर	रा.प.अनं.प्रथम	विविध	-	-	२
१४	सब-इन्जिनियर	रा.प.अनं.प्रथम	इन्जि.	सिभिल	जनरल	३
१५	ह.स.चा.	श्रेणीविहीन	-	-	-	२
१६	का.स.	श्रेणीविहीन	-	-	-	३
<b>विभाग जम्मा</b>						<b>३९</b>
<b>आयोजना कार्यान्वयन समूह (पुल दरबन्दी) तर्फ</b>						
१७	सु.इ.	रा.प.प्रथम	इन्जि.	सिभिल	जनरल	७
१८	सि.डि.ई.	रा.प.द्वितीय	इन्जि.	सिभिल	जनरल	२५
१९	इन्जिनियर	रा.प.तृतीय	इन्जि.	सिभिल	जनरल	६४
२०	सब-इन्जिनियर	रा.प.अनं.प्र	इन्जि.	सिभिल	जनरल	३०
<b>आ.का.स. जम्मा</b>						<b>१२६</b>
<b>जम्मा (विभाग+आ.का.स)</b>						<b>१६५</b>

## स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग मातहतका कार्यक्रम/आयोजना कार्यालयहरू

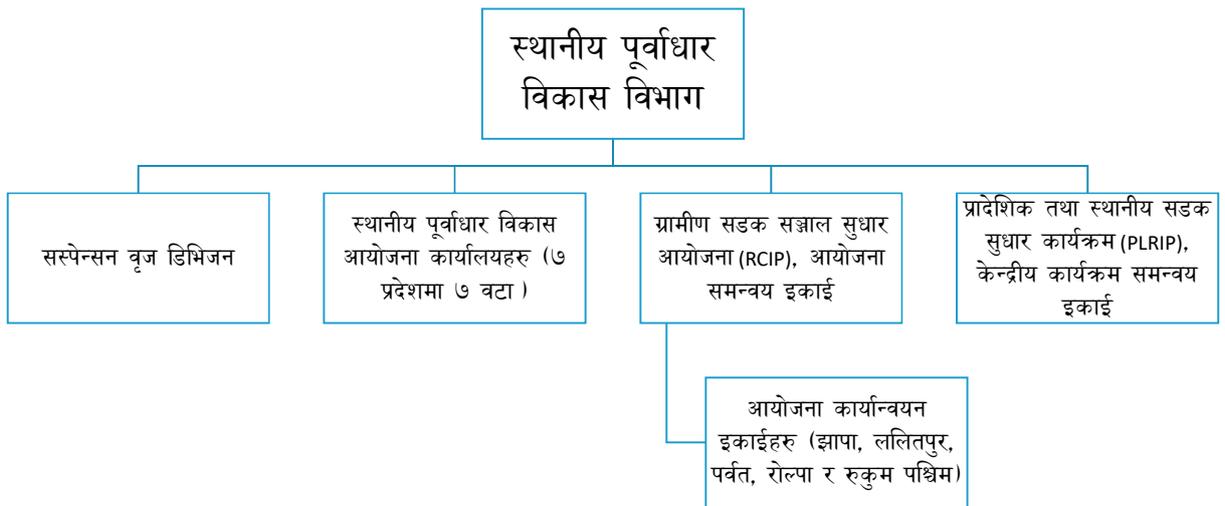

## विभागको कार्यक्षेत्र

१) झोलुङ्गेपुल

- झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम

२) सडक पूर्वाधार

- ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP)
- ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना-अतिरिक्त लगानी (RCIP-AF)
- प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (PLRIP)
- वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम
- तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
- सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

३) सडकपुल

- स्थानीयस्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना

४) अन्य पूर्वाधार

- स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
- कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम
- साना सिँचाई कार्यक्रम- दोश्रो चरण (SIP-II Phase)
- उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम
- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण (NRA) बाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

## आ. व. २०८२/८३ को कार्यक्रमगत विनियोजित बजेट विवरण

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक नम्बर	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक बजेट (रु. लाखमा)			वार्षिक बजेटको जम्मा प्रतिशतमा
			चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१	३४७०२०११	स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग	२८६१	९५६९	१२४३०	४.४४
२	३४७०२१०२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	७८३	५८७१	६६५४	२.३८
३	३४७०२१०३	झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	४४८	३५१५४	३५६०२	१२.७२
४	३४७०२१०५	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना	३०	५३३७९	५३४०९	१९.०९
५	३४७०२१०६	साना सिँचाई कार्यक्रम (LL)	१३६	७६५	९०१	०.३२
६	३४७०२१०७	स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (LL)	२९	१००००	१००२९	३.५८
७	३४७०२१०८	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना - अतिरिक्त लगानी (PG)	२०८	५७५५	५९६३	२.१३
८	२४७०२११०	उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम (LL)	९	०	९	०.००
९	३४७०२१११	कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम	५१	१६८५	१७३६	०.६२
१०	३४७०२११२	प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (PG)	२९९	९०७	१२०६	०.४३
११	३४७०२११४	तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३०	१०२२६	१०२५६	३.६७
१२	३४७०२११५	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	०	१००४११	१००४११	३५.८९
१३	३४७०२११६	वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	१७	४११६४	४११८१	१४.७२
<b>जम्मा</b>			<b>४९०१</b>	<b>२७४८८६</b>	<b>२७९७८७</b>	<b>१००</b>

## आयोजनाको प्रकृति अनुसार

क्र. सं.	विषय उपक्षेत्र	विनियोजित बजेट (रु. लाखमा)	विनियोजित बजेट (प्रतिशतमा)	आयोजना सङ्ख्या			
				बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त भई सञ्चालित	क्रमागत रूपमा सञ्चालित	नयाँ	जम्मा
१	सडक	१५८५०२	५६.६५	१५	१	६१५	६३१
२	सडकपुल	५३४०९	१९.०९	३४	१	१२४	१५९
३	झोलुङ्गेपुल	३५६०२	१२.७२	१०१	६१	१०६	२६८
४	अन्य (स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन, साना सिँचाइ, कर्णाली समृद्धि, अध्ययन/परामर्श, तालिम, सञ्चालन खर्च, आदि)	३२२७४	११.५३	१५	२११	९२	२८४
<b>जम्मा</b>		<b>२७,९७,८७</b>	<b>१००%</b>	<b>१६५</b>	<b>२७४</b>	<b>९०३</b>	<b>१३४२</b>

## चालु आ.व. को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रमको हालसम्मको कार्यान्वयन स्थिति

क्र. सं.	ब.उ.शी.नं	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	कुल क्रियाकलाप संख्या	निर्माण क्रियाकलाप संख्या	चालु आ.व.मा समावेश भएका क्रियाकलाप मध्ये हालसम्म				नेपाल सरकारको मिति २०८२/०६/०५ को निर्णयबाट रोक्का भएका क्रियाकलापको संख्या	हाल सम्म रोक्का फुकुवा भएका क्रियाकलापको संख्या
					सम्पन्न	सूचना प्रकाशन भई सम्पन्नताको क्रममा रहेका	पूर्व तयारी सम्पन्न भएका	केहि प्रक्रिया बगाडी नबढेका		
१	३४७०२०११	स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग	१५२	१३०	८०	०	१०	४०	२३	२
२	३४७०२१०२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	६७	६१	१३	०	३४	१४	४४	११
३	३४७०२१०३	झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	२९६	२९६	१७३	१	७२	५०	१०४	११
४	३४७०२१०५	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना	१९३	१९३	४४	०	६७	८२	११७	१
५	३४७०२१०६	साना सिँचाइ कार्यक्रम (LL)	२	१	०	०	०	१	०	०
६	३४७०२१०७	स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (LL)	१	१	०	०	०	१	०	०
७	३४७०२१०८	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना - अतिरिक्त लगानी (PG)	१०	८	०	०	०	८	०	०
८	२४७०२११०	उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम (LL)	०	०	०	०	०	०	०	०
९	३४७०२१११	कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम	१९	१९	१६	१	१	१	४	३
१०	३४७०२११२	प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (PG)	४	०	०	०	०	०	०	०
११	३४७०२११४	तराई मधेस सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	७३	७३	६	११	२६	३०	७३	१८
१२	३४७०२११५	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३७४	३७४	३८	१२०	१८३	३३	३६६	१६१
१३	३४७०२११६	वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	१५१	१५१	१३	५४	६३	२१	१३९	६५
<b>जम्मा</b>			<b>१३४२</b>	<b>१३०७</b>	<b>३८३</b>	<b>१८७</b>	<b>४५६</b>	<b>२८१</b>	<b>८७०</b>	<b>२७२</b>

**क्रमागत रूपमा सञ्चालित आयोजना मध्ये सशर्त अनुदान अन्तर्गत स्थानीय तह तथा प्रदेशमा प्रविष्टि भएका आयोजनाहरू**

विवरण	स्थानीय तह		प्रदेश		जम्मा	
	संख्या (वटा)	रकम (रु लाख)	संख्या (वटा)	रकम (रु लाख)	संख्या (वटा)	रकम (रु लाख)
स्थानीय तह / प्रदेशमा गएका	२२	९००	२९	४४६०	५१	५३६०
साबिक कै कार्यालय मार्फत कार्यान्वयनका लागि सहमति प्राप्त	१७	६८०	१३	१९००	३०	२५८०
सहमति प्राप्त भई फिर्ता भएका	१६	६४०	१३	१९००	२९	२५४०
सहमति प्राप्त भई फिर्ता हुन बाँकी	१	४०			१	४०
निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेको	२	८०			२	८०
कागजात हस्तान्तरणका लागि निर्णय भएको			१	२००	१	२००
सहमति प्राप्त नभएका	३	१४०	१५	२३६०	१८	२५००


**क्रमागत रूपमा सञ्चालित आयोजना मध्ये चालु आ.व. को कार्यक्रममा छुट भएका आयोजनाहरू**

क्र. सं.	बजेट उपशीर्षक	आयोजना कार्यालय/कार्यक्रम/शाखा				जम्मा	
		स्था.पू.वि.आ. का., ईटहरी (वटा)	स्था.पू.वि.आ. का., बुटवल (वटा)	स्था.पू.वि.आ. का., सुर्खेत (वटा)	स्था.पू.वि.आ. का., धनगढी (वटा)	संख्या (वटा)	बजेट (रु लाखमा)
१	स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग		१			१	४७२
२	झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	१				१	२२०
३	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना				१	१	४५
४	कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम			४		४	३२५
५	वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम			२		२	९२
<b>जम्मा</b>		<b>१</b>	<b>१</b>	<b>६</b>	<b>१</b>	<b>९</b>	<b>११५४</b>

## रोक्का रहेका कार्यक्रमहरु मध्ये फुकुवाका लागि पेश भएका आयोजनाको स्थिति

क्र. सं.	विवरण	रोक्का फुकुवाका लागि पेश भएका आयोजना			रोक्का फुकुवा भएका आयोजना	
		संख्या	विनियोजित बजेट (रु लाखमा)	रोक्का रहेको बजेट (रु लाखमा)	संख्या	रोक्का फुकुवा बजेट (रु लाखमा)
१	गत विगतमा बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त गरी संचालित आयोजनाहरुको विवरण	२३	५३०७.५०	५२१७.०८	२३	५२१७.०८
२	गत विगतमा बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त नगरी क्रमागत संचालित आयोजनाहरुको विवरण	६३	११३०.८८	११३०.८८	६२	११२०.८८
३	रोक्का रहेका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत हालसम्म सूचना प्रकाशन भैसकेका	१८७	५४९६५.००	५४९५२.२०	१८७	५४९५२.२०
४	रोक्का रहेका कार्यक्रमहरु अन्तर्गत पूर्व तयारी भैसकेका	४५६	११५०३०.३४	११५०३०.३४	०	०.००
<b>जम्मा</b>		<b>७२९</b>	<b>१७६४३३.७२</b>	<b>१७६३३०.५०</b>	<b>२७२</b>	<b>६१२९०.१६</b>

## आ.व. २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम मध्ये रोक्का रहेको बजेटको स्थिति

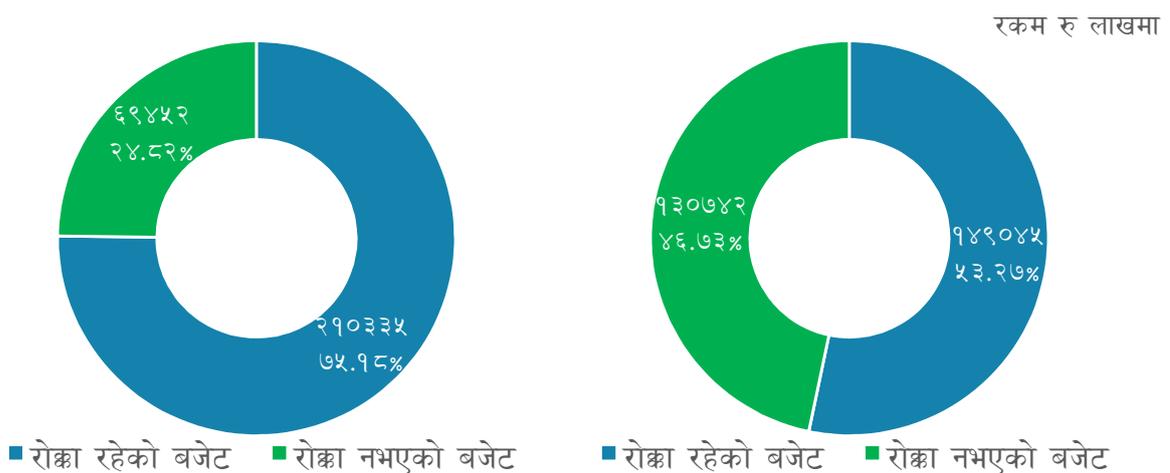

मिति २०८२/०६/०५ को नेपाल सरकारको निर्णयबाट विनियोजित बजेटमा रोक्का रहेको बजेटको अवस्था

अर्ध-वाषिक अवधीसम्मको विनियोजित बजेटको अवस्था

## चालु आ.व. २०८२/८३ मा हालसम्म भएका कार्यहरू

- बहुवर्षीय रूपमा सञ्चालित आयोजनाको कार्य भइरहेको।
- सूचना प्रकाशन भइसकेका १८७ आयोजनाहरूको बोलपत्र मूल्याङ्कन भई ठेक्का सम्झौताको चरणमा रहेको।
- चालु आ.व.को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनाहरूमध्ये ४५६ वटा आयोजनाको पूर्व तयारीको कार्य सम्पन्न भएको।
- बहुवर्षीय स्रोतसहमति प्राप्त भई क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा रहेका २३ वटा, क्रमागत ६२ वटा र ठेक्का सूचना प्रकाशन भएका नयाँ १८७ वटा योजनाहरूको बजेट रोक्का फुकुवा भएको।
- १२१ वटा आयोजनाहरूको बहुवर्षीय स्रोत सहमतिका लागि पेश गरेको।
- हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजनाहरू
  - झोलुगे पुल = २८ वटा
  - स्थानीय तह प्रशासकीय भवन = १६ वटा

## ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP) को आ.व. २०८२/८३ को अर्ध-वार्षिक भौतिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा योजना संख्या	कार्यन्वयनमा गएका योजना संख्या			सम्पन्न भएका योजना संख्या			भौतिक प्रगति प्रतिशत	कैफियत
			सालबसाली	बहुवर्षीय	जम्मा	सालबसाली	बहुवर्षीय	जम्मा		
१	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	४७	१	१३	१४	०	४	४	९४.८३	जम्मा ३१०.५८ कि.मि PBM सम्पन्न १६८ कि.मि
२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना - अतिरिक्त लगानी	२४	-	२३	२३	-	-	-	३१	

## ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (RCIP) को आ.व. २०८२/८३ को अर्ध-वार्षिक वित्तीय प्रगति

### क. ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना तर्फ

- जम्मा विनियोजित बजेट: रु. ७० करोड ७२ लाख
- जम्मा खर्च: रु. ३ करोड ५९ लाख

### ख. ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना – ए.एफ तर्फ

- जम्मा विनियोजित बजेट: रु. ४ अर्ब ७८ करोड
- जम्मा खर्च: रु. ६६ करोड १३ लाख

### ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना – ए.एफ तर्फ हालसम्मको खर्च र शोधभर्ना स्थिती

- आयोजनाको हालसम्मको कुल खर्च: रु. ३ अर्ब १८ करोड
- नेपाल सरकार तर्फको खर्च: रु. ४ करोड
- एडीबी तर्फको खर्च: रु. ३ अर्ब १४ करोड
- शोधभर्ना लिएको रकम: रु. २ अर्ब ५२ करोड
- शोधभर्ना लिन बाँकी रकम: रु. ६२ करोड

## प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (PLRIP) को आ.व. २०८२/८३ को अर्ध-वार्षिक प्रगति

### • नयाँ सडक निर्माण (४ वटा सडक १२० कि.मी.)

- १ वटा सडक ठेक्का मूल्याङ्कन प्रकृत्यामा रहेको
- १ वटा सडकको DPR तयार भई ICB Bid Document को तयारी भइरहेको ।
- २ वटा सडकको DPR तयारी चरणमा रहेको

### • सडक स्तरोन्नती (जम्मा २५ वटा सडक ३५५.९३ कि.मि.)

- ६ वटा सडक ६९.९३ कि.मी को ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य भइरहेको।
  - भौतिक प्रगती: १३.४९%
  - वित्तीय प्रगती: ७.६९%
- ११ वटा सडकहरू १७८ कि.मि. को DPR Review कार्य भइरहेको।
- ८ वटा सडकहरू १०८ कि.मि. को DPR तयारी कार्य भइरहेको।

## प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (PLRIP) को आ.व. २०८२/८३ को अर्ध-वार्षिक प्रगति


- **आवधिक मर्मत, नियमित मर्मत**
  - आवधिक मर्मत (१८ वटा सडक २४२ कि.मि)
    - ११ वटा सडकहरूको ठेक्का सूचना प्रकाशन भएको
    - ७ वटा सडकहरूको DPR तयार भई Review भइरहेको
  - नियमित मर्मत (९० वटा सडक १४६१ कि.मि.)
    - १२ वटा सडकको नियमित मर्मत कार्यको लागि RMG परिचालन गरिएको
    - बाँकी सडकहरूको RMG परिचालन हुने चरणमा रहेको।
- **प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम (PLRIP) को शोधभर्नाको स्थिती**
  - IDA तर्फको हालसम्मको कुल खर्च रु. २९ करोड ९२ लाख
  - हालसम्म शोधभर्ना लिएको रकम रु. २९ करोड ९२ लाख
  - शोधभर्ना प्रतिशत: १००%

## आ.व. ०८२/८३ को अर्ध-वार्षिक अवधीसम्मको वित्तीय प्रगति विवरण

क्र.सं.	बजेट कोड	बजेट उपशीर्षक	वार्षिक बजेट (रु. लाखमा)			बजेट खर्च (रु. लाखमा)			खर्च प्रतिशत (%)		
			चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा	चालु	पुँजीगत	जम्मा
१	३४७०२०११	स्थानीय पूर्वाधार विभाग	२८६१.००	९५६९.००	१२४३०.००	११७१.४७	३८२.४७	१५५३.९४	४०.९५	४.००	१२.५०
२	३४७०२१०२	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना	७८३.००	५८७१.००	६६५४.००	२७१.४१	६७२.९९	९४४.४०	३४.६६	११.४६	१४.१९
३	३४७०२१०३	झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम	४४८.००	३५१५४.००	३५६०२.००	१७९.६३	९८०३.४४	९९८३.०७	४०.१०	२७.८९	२८.०४
४	३४७०२१०५	स्थानीय स्तरका सडकपुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना	३०.००	५३३७९.००	५३४०९.००	११.८५	२५४७.२७	२५५९.१२	३९.५०	४.७७	४.७९
५	३४७०२१०६	साना सिँचाई कार्यक्रम	१३६.००	७६५.००	९०१.००	९४.४५	५२०.९०	६१५.३५	६९.४५	६८.०९	६८.३०
६	३४७०२१०७	स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	२९.००	१००००.००	१००२९.००	११.३७	२९१३.०८	२९२४.४५	३९.२१	२९.१३	२९.१६
७	३४७०२१०८	ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार परियोजना- ए एफ	२०८.००	५७५५.००	५९६३.००	५६.६४	१०४८.३९	११०५.०३	२७.२३	१८.२२	१८.५३
८	२४७०२११०	उच्च पहाडी एवम् हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रम	९.००	०.००	९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
९	३४७०२१११	कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम	५१.००	१६८५.००	१७३६.००	१३.२०	१७०.८६	१८४.०६	२५.८८	१०.१४	१०.६०
१०	३४७०२११२	प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम	२९९.००	९०७.००	१२०६.००	८८.४२	३८.९८	१२७.४०	२९.५७	४.३०	१०.५६
११	३४७०२११४	तराई मधेश सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	३०.००	१०२२६.००	१०२५६.००	६.८४	११.१३	१७.९७	२२.८०	०.११	०.१८
१२	३४७०२११५	सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	०.००	१००४११.००	१००४११.००	०.००	६१.३५	६१.३५	०.००	०.०६	०.०६
१३	३४७०२११६	त्रैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम	१७.००	४११६४.००	४११८१.००	१.०५	४७५.११	४७६.१६	६.१८	१.१५	१.१६
		<b>जम्मा</b>	<b>४९०१</b>	<b>२७४८८६</b>	<b>२७९७८७</b>	<b>१९०६.३३</b>	<b>१८६४५.९७</b>	<b>२०५५२.३३</b>	<b>३८.९०</b>	<b>६.७८</b>	<b>७.३५</b>

## आ.व. ०८२/८३ को अर्ध-वाषिक अवधीसम्मको प्रगति विवरण

### क) वित्तीय प्रगति %

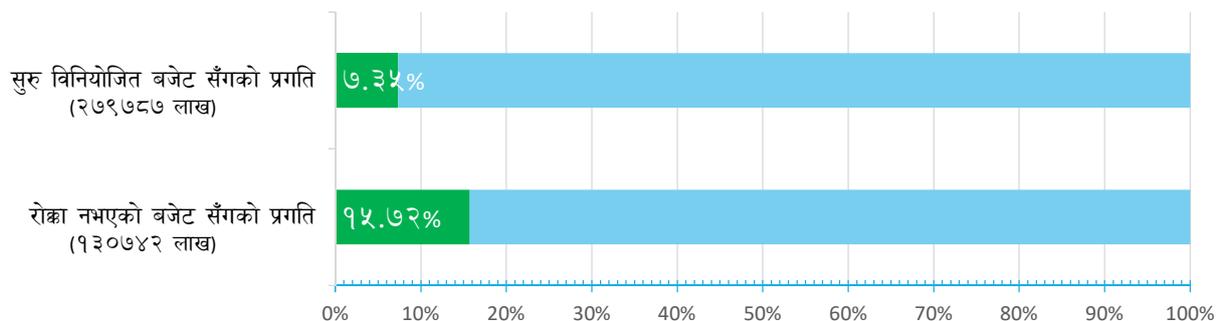

	रोक्का नभएको बजेट सँगको प्रगति	सुरु विनियोजित बजेट सँगको प्रगति
हाल सम्मको खर्च (रु लाखमा)	२०५५२.३	२०५५२.३
खर्च नभएको रकम (रु लाखमा)	११०१८९.४४	२५९२३४.७

■ हाल सम्मको खर्च (रु लाखमा) ■ खर्च नभएको रकम (रु लाखमा)

ख) भौतिक प्रगति = ९.८५%

## आ.व. २०८३/८४ को अनिवार्य दायित्वको विवरण

सि.नं	विवरण	संख्या	रकम (रु लाखमा)
क)	पूँजिगत तर्फ		
१	गत विगतमा स्रोत सहमती प्राप्त भई संचालित आयोजना	१४०	३८१८०.१७
२	गत विगतमा स्रोत सहमती प्राप्त नभई संचालित आयोजनाहरू	८२	६५८२.१४
३	आ.व. २०८१।८२ मा सालबसाली रूपमा सञ्चालन भई निर्माणाधिन रहेका आयोजनाहरू	३४५	१६३०९.११
४	गत विगतमा यस विभाग मातहत कार्यान्वयन भएका तर चालु आ.व. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरू	१८	७२६०.०६
५	आ.व. २०८२।८३ को वार्षिक कार्यक्रममा छुट योजना	९	११५३.१४
६	आ.व. २०८२।८३ मा बहुवर्षिय श्रोत सहमती माग भएका आयोजनाहरूले स्रोत सहमती प्राप्त भएमा आगामी आ.व. २०८३।८४ मा सिर्जित हुने	१२१	६४२१५.०९
७	स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने	१५०	२००००
	जम्मा		१५,३६,९९.७१

## कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू

- मिति २०८२/०६/०५ को नेपाल सरकारको निर्णयबाट विनियोजित बजेटमा रोक्का हुँदा चालु आ.व. को पहिलो छ महिना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा अन्योलता भएको र रोक्का फुकुवा प्रक्रियामै समय व्यतित भएको।
- चालु आ.व. को वार्षिक विकास कार्यक्रममा रहेका जम्मा १३४२ वटा क्रियाकलापमध्ये ८७० वटा रोक्का रहेका कार्यक्रमहरू मध्ये ७२९ वटा आयोजनाहरूको रोक्का फुकुवाका लागि पेश भएकोमा जम्मा २७२ वटाको मात्र रोक्का फुकुवा भएको हुँदा पूर्वतयारी सम्पन्न ४५६ वटा र क्रमागत १ वटा गरी जम्मा ४५७ वटा आयोजनाहरूको रोक्का फुकुवा हुन बाँकी रहेको।
- क्रमागत/ निर्माणाधिन आयोजना मध्ये १८ वटा प्रदेश/स्थानीय तहबाट फिर्ता हुन बाँकी रहेको।
- ९ वटा (७ सडक, १ झो.पु., १ सडक पुल ) योजना चालु आ.वको कार्यक्रममा छुट भएको।
- गत आ.वमा सम्पन्न भएका कार्यहरूको भुक्तानी हुन को.ले.नि.का. बाट प्रमाणीत भएको म.ले.प.फा.नं २२१ बमोजिम चालु आ.व मा बजेट विनियोजन नभएका १८ वटा र बजेट विनियोजन भएका १२ वटा आयोजनाहरूको कुल जम्मा रु. ९ करोड १३ लाख ५७ हजार को रकमान्तर हालसम्म नभएको।


## कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू

- सम्पन्न हुने योजनामा प्रस्तावित भन्दा न्यून बजेट विनियोजन भई आएकाले भुक्तानी दिन कठिनाई हुने।
- सशर्त अनुदान तर्फ (झोलुङ्गे पुल र सडक पुलको लागि) अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न थप बजेट अभाव भएको।
- स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि माग अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको।
- गत वर्ष सम्झौता अनुसारको कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ३४५ सालबसाली योजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी बाँकी भुक्तानी दिने व्यवस्था।
- RCIP-AF र PLRIP तर्फ घर, टहरा लगाएत अस्थायी संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसकिएको।
- RCIP-AF र PLRIP तर्फ वनक्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटान सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुन बाँकी रहेको।



# तस्विरहरु



सुस्ता मल्टीस्पान झो.पु., नवलपरासी (१५७१ मि.)

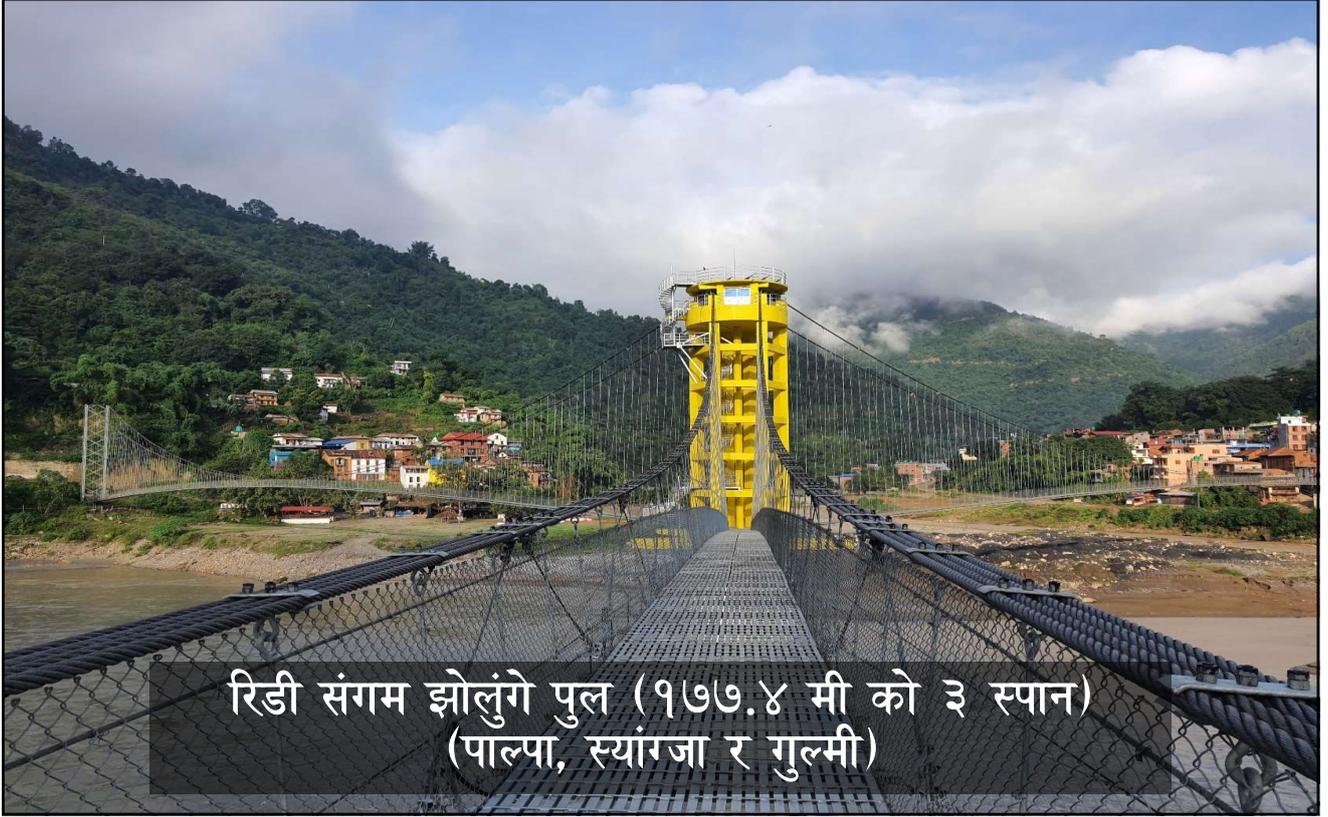


## तुइन बिस्थापन

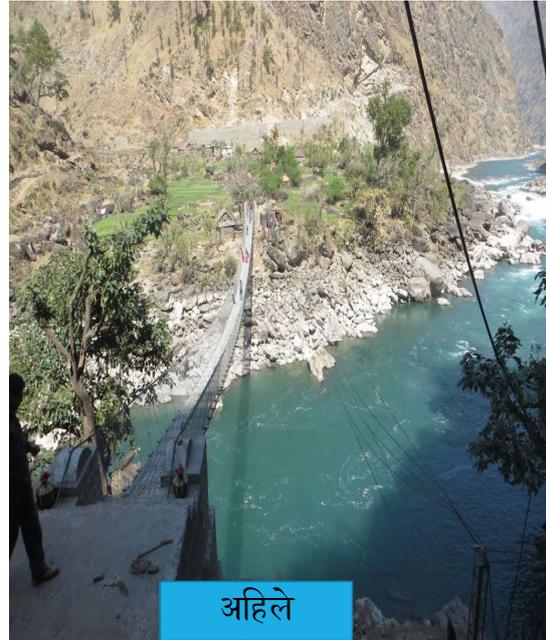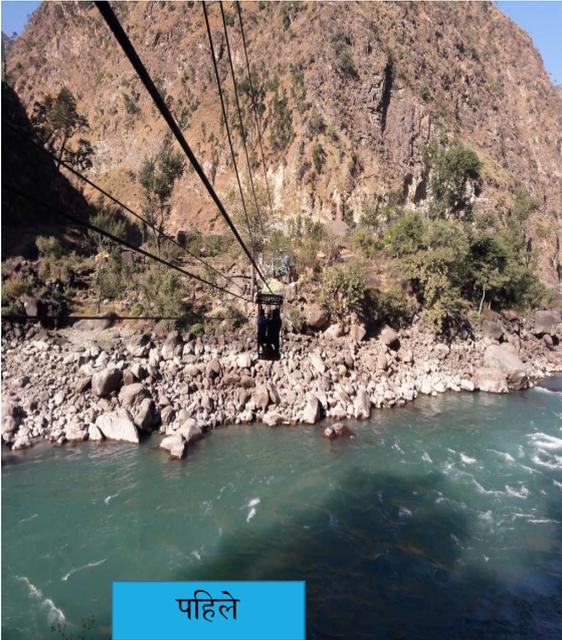

लालुभर्ता, कालिकोट

## तुइन बिस्थापन

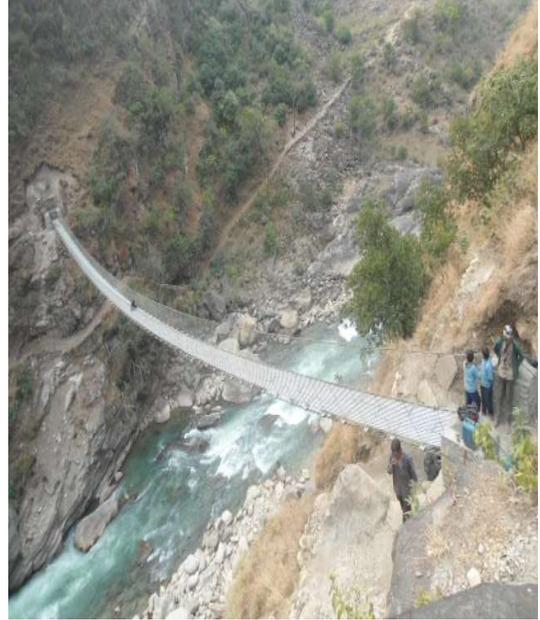

उदिसेरा, कालिकोट

## सडक पुल निर्माण



गेरुका खोला पुल, सर्लाही



घ्याङ्ग खोला पुल, दोलखा

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत् निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु



गौमुखी गाँउपालिका, प्यूठान

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत् निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु



लुङ्ग्री गाँउपालिका, रोल्पा

स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत् निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु




स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत् निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु



निर्माण सम्पन्न केही सडक योजनाहरू



मितेरी मार्ग चन्द्रागिरी

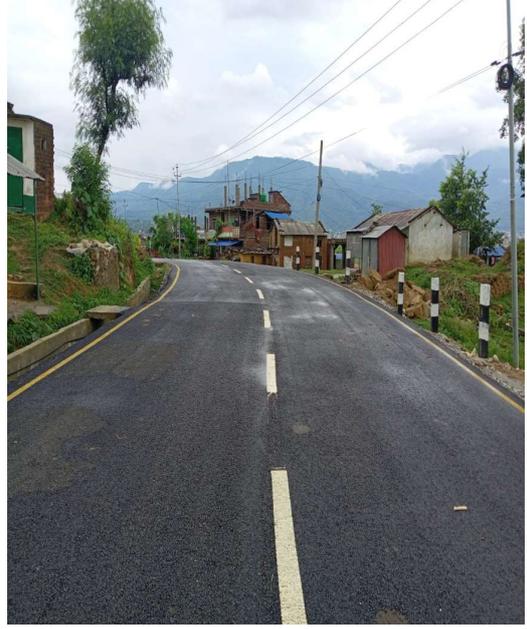

रिङ्गरोड सुर्खेत

निर्माण सम्पन्न केही सडक योजनाहरू




जगतपुर नयाँबस्ती बाँके



मयुरबस्ती, बर्दिया

## साना सिंचाई कार्यक्रम-दोश्रो चरण



धन्यवाद !!
