




प्रदेश सरकार
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय
कोशी प्रदेश



आ.व. २०८०/८१ को
वार्षिक प्रगति समिक्षा
मिति २०८१।०४।१३



प्रस्तुतकर्ता
रणजीत कुमार झा
डिभिजन प्रमुख

जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, धनकुटा

विषय सुची

- आ.व. २०८०/८१ को बार्षिक प्रगति सारांश
 - कर्मचारी दरबन्दी
- सवारी साधान र कार्यालय भवनको विवरण
 - बहुबर्षीय योजनाहरूको विवरण
- आ.व. २०८०/८१ मा बिस्तृत अध्ययन भएका योजनाहरूको विवरण
 - आ.व. २०८१/८२ को लागि प्रस्ताव गरिएका बहुबर्षीय योजनाहरूको विवरण
- आ.व. २०८१/८२ मा CMIASP-AF कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरूको विवरण
 - बेरुजु र बेरुजु फछ्यौटको सारांश (०७९/८० सम्मको)
- मुख्य समस्या र समाधान
 - फोटोहरू

वार्षिक प्रगति सारांश

सि.नं	कार्यक्रम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति (वार्षिकको आधारमा)	
		वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
(क)	पुजीगँत (श्रोतगत)				
१	संघ तर्फ	१९,३००	१८,१८६.७५	९४.२%	९३.५%
२	प्रदेश तर्फ	८३,४९९	७९,१२०.४६	९४.८%	९५.३%
	जम्मा	१०२,७९९	९७,३०७.२१	९४.७%	९४.९%
(ख)	चालु तर्फ	१४,२६६	११,८४८.००	८३.१%	
कुल जम्मा		११७,०६५	१०९,१५६	९३.२%	

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

वार्षिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति

क्र.स.	कार्यक्रम	स्रोत	वार्षिक बजेट (रु.हजारमा)	वार्षिक खर्च (रु.हजारमा)	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
१	सिंचाइ संरचना निर्माण	प्रदेश सरकार	६८,३९९	६४,६१७.४४	९४.५%	९४.५%	
२	तटबन्ध तथा बाँध निर्माण		१४,१००	१३,५५३.८२	९६.१%	९८.७%	
३	पूँजिगत परामर्श खर्च		१,०००	९४९.२०	९४.९%	१००.०%	
	जम्मा		८३,४९९	७९,१२०.४६	९४.८%	९५.३%	
१	सिंचाइ संरचना निर्माण	संघ ससर्त	१५,३००	१४,६२१.४६	९५.६%	९३.५%	
२	तटबन्ध तथा बाँध निर्माण		१,५००	१,४७५.६४	९८.४%	१००.०%	
३	पूँजिगत सुधार खर्च सार्वजनिक निर्माण		२,५००	२,०८९.६५	८३.६%	९०.०%	
	जम्मा		१९,३००	१८,१८६.७५	९४.२%	९३.५%	

आ.व. ०८०/८१ को संक्षिप्त वार्षिक भौतिक उपलब्धि विवरण

• सिंचित क्षेत्रफल विस्तार

- नयाँ क्षेत्रफल विस्तार (Extension) हेक्टरमा- ७
- पुनर्स्थापना (Rehab.) हेक्टरमा- १७८
- लाभान्वित जनसंख्या- २६१२

धनकुटा

कूल क्षेत्रफल	९०,०९० हे.
खेतीयोग्य क्षेत्रफल	३५,०५३ हे. (३९%)
सिचाइ योग्य क्षेत्रफल	१६,५०७ हे. (४७%)
सिंचित क्षेत्रफल	६,७३५ हे. (१९.२१%)
(आ.व. २०८०/८१ सम्म)	

• नदि नियन्त्रण तर्फ

- नदि नियन्त्रण योजना संख्या- १०
- नदि नियन्त्रण लम्बाइ मिटरमा- २६४
- नदि नियन्त्रण स्पर संख्या- ८
- जग्गा उकास हेक्टरमा- १४.५०
- लाभान्वित जनसंख्या- ४६०

• पहिरो नियन्त्रण तर्फ

- पहिरो नियन्त्रण योजना संख्या- १०
- पहिरो नियन्त्रण लम्बाइ मिटरमा- ३३५
- लाभान्वित जनसंख्या- ३५२

दरबन्दी विवरण

पद/ समुह	कूल स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ति भएको स्थायी दरबन्दी	कूल रिक्त स्थायी दरबन्दी	करार		आवश्यक कर्मचारी संख्या
				मन्त्रालय वाट	कार्यालय वाट	
सि डि इ (सिभिल)	१	१	-			काज
इन्जिनियर (सिभिल)	२	-	२			२
लेखा अधिकृत	१	-	१			
प्रशासन	१	१	-			काज
सब इन्जिनियर	३	३	-			
ए. ओ.	१	१	-			
सवारी चालक			-		१	
कार्यालय सहयोगी	२	१	१		१	१
अन्य						
जम्मा	११	८	३		२	३

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

सवारी साधन र कार्यालय भवनको विवरण

सि.न.	सवारी साधनको प्रकार	सवारी साधन न.	अवस्था
१	ल्याण्ड रोभर	बा.१ झ ६७५८	पुरानो, संचालनमा रहेको
२	यामाहा	बा. २ ब ३१९०	पुरानो, संचालनमा रहेको
३	यामाहा	बा. २ ब ७३६४	पुरानो, संचालनमा रहेको
४	यामाहा	बा.२ ब ७८०६	पुरानो, संचालनमा रहेको
५	यामाहा	को. १ ब १०७२	पुरानो, संचालनमा रहेको
६	बजाज	बा.१ ब ४३५३	संचालनमा नरहेको
७	यामाहा	को.१ ब ८१०	संचालनमा नरहेको
८	सुजुकि	बा.२ ब ३८३४	संचालनमा नरहेको

क्र. स.	ठेगाना	भवनको प्रकार	निर्माण वर्ष	लागत रु.
१	धनकुटा न. पा. -४	पक्कि : २.५ तल्ला	२०५२ साल	२८,६८,४६४

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

बहुवर्षीय योजनाहरूको विवरण

सि. नं.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	ठेक्का सम्झौता रकम रु.(०००)	ठेक्का सम्झौताको खर्च रु.(०००)	कुल खर्च रु.	बित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	ठेक्का सम्झौताको म्याद	कैफियत
	क्रमागत									
१	भांगे कुलो सिंचाई योजना, धनकुटा-२, धनकुटा	३५.०	२२५१२.०	१११७६.४	१११२९.०	१३३८६.५	९९.६%	१००%	२०८१/०१/११	ठेक्का तर्फ सम्पन्न भएको तथा उपभोक्ता तर्फ क्रमागत रहेको
२	बाहुन कुलो सिंचाई योजना, चौबिसे-४, धनकुटा	२३.४	१५३८०.१	७२२५.८	७१६२.५	९९७५.०	९९.१%	१००%	२०८१/०१/११	
३	महामाया होंगरांगे सिंचाई योजना, महालक्ष्मी-८ र ९, धनकुटा	८०.०	३६३१२.०	१८६६०.६	१८६२५.९	२०९८४.७	९९.८%	१००%	२०८०/११/०३	

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

आ.व. २०८०/८१ मा बिस्तृत अध्ययन भएका योजनाहरूको विवरण


सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा विनियोजित बजेट रु.(०००)	लाभान्वित घरधुरी / जनसंख्या	योजनाको प्रथिमिकरण (P १,P २,..)
१	महामाया सिम्ले सिस्ने दोभान अखौले याडपाड हुम्लिङ लाटे भञ्ज्याङ सिँचाइ योजना , महालक्ष्मी न.पा.- ९,७,६,५ धनकुटा	३१८.५	१७५,४०६.०४	नयाँ	२०,००	४२३/२५४०	P १
२	पातले खोला एकीकृत सिँचाइ योजना , धनकुटा न.पा. ६,१०	२०	२८,०५९.१२	पुनर्स्थापना	२०,००	५०/३००	P १

आ.व. २०८१/८२ को लागि प्रस्ताव गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरूको विवरण

सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा विनियोजित बजेट रु.(०००)	लाभान्वित घरधुरी / जनसंख्या	कैफियत
१	पुरानो तिनचौतारे झरना सि.यो., महालक्ष्मी -२, धनकुटा	६८	४५६१०	पुनस्थापना	५०००	१६००	
२	चाचला सिंचाई विस्तार योजना, छथर जोरपाटी -३, धनकुटा	१९५	८१७७१	नया	७०००	२८००	
३	खुदी टोल सि.यो., सागुरीगडी -८, धनकुटा	८	८२०२	नया/NITP	२०००	४६५	
४	फेदाकजुंग सि.यो., चौबिसे-१, धनकुटा	१०	९१५०	नया/NITP	२०००	२०५	
५	सिद्धीबुंग स्प्रिंकलर सि.यो., सगुरीगडी -४, धनकुटा	९	७५००	नया/NITP	५००	१७६	
६	बाहुनी खोला स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, पाखिबास -७, धनकुटा	७.५	४५००	नया/NITP	-	२००	

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

आयोजना स्वीकृत (Project Appraisal) भइ बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भैनसकेका आयोजनाहरुको विवरण

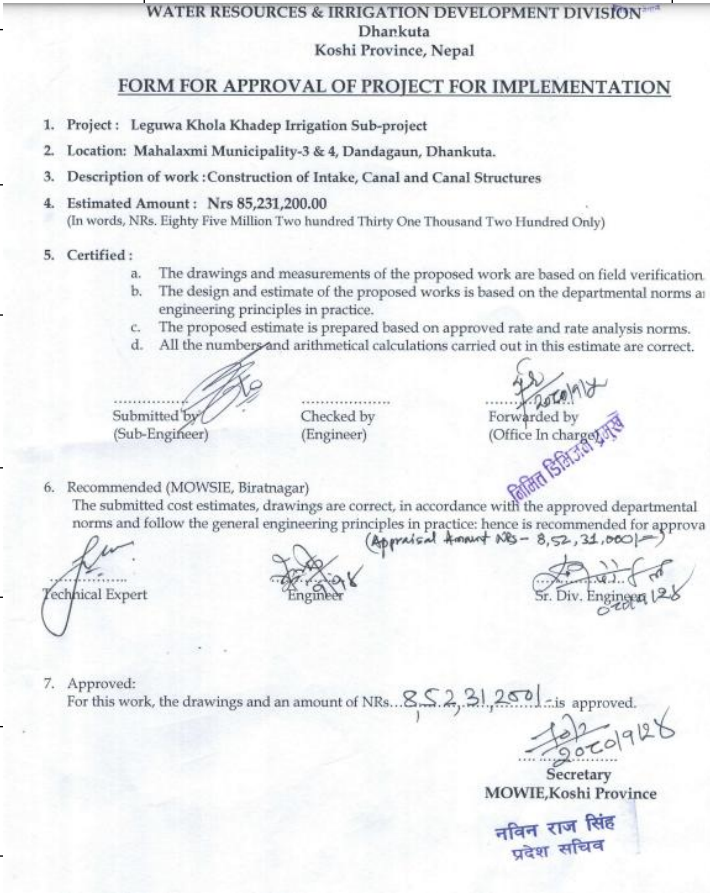सि.न.	आयोजनाहरुको नाम र ठेगाना	आयोजनाको स्वीकृत लागत अनुमान (रु. हजारमा)	कैफियत
१	लेगुवा खाडेप कुलो स्तर उन्नती, महालक्ष्मी न पा, लेगुवा, धनकुटा	8,52,31.2	
२			
३	बहुवर्षीय आयोजनाहरुको छनौट सम्बन्धि मापदण्ड, २०८० अनुसारको अनुसूचीहरु भरि पेश भैसकेको		
४			
५			
कुल जम्मा			

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

आ.व. २०८१/८२ मा CMIASP-AF कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरूको विवरण

सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनर्स्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा विनियोजित बजेट रु.(०००)	लाभान्वित घरधुरी / जनसंख्या	कैफियत
१	वरेन्द्र कुलो सिंचाइ उप-आयोजना, महालक्ष्मी - ३ र ४, धनकुटा	१०६	५१,३४२	पुनर्स्थापना	४,९५०	९३/५६९	बोल पत्रको सूचना प्रकाशित
२	तिनदोभाने केराबारी सिंचाइ उप-आयोजना, धनकुटा न. पा.- २, धनकुटा	९८	४४,०५५	पुनर्स्थापना	३,९६०	७५/५११	
३	छयालुङ्ग लाक्ताङ्ग उप-आयोजना, महालक्ष्मी - २, धनकुटा	१७५	८७,५००	पुनर्स्थापना	-	३१५/२०८०	दोश्रो चरण

बेरुजु र बेरुजु फर्छ्यौटको साराशं ०८०/८१ सम्मको

आ.ब.	बेरुजु रकम (रु हजारमा)	फर्छ्यौट भएको बेरुजुको रकम (रु हजारमा)	फर्छ्यौट हुन बाँकि बेरुजु (रु हजारमा)	कैफियत
०७५/०७६	४१,९१,०००	४१,९१,००० (पेशकी)	०	फर्छ्यौट गर्न सामुहिक दायित्व लिनु पर्ने
०७६/०७७	१५,२४,६८६	४०,५०२ (असुली) १४,६५,४२३ (नियमित)	१,८७,४०३ (समायोजन ग्रेड)	
०७७/०७८	७१,८०,०००	७१,८०,००० (पेशकी)	०	
०७८/०७९	७७,४३७		७७,४३७	
०७९/०८०	९१,७०३.९३ (असुल) २३,७८,७१३.४८ (नियमित)	६२,१६४.०० (असुल)	२९,५३९.९३ (असुल) २३,७८,७१३.४८ (नियमित)	
कुल जम्मा				

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

कार्यालय भवन मर्मत संभार कार्य



40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

लक्ष्मी खोला मुहान लहरेवर सिंचाइ योजना



भालु खोला भिर/पहिरोमा बनाइएको कुलो संरचना

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

जनता लक्ष्मी नहर सिंचाइ योजना, महालक्ष्मी न.पा. ५ र ७, धनकुटा



ढिँढी खोलामा बनाइएको I-Beam Pipe Crossing

40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

ढंगढाढा होंग्रांगे सिंचाइडडोजना, ढहालकुषुढी न.ढा. द र ९, धनकुटा



40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

महालक्ष्मी खोला याडपाड सिंचाइ योजना, महालक्ष्मी न.पा.- ७, धनकुटा



40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

मिदुवा इनामे सि.यो.सि.यो. साँगुरीगढी-३, धनकुटा



40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

लेउतिखोला तटबन्धन, साँगुरीगढी- ६, धनकुटा



40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

कौलचौर पोखरी सिचाई योजना, महालक्ष्मी ९, धनकुटा



40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

करुवा टार सिंचाई आयोजना निर्माण तथा मर्मत, धनकुटा नगरपालिका- ९



40% of food is produced from 20% of irrigated land, FAO

