




प्रदेश सरकार
खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय
कोशी प्रदेश



आ.व. २०८१-०८२ को
वार्षिक तथा चौथो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा

मिति २०८२/०४/०५



प्रस्तुतकर्ता
धिरज पोखरेल
सि.डि.ई.

जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा

वार्षिक प्रगति सारांश

सि.नं	कार्यक्रम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति (वार्षिकको आधारमा)	
		वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
(क)	पुजीगँत (श्रोतगत)				
१	संघ तर्फ	-	-	-	-
२	प्रदेश तर्फ	१०१,५००.००	९३,०७२.०८	९१.७%	९६.३%
	जम्मा	१०१,५००.००	९३,०७२.०८	९१.७%	९६.३%
(ख)	चालु तर्फ	१५,२५०.००	१२,०७१.४५	७९.२%	
कुल जम्मा		११६,७५०.००	१०५,१४३.५२	९०.१%	

आ.व. २०८१-०८२ को कार्यक्रमगत बार्षिक प्रगति विवरण

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम (ब.उ.शि.नं.)	योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	योजना सम्झौता संख्या	योजना सम्पन्न संख्या	हाल सम्मको खर्च रु. हजारमा	बार्षिक वित्तिय प्रगति %	बार्षिक भौतिक प्रगति %
१	३१३०२१०७४ (प्रदेश जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम)	२६	१९५००	२६	२६	१८९८७	९७.४%	१००.०%
२	३१३०२१०६४ (प्रदेश जलस्रोत तथा सिंचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम)	३४	८२०००	३४	३४	७४०८५	९०.३%	९५.४%
	जम्मा		१०१५००			९३०७२	९१.७%	९६.३%
३	३१३०२१०१३ (जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन- चालु)		१५२५०			१२०७१.४	७९.२%	

बहु वर्षीय योजनाहरूको विवरण र आ.व. २०८१-०८२ मा नया ठेक्का सम्झौता भएका समेत

सि.नं .	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु. (०००)	ठेक्का सम्झौता रकम रु. (०००)	यस वर्षको ठेक्का सम्झौता को खर्च रु.(०००)	आ.व. २०८०-०८१ सम्मको कुल खर्च रु. (०००)	आ.व.२ ०८१-०८२ मा भएको खर्च रु. (०००)	भौतिक प्रगति %	वित्तिय प्रगति %	ठेक्का सम्झौता को म्याद	कैफियत (सम्पन्न / क्रमागत)
१	लेगुवा खाडेप सि.यो., महालक्ष्मी -३ र ४, धनकुटा	२५०	८१६०९.५	४३६९५.६	७६८२		७९९४	३.०	१८.३	२०८४/०१/१२	
२	पुरानो तिनचौतारे झरना सि.यो., महालक्ष्मी -२, धनकुटा	६८	३५९५०.०		-		४९९०	१५.०	१४.०		

आ.व. ०८१/८२ को संक्षिप्त वार्षिक भौतिक उपलब्धि विवरण

• सिंचित क्षेत्रफल विस्तार

- नयाँ क्षेत्रफल विस्तार (Extension) हेक्टरमा- १८
- पुनर्स्थापना (Rehab.) हेक्टरमा- १०५
- लाभान्वित जनसंख्या- ५१६०

धनकुटा	
कूल क्षेत्रफल	९०,०९० हे.
खेतीयोग्य क्षेत्रफल	३५,०५३ हे. (३९%)
सिचाइ योग्य क्षेत्रफल	१६,५०७ हे. (४७%)
सिंचित क्षेत्रफल	६,७५३ हे. (१९.२७%)
(आ.व. २०८१/८२ सम्म)	

• नदि नियन्त्रण तर्फ

- नदि नियन्त्रण योजना संख्या- १५
- नदि नियन्त्रण लम्बाइ मिटरमा- १९५
- नदि नियन्त्रण स्पर संख्या- ८
- जग्गा उकास हेक्टरमा- २३
- लाभान्वित जनसंख्या- ७९०

• पहिरो नियन्त्रण तर्फ

- पहिरो नियन्त्रण योजना संख्या- ११
- पहिरो नियन्त्रण लम्बाइ मिटरमा- २५२
- लाभान्वित जनसंख्या- ४६२

आ.व. २०८१-०८२ मा स्वीकृत भएका बहु वर्षीय योजनाहरूको विवरण (२०८२-०८३ मा प्रस्तावित समेत)

सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा भएको खर्च बजेट रु.(०००)	लाभान्वित घरधुरी / जनसंख्या	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित खर्च बजेट रु.(०००)
आ.व. २०८१-०८२ मा स्रोत सुनिषित भएका योजनाहरू							
१	पुरानो तिनचौतारे झरना सि.यो., महालक्ष्मी -२, धनकुटा	६८	३५,९५०.०	पुनस्थापना	४,९८९.८	३२०/१६००	८,०००
२	लेगुवा खाडेप सि.यो., महालक्ष्मी -३ र ४, धनकुटा	२५०	८१,६०९.५	पुनस्थापना	७,९९३.५	३६२/१८१०	२०,०००
आ.व. २०८२-०८३ मा प्रस्ताव गरिने योजनाहरू							
१	जनकल्याण सिंचाई योजना, महालक्ष्मी -४, चानुवा, धनकुटा	८५	४३,११४.०	पुनस्थापना	०.००	१७५	-
२	त्रिवेणी लिफ्ट सिंचाई योजना, सहिदभुमी - १	१५	१५,०००.०	नयाँ	०.००	४०	२,०००.०
३	छयालुंग लक्तांग सिंचाई योजना, महालक्ष्मी -२, धनकुटा	८.८	३,९४७.०	नयाँ	०.००	१२	२,०००.०

आ.व. २०८१-०८२ मा CMIASP-AF कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरूको विवरण

सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा विनियोजित बजेट रु.(०००)	लाभान्वित घरधुरी / जनसंख्या	कैफियत
१	बिरेन्द्र कुलो सिंचाई उप- आयोजना, महालक्ष्मी-३ र ४, धनकुटा	१०६	५१३४२	पुनस्थापना	४९५०	९३/५६९	आर्थिक प्रस्ताव मुल्यांकन गरि पठाइएको . बोलपत्र मान्य अवधि समाप्त भइ सक्दा पनि सहमति पत्र न आएको
२	तिनदोभाने केराबारी सिंचाई उप-आयोजना, धनकुटा-२, धनकुटा	९८	४४०५५	पुनस्थापना	३९६०	७५/५११	

आ.व. २०८१/-८२ मा बिस्तृत अध्ययन भएका योजनाहरूको विवरण


सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित बजेट रु.(०००)	लाभान्वित घरधुरी / जनसंख्या	योजनाको प्रथमिकरण (P १,P २,...)
१	जनकल्याण सिंचाई योजना, महालक्ष्मी -४, चानुवा, धनकुटा	८५	४३११४	पुनस्थापना	०	१७५	
२	त्रिवेणी लिफ्ट सिंचाइ योजना, सहिदभुमी - १	१५	१५०००	नयाँ	२०००	४०	
३	बाहुनी खोला स्प्रिङ्गलर सिं यो, पाख्रीबास न पा, मुगा, धनकुटा	८.८	३९४७	नयाँ	२०००	१२	

बेरुजुको अवस्था

आ.ब.	बेरुजु रकम (रु)	फर्छेँयौट भएको बेरुजुको रकम (रु)	फर्छेँयौट हुन बाँकि बेरुजु (रु)	कैफियत
२०८०/८१	०.००	०.००	०.००	
कुल जम्मा	०.००	०.००	०.००	


उपलब्धी सम्बन्धी फोटो

पुरान तिन चौतारे झरना सिं योजना, महालक्ष्मी न.पा.- २, धनकुटा

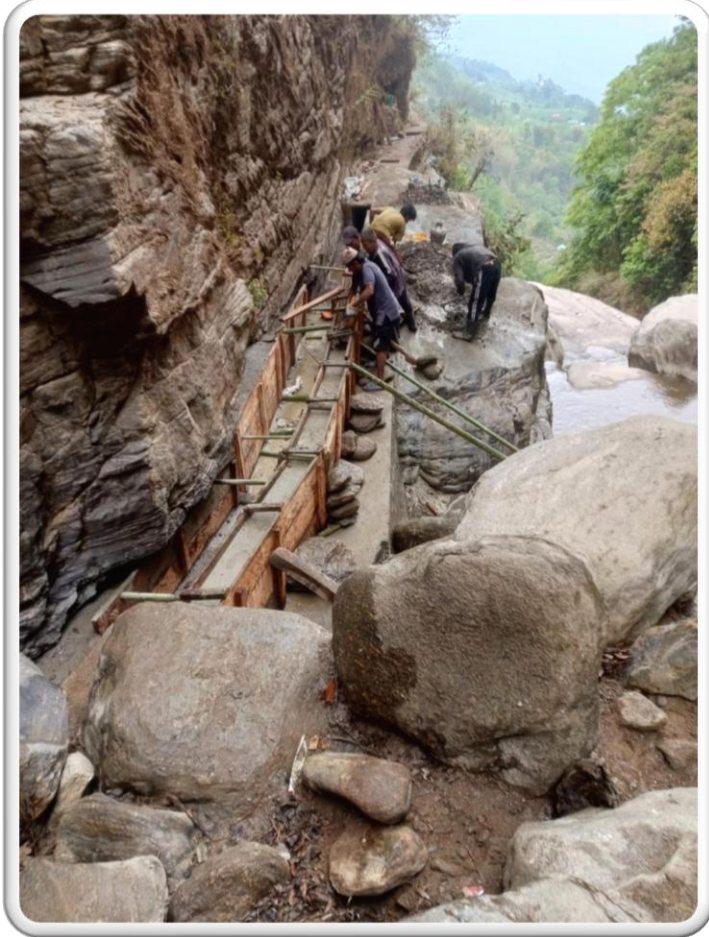

Intake Repair, RCC Canal and RRM Canal

जनकल्याण सिंचाई योजना, महालक्ष्मी न.पा.- ४, चानुवा, धनकुटा

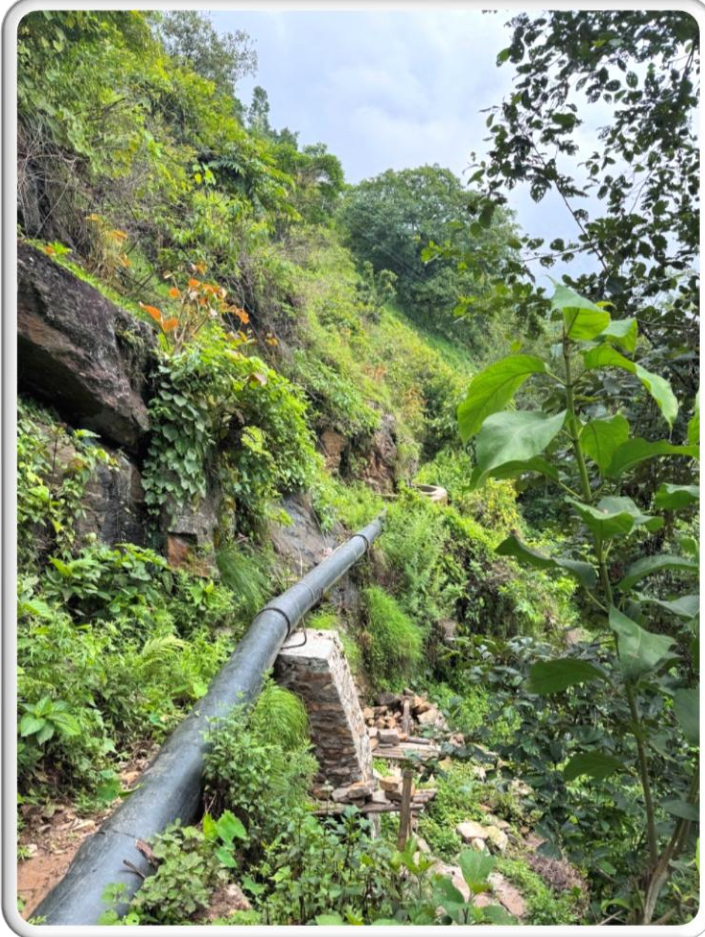


RRM wall for Pipe Support, RCC Canal, and Diversion Structure after natural drop

स्वारा कुलो सिंचाइ योजना, महालक्ष्मी न.पा. ३ र ४, धनकुटा



RCC canal lining & Division Box

मिदुवा इनामे सिंचाई योजना, साँगुरीगढी गा.पा.- ३, इनामे, धनकुटा

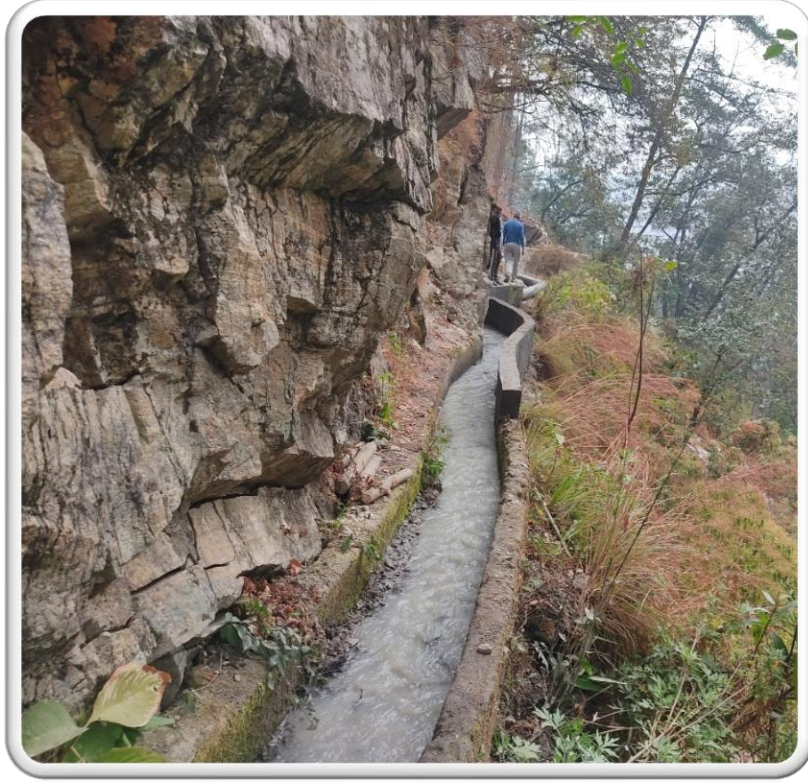

विकट क्षेत्रमा रहेको कुलोको पुनर्निर्माण

तल्लो केवाखोला सि.यो., चनुवा २ र ९, धनकुटा



Repair of Super passage, RRM wall and Division box

पुनर्भरण (Recharge) पोखरी सिंचाइ कार्यक्रम



धुमे खोला छाँगे दक्षिणधाप सिंचाइ योजना, सहिदभुमी गा.पा.- १, धनकुटा



Reservoir Tank

फेदाकजुंग सि.यो., चौबिसे -१, धनकुटा



Intake at Gyami khola, Collection Chamber and Pipeline works.

लेउती खोला तटबन्धन कार्य, साँगुरीगढी-६, धनकुटा



बाढीले कटान गरेको स्थानमा स्पर संरचना

लाम्पाते खोला नियन्त्रण, धनकुटा न.पा-८



फुर्चिलिंग गुम्बा, छथर जोरपाटी-०६ पहिरो नियन्त्रण

धन्यवाद

