




कोशी प्रदेश सरकार
खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्रालय
बिराटनगर, नेपाल



आ.व. २०८२-०८३ को
दोश्रो त्रैमासिक प्रगति समिक्षा

मिति २०८२/१०/ ८ र ९



प्रस्तुतकर्ता
रणजीत कुमार झा
डिभिजन प्रमुख
जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, मोरङ

डिभिजनको संगठन संरचना तथा पदपूर्तिको अवस्था

पद/ समुह/तह	कूल स्वीकृत दरबन्दी	पदपूर्ती भएको स्थायी दरबन्दी	कूल रिक्त स्थायी दरबन्दी	करार
सि. डि. ई. (सिभिल/इरिगेशन)(नवौं/दशौं)	१	१		
इन्जिनियर (सिभिल/इरिगेशन)(सातौं/आठौं)	३	३		
लेखा अधिकृत (प्रशासन)(पाचौं/छैठौं)	१	१		
प्रशासन अधिकृत (प्रशासन)(पाचौं/छैठौं)	१	१		
सब इन्जिनियर(पाचौं/छैठौं)	५	५		
कम्प्युटर अपरेटर(पाचौं/छैठौं)	१	१		
सि.ए.ओ.(छैठौं)	१	१	गत आ.व. देखि रिक्त	तत्कालै व्यवस्थापनको लागि अनुरोध
सवारी चालक	१	१		१
कार्यालय सहयोगी	२	१	१	१
जम्मा	१६	१५	१	२

दोश्रो त्रैमासिकको वित्तिय तथा भौतिक प्रगति

सि.नं	कार्यक्रम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति (त्रैमासिकको आधारमा)	
		दोश्रो त्रैमासिक बजेट	दोश्रो त्रैमासिक खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
(क)	पुजीगँत (श्रोतगत)				
१	संघ तर्फ	३९२८३	१३६३०.२०	३४.६९	४०
२	प्रदेश तर्फ	९५६५०.००	६९४९.११	७.२६	४३.५
	जम्मा		२०५७९.३१		
(ख)	चालु तर्फ	४९७९.००	३७८१.००	७५.९३	८०
	कुल जम्मा		२४३६०.३१		

दोश्रो त्रैमासिकसम्मको प्रगति सारांश


सि.नं	कार्यक्रम	बजेट (रु.हजारमा)		प्रगति (वार्षिकको आधारमा)	
		वार्षिक बजेट	हाल सम्मको खर्च	वित्तिय %	भौतिक %
(क)	पुजीगँत (श्रोतगत)				
१	संघ तर्फ	१३९२९९.००	१३६३०.२०	९.७८	२०
२	प्रदेश तर्फ	२१४२००.००	६९४९.११	३.२४	४४
	जम्मा	३५५२६२.००	२०५७९.३१	५.७९	
(ख)	चालु तर्फ	२२७००.००	३७८१.००	१६.६६	१८
	कुल जम्मा	३७७९६२.००	२४३६०.३१	६.४५	

आ.व. २०८२- को कार्यक्रमगत दोश्रो त्रैमासिकसम्मको प्रगति विवरण


सि.नं.	कार्यक्रमको नाम (ब.उ.शि.नं.)	योजना संख्या	कुल विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	योजना सम्पन्न संख्या	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	कैफियत
१	३१३०२१०६४-प्रदेश जलस्रोत तथा सिंचाई विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम	७४	१०४२००	२	५.९९	४८	
२	३१३०२१०७४-प्रदेश जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम	६८	९४०००	१	०.७५	३९	
३	३१३९११२३४-नदी नियन्त्रण (संघ शसर्त अनुदान)	१	१००००	०	०	०	
४	३०८०३१२२४-विपद प्रभावित जलस्रोत तथा सिंचाई पुनर्स्थापना आयोजना	१	१४,९३०	०	१६.३३	१०	
५	३०८०३१०५४-सिंचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना	२	१२६,१३२	०	९.१	५	

[illegible]


सिंचाइ तर्फको स्थिति

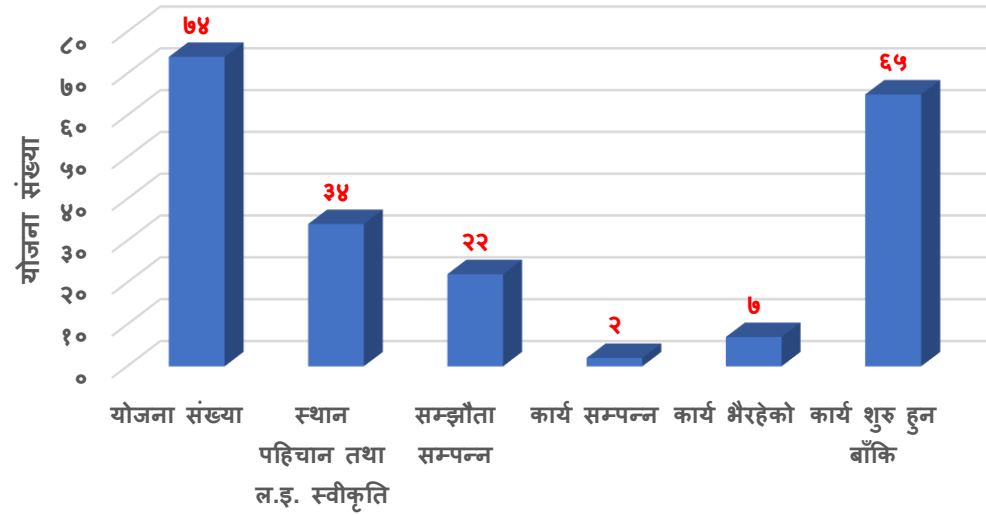

नदी नियन्त्रण तर्फ

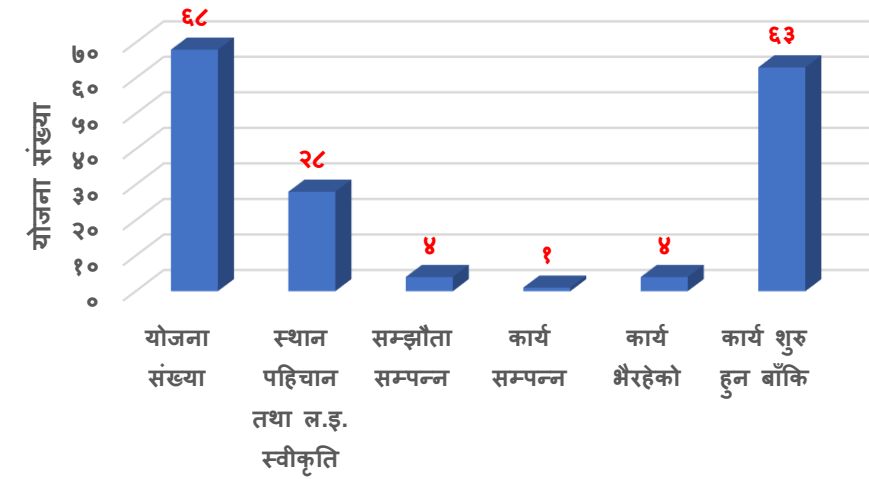

ज.उ.स.नविकरण विवरण

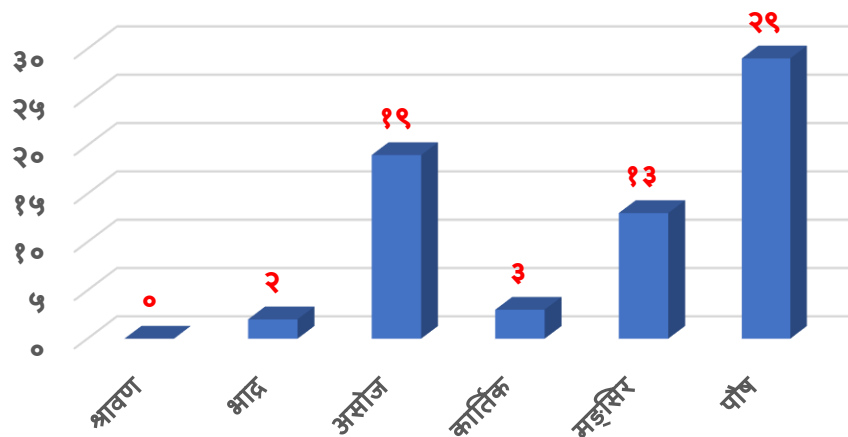

- पौषको आधा सम्म खेत खाली नहुनेगरेको
- ज.उ.स. नविकरण अन्तिममा गरौउने गरेको (पौष मसान्त सम्म)
- खोलामा पानी कम भएपछि काम हुनेगरेको

सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	योजनाको प्रकार (नया/पुनस्थापना)	आ.व. २०८१-०८२ मा भएको खर्च बजेट रु.(०००)	लाभान्वित जनसंख्या	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित खर्च बजेट रु.(०००)
--------	-------------	------------------------	-------------------	------------------------------------	--	--------------------	---

आ.व. २०८१-०८२ मा स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू

१	Sita Dans Kerkha ISP	३७०	२०८२७६.४	Rehab	०	२१०१	३१६२०
२	Adarsha Paini ISP	२३०	७८५२५.९	Rehab	०	२२९५	९२३२०
३	Letang Kamalpur Beldangi IP	१२०	६०६०८	Rehab	०	१०४५	१५०००
४	Maulibari Bakraha IP	२२७	७४८८३	Rehab	०	१३७०	१६०००
५	Latikhola Trishakti Badh IP	१५०	२११६६.७	Rehab	०	१२५०	१४९३०

आ.व. २०८२-०८३ मा IMEP कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरुको विवर

(b) Batch समेत

						खर्च रु. हजारमा	
सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	ठेक्का सम्झौता रकम	आ.व. २०८१-०८२ सम्मको खर्च रु.	आ.व. २०८२-०८३ मा विनियोजित बजेट रु	दोश्रो त्रैमासिक समको खर्च रु.
१	Sita Dans Kerkha IS P	३७०	२०८२७६.४	१२३५७३.९	०	३१६२०	२१९१५
२	Adarsha Paini IS P	२३०	७८५२५.९	३९४४५.२२४	०	९२३२०	९७८५.६
३	Sirajim dari Paini IS P	३०९	०	०	०	०	०
४	Bhuwa Chisang Janta Bikash IS P	२२५	०	०	०	०	०

आ.व. २०८२-०८३ मा ISIP कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजनाहरूको विवरण (ISIP कार्यक्रम संचाल
जिल्लाहरूको लागि)

						खर्च रु. हजारमा	
सि. न.	योजनाको नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे.)	कुल लागत रु.(०००)	ठेक्का सम्झौता रकम	आ.व. २०८१-०८२ सम्मको खर्च रु.	आ.व. २०८२- ०८३ मा विनियोजित बजेट रु	दोश्रो त्रैमासिक समको खर्च रु.
१	Latikhola Trishakti	१५०	२११६६.७	९७८४.४८	०	१४९३०	२१५०.६३

बेरुजुको अवस्था

आ.ब.	बेरुजु रकम (रु हजारमा)	फर्छैँयौट भएको बेरुजुको रकम (रु हजारमा)	फर्छैँयौट हुन बाँकि बेरुजु (रु हजारमा)	कैफियत
०७५/०७६	१२३३.५५५	१२२८.२६२	५.२९३	आ.व. २०८१/८२ मा केही नियमित भएको, सम्परीक्षण हुन बाँकि
०७६/०७७	२०४५२.९२८	१५८०७.९९९	४६४४.९२८	
०७७/०७८	११२०७.९०३	८९११.४२६	२२९६.४७७	
०७८/०७९	६८२२.८७३	६६८९.८८९	१३२.९८४	
०७९/०८०	३७१४.५५७		३७१४.५५७	
कुल जम्मा	४३४३१.८१६	३२६३७.५७६	१०७९४.२४	

अवसर, चुनौती तथा सुझाव

योजनाको संख्या धेरै रहेको (१५० वटा भन्दा बढी)	अनुगमन, मुल्यांकन, नियन्त्रण, मर्मत, संस्थागत विकास (ज.उ.स. दर्ता /नविकरण,तालिम आदि मा समस्या)
जेन जी आन्दोलन पश्चातको अवस्था	गाडी/बाइक/लैपटोप, भवन मर्मत समेतको लागि विशेष आर्थिक सहयोग
नदी नियन्त्रण कार्यको लागि निर्देशिका, मापदण्डको व्यवस्था	आवश्यक व्यवस्था हुन जरुरि (सिंचाइ ऐन/ नियमावली रहेको)
संस्थागत शाखाको चुनौती	- सानो बजेटमा दर्ता/नविकरण गर्न इच्छुक नहुने गरेको - कर्मचारीको उपस्थिति सम्भव नहुने गरेको - जलस्रोत समितिमा दर्ता भएको/हुनेको के गर्ने ? - आ.व. २०८१/८२ मा कूल संस्था दर्ता/नविकरण १३७ वटा (पौष मसान्त सम्म नविकरण ६६ वटा) - कर कार्यालयमा झन्झट हुने गरेको गुनासो
स्थान नखुलेको योजनाहरु	सरोकारवालाहरु संग आपसी समन्वय तथा सहयोगमा गरिने (criteria बनाइ जाने)
सुशासन	वृत्ति विकास लगायतको सम्बन्धमा विचार गरिनुपर्ने
सिंचाइ योजना मर्मत सम्भारको बजेट व्यवस्थापन	मर्मत सम्भार कोष खडा गर्न उचित हुने
योजना बैंकमा समावेश गरिने/हुने योजना, कार्यविधि, प्रक्रिया बारे अन्यौल महसुस गरिएको	प्रदेश योजना बैंक संग सम्बन्धित कार्यविधि बारे तालिम/गोष्ठी हुनु पर्ने (प्रदेश योजना आयोग संग समन्वय गरेर)





लाटीखोला त्रिशक्ति बाँध
ISIP



सुनझोडा सि. यो.



शान्ति
पथ
सि.यो.





आदर्श पैनी



IMEP



सीता डान्स सि. यो.





धन्यवाद
