



आर्थिक वर्ष २०८३ को

नीति तथा प्रमुख कार्यक्रम र बजेटको कार्ययोजना कार्यान्वयनको
२०८२ मङ्सिर महिनासम्मको प्रगति (सारांश)



नेपाल सरकार

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
(नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा)

सिंहदरबार, काठमाडौं



विषयसूची.....	i
तालिका सूची.....	ii
लेखाचित्र/वृत्तचित्र सूची.....	iii
सङ्क्षेपीकरणको सूची.....	iv
वाक्य विश्लेषण.....	v
१. पृष्ठभूमि	१
२. कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगति स्थिति	५
३. राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति	१४
३.१ राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति.....	१४
३.२ खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति	१५
३.३ मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको विवरण	१६
४. क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	१८
४.१ क्रियाकलापको प्रगति स्थिति	१८
४.२ माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	१९
५. क्षेत्रगत प्रगति स्थिति	२२
५.१ आर्थिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति	२२
५.२ पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति	२६
५.३ शासकीय सुधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति	२९
५.४ सामाजिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति	३४
६. मन्त्रालय/ निकायगत माइलस्टोनको २०८२ मङ्सिरसम्मको प्रगति.....	३७
७. समस्या र कारणहरूको विश्लेषण.....	३९
८. सुझावहरू.....	४५

२०८१/०८/०८



तालिका नं.	विषय	पेज नं.
१	प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकको प्रगति स्थिति	५
२	राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति	१४
३	सरकारी खर्चको प्रगति स्थिति	१५
४	मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्च	१६
५	क्रियाकलापहरूको प्रगति स्थिति	१८
६	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको क्षेत्रगत प्रगति स्थिति	२०
७	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	२१
८	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२२
९	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२३
१०	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२४
११	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२५
१२	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	२६
१३	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	२७
१४	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	२८
१५	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	२८
१६	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	२९
१७	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३०
१८	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३१
१९	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३३
२०	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	३४
२१	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	३५
२२	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	३६
२३	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	३६
२४	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	३७
२५	निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको विषय	३९
२६	निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्नेमा चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	४०
२७	लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारण/ समस्या	४२
२८	लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका मन्त्रालय/निकायगत कारण	४३



चित्र नं.	विषय	पेज नं.
१	लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन	१४
२	लक्ष्यको तुलनामा कुल खर्च	१५
३	मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च	१७
४	सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलापको प्रगति स्थिति	१८
५	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	१९
६	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलना	१९
७	सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	२०
८	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२३
९	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	२७
१०	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३१
११	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	३५
१२	सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सुरु नभएको प्रतिशत	४१



(क) नेपाली

आ.व.	आर्थिक वर्ष
कि.मी.	किलोमिटर
क.सं.	क्रम सङ्ख्या
क्यू.फि.	क्यूबिक फिट
प्र.म.तथा म.प.का.	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
मे.ट.	मेट्रिक टन
मे.वा.	मेगावाट
स.कि.मी.	सर्किट किलोमिटर

(ख) अङ्ग्रेजी

COPOMIS	Co-operative and Poverty-Related Management Information System
DPR	Detailed Project Report
EIA	Environmental Impact Assessment
IEE	Initial Environmental Examination
IT	Information Technology

वाक्यविश्लेषण



१. क्रियाकलाप- कुनै विशेष उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिने मुख्य कामको गतिविधि
२. माइलस्टोन-कुनै क्रियाकलाप प्राप्तिको क्रममा निश्चित समयसीमाभित्र पुरनु पर्ने लक्ष्य निर्धारण सहितको महत्त्वपूर्ण मापनयोग्य प्रगति वा उपलब्धि जनाउने विन्दु।
३. मडिसर महिनासम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप/माइलस्टोन - मडिसर महिनासम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएका क्रियाकलाप/माइलस्टोन।
४. मडिसर महिनासम्ममा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोन- साउन महिनादेखि मडिसर महिनासम्ममा सुरु भई क्रमशः निश्चित लक्ष्य हासिल गर्दै पछिल्ला महिनाहरूमा सम्पन्न हुनेगरी निर्धारण गरिएका माइलस्टोन।
५. लक्ष्य प्राप्त भएका- तोकिएको महिनामा सुरु भई निर्धारित लक्ष्य प्राप्त भइसकेका चालु अवस्थाका माइलस्टोन।
६. लक्ष्य प्राप्त नभएका- तोकिएको महिनामा सुरु भई निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेका चालु अवस्थाका माइलस्टोन।
७. सुरु नभएका- तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने वा निश्चित लक्ष्यसहित सुरु हुनुपर्नेमा सुरु हुन नसकेका क्रियाकलाप/माइलस्टोन।






१. पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटद्वारा निर्धारित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू, तिनसँग जोडिएका प्रक्रियागत तथा नतिजामुखी माइलस्टोनहरू र कार्यान्वयनपछि मन्त्रालय/निकायहरूले आवधिक रूपमा हासिल गर्ने नतिजा सूचकहरूको रूपरेखासमेत निर्धारण गरिन्छ। यसरी सम्पादित क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनहरूको प्रगति प्रतिवेदन गर्न एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणाली लागु गरिएको छ, जसमा प्राप्त विवरणहरूका आधारमा आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ।

एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीले अनुगमन पद्धतिलाई नतिजामुखी बनाई लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुऱ्याएको छ। यसले कार्यसम्पादन गर्ने निकायहरूबाट विभिन्न निकायहरूमा छुट्टाछुट्टै पेस हुने प्रतिवेदनहरूलाई एउटै प्रणालीमार्फत एकीकृत गर्दै अनुगमन गर्ने निकायहरूले प्राप्त गर्ने सूचनामा एकरूपता कायम गरेको छ, साथै यस्ता सूचना तथा प्रतिवेदनहरूलाई सुरक्षित राखी दीर्घकालीन प्रयोगमा ल्याउन मद्दत गरेको छ। यसवाहेक, कार्यसम्पादनको वस्तुगत जानकारी, देखिएका समस्या र तिनका समाधानका उपायहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने अनुगमनको अनुगमन कार्यका साथै निर्णायक तहसम्म निर्णय निर्माणमा पनि सघाउ पुऱ्याएको छ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई संवत् २०८२ साल वैशाख १९ गते गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन तथा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत सबै मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र चालु आर्थिक वर्षबाट अनुगमनका लागि थप गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय गरी ३० वटा मन्त्रालय/निकायहरूको कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि माइलस्टोन तयार गर्दा मन्त्रालयहरूले स्वीकृत गरी लागु गर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, मार्गदर्शन संशोधन र स्वीकृति, लागत अनुमान तयार, बोलपत्र आह्वान वाहेकका सूचना प्रकाशन, कुनै कार्य गर्न कार्यदल/समिति गठन,



ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, अध्ययन प्रतिवेदन आदिका मस्यौदा तयार, मन्त्रालयस्तरीय समीक्षा, कार्यशाला, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम प्रदान गर्ने मुख्य कार्यक्षेत्र भएका निकायहरू बाहेक अन्य निकायहरूबाट प्रदान हुने कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य, वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त नभएका एवम् स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नभएका कार्यहरूलाई माइलस्टोनमा समावेश नगरी प्रक्रियागतभन्दा नतिजामुखी माइलस्टोनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

घोषित नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि ती नीतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई आवद्ध गर्दै समयतालिकासहितको कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने क्रममा आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न चरणहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको उपस्थितिमा आवश्यक छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको थियो। यस क्रममा मन्त्रालय तथा निकायगत वार्षिक वजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादात्म्यता विश्लेषण गरी एकअर्कासँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो। कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा यस कार्यालयबाट मन्त्रालय/निकायहरूलाई पठाइएको कार्ययोजना तर्जुमा मार्गदर्शन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी वजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो। उक्त मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरूले कानुनी तयारीका रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू जस्तै नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा, विद्यमान कानून संशोधन, आयोजना तथा क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन, बोलपत्र सम्झौताजस्ता माइलस्टोनको समय सामान्यतः प्रथम त्रैमासिकमा निर्धारण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका र वजेट वक्तव्यमा उल्लिखित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूहरूबीच मिति २०८२/०४/२९ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्ययोजनामा कुल क्रियाकलाप ९९६ र माइलस्टोन १,९०० रहेकोमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता र नतिजासमेतलाई ध्यानमा राखी प्रक्रियागत रूपमा रहेका माइलस्टोनलाई हटाइएको तथा नतिजामा बढी केन्द्रित गरिएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ७०३ क्रियाकलाप र १,०८८ माइलस्टोनका साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय,



महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतका ३९२ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको थियो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०८२/०६/०५ मा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारू, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरूत्थान र राहतसमेतका लागि आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने भनी अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ११६, मिति २०८२/०६/०७ गतेको पत्रवाट उल्लेख भई आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को माइलस्टोन तथा प्रमुख कार्य सम्पादन सूचक, आयोजनाको टेक्काको विवरण, आयोजनाको भौतिक र वित्तीय लक्ष्य स्वदेशी/विदेशी स्रोत रोक्का/कटौती भएका कारण प्रभावित भएका माइलस्टोन तथा सूचक अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८२/०६/३० को नेपाल सरकार मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयहरूवाट प्राप्त विवरणअनुसार २० वटा क्रियाकलाप र २७ वटा माइलस्टोन प्रणालीवाट हटाई जम्मा ६८३ क्रियाकलाप र १,०६१ माइलस्टोनहरू कायम गरिएको छ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मन्त्रालय/निकायहरूका क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको क्षेत्रगत प्रगति स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्मको बजेट खर्च स्थिति समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्याङ्क एवम् विवरणहरू विषयगत मन्त्रालय/निकायहरूवाट एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएका, नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयवाट प्रकाशित विवरणमा आधारित छन्।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०६/०५ को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त विभागहरूको वार्षिक कार्ययोजनालाई चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनादेखि सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत राखिएको छ।

एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा गरिएको मन्त्रालय/निकायहरूको कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति अवस्थालाई विश्लेषण गर्न मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई कार्यप्रकृतिका आधारमा ४ वटा प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। प्रमुख क्षेत्र र ती क्षेत्र अन्तर्गत रहने मन्त्रालय/निकायहरू देहायअनुसार छन्-



- क. **आर्थिक क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरी ६ वटा मन्त्रालयहरूर लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत गरी ७ वटा निकायहरू समावेश छन्।
- ख. **पूर्वाधार क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय गरी ५ वटा मन्त्रालयहरू समावेश छन्।
- ग. **शासकीय सुधार क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय गरी १३ वटा मन्त्रालय/निकायहरू समावेश छन्।
- घ. **सामाजिक क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गरी ५ वटा मन्त्रालयहरू समावेश छन्।



२. कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगति स्थिति

- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयहरू र लगानी बोर्डको कार्यालय समेतका ३९२ वटा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको थियो। प्रणालीमा प्रविष्टि सूचकमध्ये मडिसर महिनासम्मका लागि २६५ वटा सूचकहरूको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १०७ वटा सूचकहरूले लक्ष्य प्राप्त गरेका र १५८ वटा सूचकहरूले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। मडिसर महिनासम्ममा निश्चित लक्ष्य तोकिएका र प्रगति प्रविष्टि गरिएका केही प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगति स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ।

तालिका: १- प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकको प्रगति स्थिति

क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ मडिसरसम्मको लक्ष्य	२०८२ मडिसरसम्मको प्रगति	निकाय
१	चालु आ.व.मा हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो फछपौट	प्रतिशत	५४	६०	२५	३९.५१	प्र.म. तथा म.प.का.
२	मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	प्र.म. तथा म.प.का.
३	हेलो सरकारमा हालसम्म प्राप्त गुनासोको औसत फछपौट	प्रतिशत	६५	१५	६९.५	६६.०१	प्र.म. तथा म.प.का.
४	वैदेशिक सहायता प्राप्ति	रु. अर्व	१५८.२	२८७	९९	४१.३६	अर्थ
५	राजस्व परिचालन (घोडफाट हुने राजस्व समेत)	रु. अर्व	११९६.२	१४८०	१२०.३३	४०९.७८	अर्थ
६	औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति*	प्रतिशत	४.०६	५.५	५.५	१.११	अर्थ
७	मुक्तानी सन्तुलन	रु. अर्व	४९.४,४४	२००	८३.३३	३१८.४	अर्थ
८	चालुखाता सन्तुलन*	रु. अर्व	४०९.२	११६	४८.३३	२७९.६५	अर्थ
९	विदेशी विनिमय स्थितिभित्रको न्यूनतम पर्याप्तता (वस्तु तथा सेवा)	महिना	१५.४	७	७	१०.४	अर्थ
१०	साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामा लगानी/ अनुदानबाट रोजगारी सङ्ख्या	कार्यदिन (हजार)	०	२७६७	५५३	६२५	अर्थ
११	बीमाको पहुँच विस्तार (चायसमा आएको जनसङ्ख्या)	प्रतिशत	४९	५	५०	४९.१२	अर्थ
१२	सङ्घीय पुँजीगत खर्चमा सहजीकरण	प्रतिशत	०	१००	१००	१००	अर्थ
१३	उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानी स्वीकृति	रु. अर्व	६५१	६५	२५	३८.५९	उद्योग

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ वर्षको स्थिति	२०८३/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाश
१४	राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा खाद्यान्न मौज्दात	मे.टन (हजार)	२५	२५	२५	२१	उद्योग
१५	सार्क खाद्य बैंकमा खाद्यान्न मौज्दात	मे.टन (हजार)	८	८	८	८	उद्योग
१६	नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त व्यक्ति	वटा	१७००	३००	४०	८७९	कानून
१७	राजपत्र सम्पादन	वटा	४६६	२६०	११०	३७	कानून
१८	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २० दिनभित्र राय सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	कानून
१९	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २० दिनभित्र नयाँ विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	कानून
२०	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २५ दिनभित्र नयाँ विधेयक तथा नियममा तर्जुमा सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	कानून
२१	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २० दिनभित्र संशोधन विधेयक तथा नियममा तर्जुमा सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	कानून
२२	नेपाल भूसूचना प्रणाली (NeLIS) मार्फत सेवा प्रवाह हुने नापी कार्यालयको सङ्ख्या	कार्यालय	९२	४३	१०५	१०६	भूमि
२३	अग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्नेका भूमिहीन इलिन, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी	सङ्ख्या (हजार मा)	५	४००	२०	९,०९२	भूमि
२४	COPOMIS प्रणाली सञ्चालन भएका सहकारी सङ्ख्या	सङ्ख्या (हजार)	१९,१८९	०,८११	१९,४१	१९,२८६	भूमि
२५	रासायनिक मल आपूर्ति	मे.टन (हजार)	३९३	४५०	२५०	३०६,०५४	कृषि
२६	किसान सुधीकरण	सङ्ख्या (हजार)	२३७०	२४०	२४८०	२३८३	कृषि
२७	दुध उत्पादन	मे.टन (हजार)	२७५१	२७५१	१७५.८	६८८	कृषि



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८१ असारको स्थिति	२०८२ को वार्षिक सकय	२०८२ महिसरसम्मको सकय	२०८२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाय
२८	माछा भुरा उत्पादन	वयु किट (लाख)	७८१.६	७८२	१३८.११	१५.७९२	कृषि
२९	मामु उत्पादन	मेटन (हजार)	४६४	४०३	१२६	१२८	कृषि
३०	अण्डा उत्पादन	गोटा (लाख)	१६८००	१६८००	४२००	४२८०	कृषि
३१	कृषिम गर्माधान	सदस्य (हजार)	७४३	८२०	३२२.५	३१७.३८	कृषि
३२	बाली बीमालेख	सदस्य (हजार)	१.६३४	२.५	०.४	०.५४६	कृषि
३३	खाद्य वस्तुमा बिपत्ती अवशेषको परीक्षण	सदस्य (हजार)	९४	९४	३३.४२८	३८.७२२	कृषि
३४	निर्माण भएका सुरक्षित नागरिक आवास	बटा (हजार)	९२.९९८	५	९३.९९८	९३	शहरी
३५	शहरी सडक निर्माण तथा स्वरोन्नति	कि.मि.	३८००	५६२	३८५६.२	३८६५	शहरी
३६	निर्माण भएका ग्रामीण कालोपत्रे सडक	कि.मि.	५०९.३	३००	५१२३	५०९.८	शहरी
३७	निर्माण भएका झोलुङ्गे पुल	बटा	११२२५	२००	११२४५	११२३०	शहरी
३८	निर्माण भएका स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन	बटा	३६७	६०	३७३	३७४	शहरी
३९	साना सिँचाइबाट सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	३९.५८५	३७००	३९.९४५	४१४४३	शहरी
४०	विद्युत बिस्वविद्यालय किचेट रङ्गशास्त्रा कीर्तिपुर निर्माण	भौतिक प्रगति	१२	२०	२०	२२	शहरी
४१	WASH Plan तयार भएका स्थानीय तह	स्थानीय तह	३११	४९	३२०	३१९	स्वातेपानी
४२	एक घर एक छाराको नक्साङ्कन भएका घर परिवार	सदस्य (हजार)	११२४	२००	११५०	११४५	स्वातेपानी
४३	अपराधका घटनाको अनुसन्धान प्रतिशत	प्रतिशत	८३.०६	७९	७६.२	६२.५	गृह
४४	सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्ति	जना	२५४९	१५२४	४००	४५८	गृह
४५	सडक दुर्घटनाबाट घाइते भएका व्यक्ति	जना (हजार)	४४.२४९	२२.३१४	१४	११.०४६	गृह

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२/८३ प्रसारको स्थिति	२०८२/८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाष
४६	पौच कर्ममुनिवा वालवालिकाको जन्म दर्ता	प्रतिशत	७७.४३	८०	७८.४	८६.९८	गृह
४७	बिपद्का घटनाबाट मृत्यु हुने व्यक्ति	सङ्ख्या (प्रति लाख)	२.२	१	०.२	०.४३९	गृह
४८	बिपद्का घटनाबाट प्रभावित परिवार सङ्ख्या	सङ्ख्या	१७९९६	३७००	१८००	३४४०८	गृह
४९	राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक	प्रतिशत	७५	१०	७८	९४.३९	गृह
५०	राष्ट्रिय परिचयपत्र बितरण	सङ्ख्या (हजार)	३०००	२०००	३८००	३६८९	गृह
५१	सिँचाई सुविधा (सङ्घीयस्तर मात्र)	हेक्टर (हजार)	१४८६.३	६.७५	१४८६.४	१४८६.४७	ऊर्जा
५२	टुला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण	कि.मि.	१४७३.६	४७.२	१४७३.८	१४८१.७७	ऊर्जा
५३	सतह सिँचाई आयोजनाहरूबाट सिंचित क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर (हजार)	१०३४.४	६.०५	१०३४.४	१०३४.४७	ऊर्जा
५४	विद्युत जडित क्षमता	मे.वा.	३९६०	६६६	४९२६.४	४०४६	ऊर्जा
५५	६६ के.भि. भन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण	सर्किट कि.मि.	७९९१	६६८	७९२८	७९९७२	ऊर्जा
५६	३३ के.भि. प्रसारण लाइन विस्तार	सर्किट कि.मि.	८०४८	२८१	८१२८.३	८१८९.२२	ऊर्जा
५७	विद्युत निर्यात	गिगा वाट आवर	२३३२	४९.२९	३७३०	२७३३.२	ऊर्जा
५८	विद्युत आयात	गिगा वाट आवर	१७१२	१२६०	२७	७.१८	ऊर्जा
५९	नियोज्यमार्फत आर्थिक कुटनीतिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन	सङ्ख्या	२००	२७०	३४	४५	परराष्ट्र
६०	विद्युतीय राहदानी बितरण	सङ्ख्या (प्रति हजार)	४७३५	११००	४२०	३९१	परराष्ट्र
६१	कन्सुलर सेवा अन्तर्गत कागजात प्रमाणीकरण	सङ्ख्या (हजार)	७४७४.९	४००	२००	२६७	परराष्ट्र
६२	विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारमा सहजीकरण	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	परराष्ट्र



क्र.सं.	सूचक	इकाई	२०८२ असारको स्थिति	२०८३/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाय
६३	विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कानुनी सहायता एवं परामर्श प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	परराष्ट्र
६४	पुल निर्माण	बटा	३४३७	१६२	३४४८	३४४७	भौतिक
६५	सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण	सङ्ख्या (लाख)	४०.७१६	६	४३.१	४०.८९	भौतिक
६६	इन्जोस्ट नम्बर प्लेट वितरण	सङ्ख्या (हजार)	७४४.०५	२५०	८००	८३१.०५९	भौतिक
६७	कर्णाली कोरिडोर (लालिथगर-दुल्लिखुञ्ज र घाटपारीचौर-चर्दीगाउँ-मुकाखोला खण्ड) सडक आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कि.मि.	१६	०.४	१६.१८	१६.१८	रक्षा
६८	उत्तर इशिंग राजमार्ग, कोशी कोरिडोर, खीचारी - किमावाङ्ग सडक (न्याम्ताङ-घोङ्पा खण्ड), टुपाक स्तरोन्नति	कि.मि.	०	४.३१	२.१	२.१	रक्षा
६९	महाकाली कोरिडोर दार्चुला-टिड्ढर (तुषारपानी-टिड्ढर खण्ड) सडक आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कि.मि.	१७.४	२.३	१९.४४	१८.३१	रक्षा
७०	बेनीघाट-आरुघाट-लार्केभन्ज्याङ सडक आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कि.मि.	४०	०.८	४०.४८	४०.४८	रक्षा
७१	राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (INDU) निर्माण कार्यको समष्टिगत भौतिक प्रगति	प्रतिशत	७४.०४	२४.९६	८१.७४	८१.७४	रक्षा
७२	सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम	जना	४३६२५	१४०००	४७०९५	४९७६०	रक्षा
७३	काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति	प्रतिशत	४२.९३	१५	४७.७३	४४.४३	रक्षा
७४	वनक्षेत्रबाट सङ्कलित (मु.अ. कर बाहेकको) राजस्व रकम	रु.अर्ब	१.४	१.४	०.४	१.४४	वन
७५	काठ उत्पादन	क्यु. फिट (लाख)	३९९.८४	३००	९०	८३.१९	वन



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाय
७६	शहरा उत्पादन	बट्टा (हजार)	१८.६१	४२	०.०५	०.०४	बन
७७	उत्पादित काट विक्री	क्यू. फिट (लाख)	३८१.०५	३५०	९०	९६.१९	बन
७८	पानी मुहान र पोखरी संरक्षण	सङ्ख्या	३६५	२५३	१०	६	बन
७९	सिमेसारोन्नय व्यवस्थापन	बट्टा	०	४३	३	१	बन
८०	उद्योग प्रतिष्ठानको बानाबरग प्रदूषणसम्बन्धी निरीक्षण एवम् अनुगमन	सङ्ख्या	१०३	२५	५	५	बन
८१	बानाबरगीय प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नदीनाला, तालतलैयाको पानी तथा उद्योग, कलकारखाना- बाट निष्कासित फोहोर पानी लगायतका नमुना सङ्कलन तथा विश्लेषण	सङ्ख्या	९१	४०	१५	३७	बन
८२	राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना	बट्टा	०	३०	३	१९	युवा
८३	अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना	बट्टा	०	११	३	४	युवा
८४	खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण	जना	१०४	१०४	१०४	१४०	युवा
८५	मिप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण	सङ्ख्या (प्रति हजार)	५१९.४	५०	५३२	५२३.९	शिक्षा
८६	दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा मुन्केरी महिलाहरूको हवाइउड्डार	जना	८४३	१००	८७०	८७१	महिला
८७	सडक बालबालिकाको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना, संरक्षण तथा व्यवस्थापन	जना	४४४९	४००	४६८४	४९२४	महिला
८८	वेवारिस तथा असहाय बालबालिकाको बालगृहमा पुनर्स्थापना	जना	७१८	३५०	७२०५	७१४०	महिला
८९	हराएकामध्ये फेला परेका बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन	प्रतिशत	९२.८५	९२	९२	८४.२३	महिला

[Signature]

[Signature] १०

[Signature]

[Signature]



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०७२/०७३ असारको स्थिति	२०७२/०७३ को वार्षिक लक्ष्य	२०७२ महिसरसम्मको लक्ष्य	२०७२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाय
९०	बीप विकास तालिम प्राप्त महिला	सङ्ख्या	४२८९	७०६४	५०३९	५०३९	महिला
९१	सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध लाभप्राप्तिको सङ्ख्या	जना (लाख)	२३.८०२	३.२१८२	२५.१	२६.८४१३	धन
९२	सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने प्रतिष्ठान/रोजगारदाताको सङ्ख्या	जना (हजार)	२०.९७६	३.०२४	२१.८२६	२२.४९६	धन
९३	छोटो अवधिको रोजगारद्वन्मुख व्यावसायिक सीपमूलक तालिम लिने व्यक्तिको सङ्ख्या	जना (हजार)	२४.०८४	२६.७	२	०.०८	धन
९४	वैदेशिक रोजगारीमा जाने सीपयुक्त व्यक्तिको सङ्ख्या	प्रतिशत	७०.६२५	८०	२०	७९.३३	धन
९५	पुनः एकीकरण कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने व्यक्तिको सङ्ख्या	जना	५०००	५०००	१०००	२५५९	धन
९६	धन अडिट गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या	सङ्ख्या	४२७४	५०००	१०००	५९८	धन
९७	पर्यटक आगमन	सङ्ख्या (लाख)	११.२८	१२.५	२	२.२७	संस्कृति
९८	ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण	कि.मि.	६४०	२०	६४४	६४४	संस्कृति
९९	पर्यटन क्षेत्रको शैक्षिक/तालिम प्राप्त जनशक्ति	सङ्ख्या (हजार)	६.५७१	५.३	१	१.५७३	संस्कृति
१००	प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण दर्ता	सङ्ख्या	३०३४	३००	३१५९	३१११	संस्कृति
१०१	अभिलेखको डिजिटाइजेसन	पृष्ठ (लाख)	१२	६	१४	१३	संस्कृति
१०२	कन्चरल ट्रेल	कि.मि.	३३९.२५	१५	३४२.२५	३४४.२५	संस्कृति
१०३	कुल अन्तर्राष्ट्रिय उद्यान सङ्ख्या	सङ्ख्या (हजार)	३३.५५	३३.६	१७.६	१२.६६८	संस्कृति
१०४	स्थानीय तहबाट प्राप्त भएका आवधिक योजनामा पृष्ठपोषण तथा सुझाव प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	सङ्घीय मामिला
१०५	निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा प्रदान (औसत प्रतिदिन)	जना	१११५	१११५	१११५	१०३१	सङ्घीय मामिला
१०६	कर्मचारी प्रशिक्षण/तालिम (अधिकृत स्तर)	जना	२७५९	२२००	६७५	७०५	सङ्घीय मामिला



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाय
१०७	कर्मचारी सेवाकालीन तालिम (राजपथ अनडिजिटल तथा स्थानीय तहका अधिकृतसमेत)	जना	६६०	५७५	२००	२२४	सङ्घीय मामिला
१०८	२४ कोर माथिको अष्टिकल फाइबर बिस्तार	कि.मि.	१८१५९	२३४९	१८९४४	१८८६६.८	सञ्चार
१०९	१२ कोर माथिको अष्टिकल फाइबर बिस्तार	कि.मि.	३१०००	९०००	३४५००	३४०८४.६	सञ्चार
११०	फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा बिस्तार	प्रतिशत	४८.६८	२.०३	४९.१८	४९.२३	सञ्चार
१११	नागरिक पथमा आषट्ट सरकारी सेवा	बटा	६५	५	६७	६७	सञ्चार
११२	फोर जी/एल.टी.ई. सेवा बिस्तार	प्रतिशत	८७.९	५.१	८९.२	८९.२	सञ्चार
११३	Government Integrated Office Management System (GIOMS) लागु भएका सरकारी कार्यालय	बटा	१४०	८६०	४९५	१९०	सञ्चार
११४	एकीकृत वेबसाइट प्रणाली लागु भएका कार्यालय	बटा	१४०	१८४०	९००	५३०	सञ्चार
११५	स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसुति सेवा लिने महिला	प्रतिशत	७८	८०	३३	२६.८	स्वास्थ्य
११६	चौधौ पटकसम्म गर्भवती जाँच गर्ने महिला	प्रतिशत	८९	९०	३८	३०.२	स्वास्थ्य
११७	लोकिए बमोजिम सर्वे खोप प्राप्त बालबालिका	प्रतिशत	९५	९५	४०	२३.४	स्वास्थ्य
११८	क्षयरोग पहिचान दर	जना (लक्ष)	१२५	१३०	५४	४०	स्वास्थ्य
११९	क्षयरोग उपचार सफलता दर	प्रतिशत	९३	९५	९५	८६.४१	स्वास्थ्य
१२०	आयुर्वेद सेवा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या	जना (लक्षर)	२४१०	२४५०	१०००	६७२	स्वास्थ्य
१२१	सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकास	जना	११२३	१२००	५००	४६१	सार्वजनिक खरिद
१२२	सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन/अवययन विवेचन	पटक	१७	३३	१२	१३	सार्वजनिक खरिद
१२३	नयाँ परियोजना पहिचान - (PIN) तयारी	बटा	१२७	३०	१४४	१३४	लगानी बोर्ड
१२४	MoU/लगानी स्वीकृति	रु.अर्व	१६१४	३००	१८१४	१६२३	लगानी बोर्ड



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको लक्ष्य	२०८२ महिसरसम्मको प्रगति	निकाष
१२५	वित्तीय व्यवस्थापन/निर्माण कार्य बालनी	रु अर्ब	२७४	२००	२५४	२५५	लगानी कोई
१२६	लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम (राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय)	बटा	१५	१७	२	२	लगानी कोई
१२७	त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखाको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक	पटक	४	४	१	१	तथ्याङ्क कार्यालय
१२८	मुल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक	पटक	४	४	१	१	तथ्याङ्क कार्यालय
१२९	गणना/सर्वेक्षणका नतिजा तथा विश्लेषण प्रकाशन/सार्वजनिक	सङ्ख्या	२१	९	४	४	तथ्याङ्क कार्यालय
१३०	२०८२ असार महान्त सम्म कायम रहेको शोधभर्ना (रु १५.२ अर्ब) प्राप्ति	प्रतिशत	३१	१००	४५	४२.६२	महालेखा

स्रोत: एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणाली

• नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रकाशित मासिक महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार



३. राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति

३.१ राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरणअनुसार २०८२ मङ्सिर महिनासम्ममा वार्षिक कर राजस्व लक्ष्यको २८.८३ प्रतिशत, वार्षिक गैरकर राजस्व लक्ष्यको १५.५९ प्रतिशत र कुल राजस्व लक्ष्यको २७.४५ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ।


तालिका:२- राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति (रु. अर्बमा)

राजस्व	वार्षिक लक्ष्य	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म सङ्कलित राजस्व	प्रगति प्रतिशत
कर राजस्व	१३२४.४८३९	३८२.२३१०	२८.८३
गैरकर राजस्व	१४४.४९६९	२४.०७२७	१५.५९
कुल	१४८०.००००	४०६.३०३७	२७.४५

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

विगत २ वर्षमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा भएको राजस्व सङ्कलनको अवस्था अध्ययन गर्दा २०८१ मङ्सिर महिनासम्ममा कर राजस्व लक्ष्यको २८.२३ प्रतिशत र गैरकर राजस्व लक्ष्यको २७.४ प्रतिशत गरी कुल राजस्व लक्ष्यको २८.१५ प्रतिशत सङ्कलन भएको थियो भने २०८० मङ्सिर महिनासम्ममा कर राजस्व लक्ष्यको २५.८३ प्रतिशत र गैरकर राजस्व लक्ष्यको २२.४२ प्रतिशत गरी कुल राजस्व लक्ष्यको २४.५५ प्रतिशत सङ्कलन भएको थियो।

लेखाचित्र: १ - लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन (प्रतिशत)

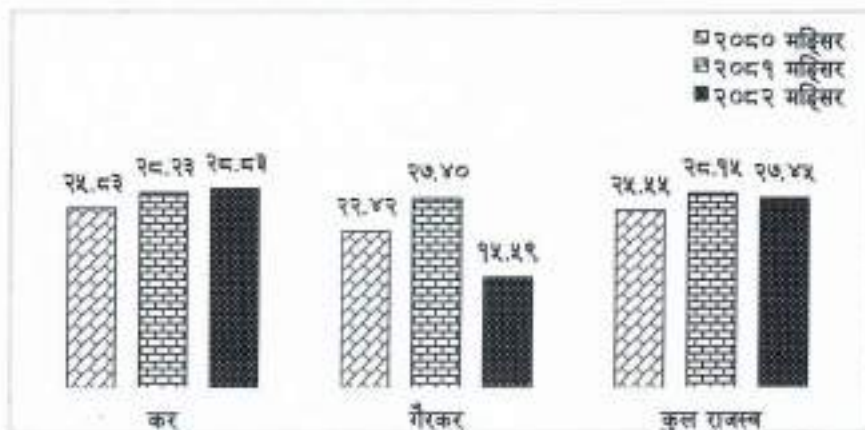

Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page, including a date of १४/११/८२.



३.२ खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरणअनुसार नेपाल सरकारद्वारा विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्ममा २८.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसमध्ये चालुतर्फ ३३.७० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८.३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३५.३२ प्रतिशत खर्च भएको छ।

तालिका: ३- सरकारी खर्चको प्रगति स्थिति (रु. अर्बमा)

विषय	चालु	पुँजीगत	वित्तीय	कुल
कुल बजेट	११८०.९८	४०७.८८८	३७५.२४९	१९६४.११
२०८२ मङ्सिरसम्मको खर्च	३९८.०४७२	३३.८७४३	१३२.४३९७	५६४.४६१२
खर्च प्रतिशत	३३.७०	८.३०	३५.३२	२८.७४

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

वित्त २ वर्षमा वार्षिक विनियोजनका आधारमा प्रथम ५ महिनाको अवधिसम्म भएको सरकारी खर्च अध्ययन गर्दा २०८१ मङ्सिर महिनासम्म चालुतर्फ ३१.८७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ११.५८ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४१.३२ प्रतिशत गरी कुल २९.८९ प्रतिशत खर्च भएको थियो। त्यसैगरी, २०८० मङ्सिर महिनासम्ममा चालुतर्फ ३१.५३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ११.९४ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १८.५२ प्रतिशत गरी कुल २५.८७ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

लेखाचित्र: २ - लक्ष्यको तुलनामा कुल खर्च (प्रतिशत)





३.३ मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको विवरण

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरण अनुसार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयहरूमध्ये पुँजीगत खर्चको ४९.६७ प्रतिशत भार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ११.५६ प्रतिशत, १०.४६ प्रतिशत भार रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ९.१३ प्रतिशत, १०.२१ प्रतिशत भार रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको ३.८८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रगति देखिएको छ।

तालिका: ४- मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च


क्र.सं.	मन्त्रालय	पुँजीगत खर्च प्रतिशत	भार (पुँजीगत खर्चमा)
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय	११.५६	४९.६७
२	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय	९.१३	१०.४६
३	शहरी विकास मन्त्रालय	३.८८	१०.२१
४	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय	१३.८२	६.९९
५	गृह मन्त्रालय	१४.४९	६.६४
६	अर्थ मन्त्रालय	१६.४३	४.६४
७	खानेपानी मन्त्रालय	६.७१	३.९४
८	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय	११.८४	१.६३
९	परराष्ट्र मन्त्रालय	२७.०६	१.१४
१०	रक्षा मन्त्रालय	४.९२	०.९१
११	युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय	७.९८	०.८६
१२	कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय	६.३१	०.६४
१३	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	२३.६	०.४९
१४	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	२.४६	०.३४
१५	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	२.९३	०.३४
१६	महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय	१.४	०.३३
१७	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय	४.६८	०.२७
१८	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	११.४१	०.२१
१९	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	१.६९	०.१९
२०	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय	४.२४	०.०४
२१	संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय	१.३४	०.०१७
२२	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	२०.०४	०.०१
कुल			१००.००

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय



महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरण अनुसार २०८२ मङ्सिर महिनासम्म नेपाल सरकारको कुल पुँजीगत खर्चको प्रगति ८.३ प्रतिशत रहेकोमा उक्त राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा परराष्ट्र; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला; अर्थ; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक; गृह; स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय गरी ११ वटा मन्त्रालय रहेका छन् भने अन्य ११ वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएको देखिएको छ।

लेखाचित्र: ३- मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च (प्रतिशत)

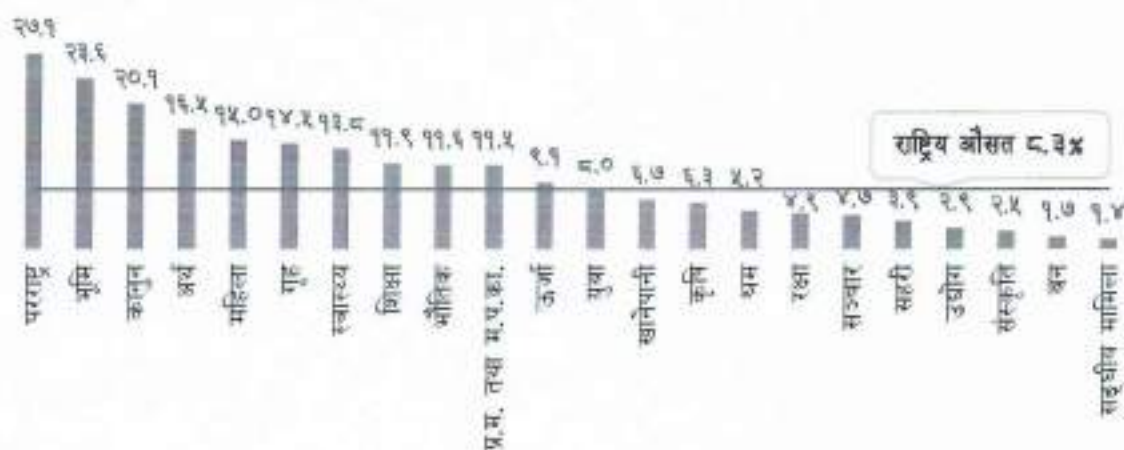

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



४. क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

४.१ क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

आ.व. २०८२/०८३ का लागि विभिन्न ३० वटा मन्त्रालय/निकायको कार्ययोजनामा समावेश भएका कुल ६८३ वटा क्रियाकलापमध्ये २०८२ मङ्सिर महिनासम्ममा २.४९ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छन्। आ.व. २०८१/०८२ यही अवधिमा यस्तो प्रतिशत १.९८ र आ.व. २०८०/०८१ मा ६.१२ रहेको थियो। मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी निर्धारित ५६ वटा क्रियाकलापमध्ये यस अवधिसम्ममा ३०.४ प्रतिशत सम्पन्न, ६०.७ प्रतिशत चालु र ८.९ प्रतिशत सुरु हुन नसकेको देखिएको छ।

लेखाचित्र: ४- मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलापको प्रगति स्थिति



सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलापको प्रगति स्थिति क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा शासकीय सुधार क्षेत्रको सर्वभन्दा बढी ४२.१ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिन्छ भने पूर्वाधार क्षेत्रको कुनै पनि क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छैन।

तालिका:५- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति


क्षेत्र	कुल क्रियाकलाप	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
		सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		सुरु नभएका	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शासकीय सुधार	१७१	१९	८	४२.१	९	४७.४	२	१०.५
आर्थिक	१९१	१७	६	३५.३	१०	५८.८	१	५.९
सामाजिक	११६	१५	३	२०.०	१०	६६.७	२	१३.३
पूर्वाधार	२०५	५	०	०.०	५	१००.०	०	०.०
कुल	६८३	५६	१७	३०.४	३४	६०.७	५	८.९



४.२ माइलस्टोनको प्रगति स्थिति


आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित कुल १,०६१ वटा माइलस्टोनमध्ये मडिसर महिनासम्ममा ४.२४ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन्। मडिसर महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएका १२६ वटा माइलस्टोनमध्ये ३५.७ प्रतिशत सम्पन्न, ५०.८ प्रतिशत चालु र १३.५ प्रतिशत सुरु नभएको अवस्थामा देखिएका छन्।

लेखाचित्र: ५- मडिसर महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

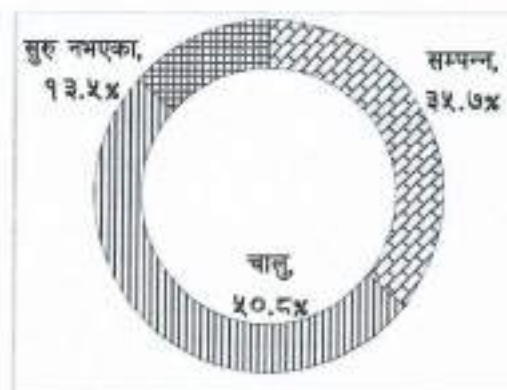

मडिसर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा २०८० मडिसरमा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत ३४.१ रहेको थियो। २०८१ मडिसरमा उक्त प्रतिशत १२.५ अङ्कले वृद्धि भएता पनि २०८२ मडिसरमा १०.९ अङ्कले घट्न गई ३५.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिन्छ।

लेखाचित्र: ६- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलना (प्रतिशत)

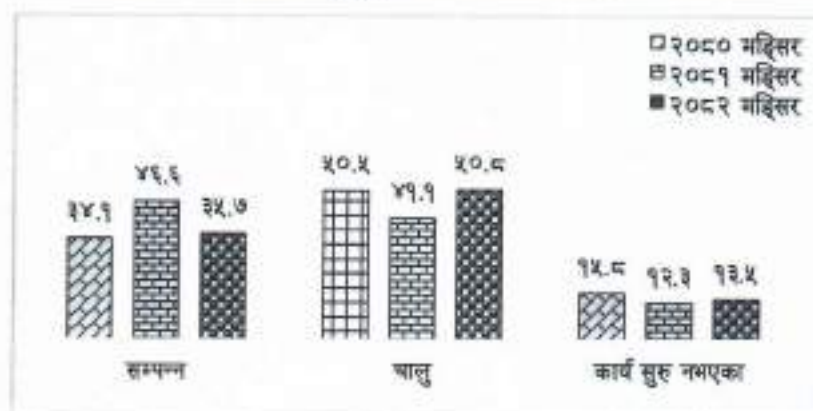

Handwritten signatures and a date stamp (१९/०८/२०८२) are present at the bottom of the page.




मडिसर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा शासकीय सुधार क्षेत्रको सवैभन्दा धेरै ४४.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् भने सवैभन्दा कम पूर्वाधार क्षेत्रको १४.८ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रको १८.५ प्रतिशत र शासकीय सुधार क्षेत्रको १५.८ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नै हुन सकेका छैनन्।

तालिका: ६- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको क्षेत्रगत प्रगति स्थिति

क्षेत्र	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनाभित्र						
		सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		सुरु नभएका	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शासकीय सुधार	२७१	३८	१७	४४.७	१५	३९.५	६	१५.८
आर्थिक	२८०	३४	१४	४९.२	१८	५२.९	२	५.९
सामाजिक	१६५	२७	१०	३७.०	१३	४८.१	४	१४.८
पूर्वाधार	३४५	२७	४	१४.८	१८	६६.७	५	१८.५
कुल	१०६१	१२६	४५	३५.७	६४	५०.८	१७	१३.५

त्यसैगरी, मडिसर महिनासम्ममा प्रारम्भ भई क्रमशः निश्चित लक्ष्य हासिल गर्दै पछाडिको महिनामा सम्पन्न हुने भनी निर्धारण गरिएका ४०७ माइलस्टोनमध्ये ५८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएका, ३५.९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नभएका र ६.१ प्रतिशत सुरु हुन सकेका छैनन्।

लेखाचित्र: ७- मडिसर महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

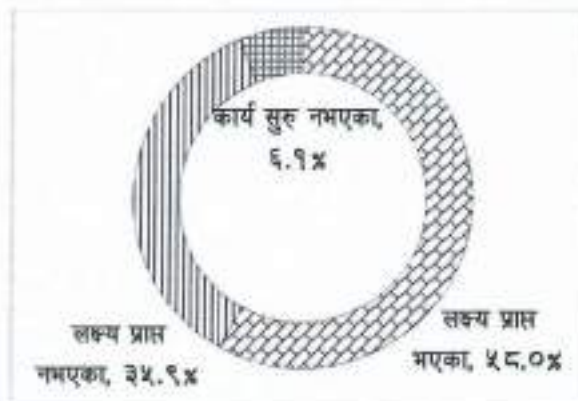

मडिसर महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने ४०७ वटा माइलस्टोनको प्रगति क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक क्षेत्रको सवैभन्दा बढी ६४

[Signatures] २०



प्रतिशत र पूर्वाधार क्षेत्रको सर्वेभन्दा कम प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेको देखिन्छ भने शासकीय सुधार क्षेत्रको ११.३ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नै नभएको देखिन्छ।

तालिका: ७- मडिसर महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

क्षेत्र	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनाभित्र						
		सुरु हुनुपर्ने	लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		सुरु नभएका	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
आर्थिक	२८०	१००	६४	६४.०	३३	३३.०	३	३.०
सामाजिक	१६४	४९	३७	६२.७	२०	३३.९	२	३.४
शासकीय सुधार	२७१	११४	६४	५६.४	३७	३२.२	१३	११.३
पूर्वाधार	३४४	१३३	७०	४२.६	४६	४२.९	७	४.३
कुल	१०६९	४०७	२३६	५८.०	१४६	३५.९	२५	६.१



५. क्षेत्रगत प्रगति स्थिति

५.१ आर्थिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति

५.१.१ आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलापको प्रगति स्थिति


आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने १७ वटा क्रियाकलापहरूको प्रगति स्थिति हेर्दा ३५.३ प्रतिशत सम्पन्न, ५८.८ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको र ५.९ प्रतिशत कार्य सुरु नभएको देखिएको छ। क्रियाकलाप सम्पादनको निकायगत तुलना गर्दा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शतप्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयको ८० प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप रहेको देखिदैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डको कार्यालयको शतप्रतिशत क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको देखिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्धारित एक मात्र क्रियाकलाप सुरु नै हुन नसकेको देखिन्छ।

तालिका: ८- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२२	२	२	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	अर्थ	२५	५	४	८०.०	१	२०.०	०	०.०
३	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	४२	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
४	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	२६	२	०	०.०	२	१००.०	०	०.०
५	लगानी बोर्डको कार्यालय	१९	६	०	०.०	६	१००.०	०	०.०
६	वन तथा वातावरण	२५	१	०	०.०	०	०.०	१	१००.०
७	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	३२	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
कुल		१९१	१७	६	३५.३	१०	५८.८	१	५.९

५.१.२ आर्थिक क्षेत्रको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ३४ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ४१.२ प्रतिशत सम्पन्न, ५२.९ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको र ५.९ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। मङ्सिर महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने

  २२  



माइलस्टोनको सम्पन्न स्थितिलाई निकायगत रूपमा तुलना गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शतप्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सम्पन्न हुनुपर्ने एउटा माइलस्टोन रहेकोमा चालु अवस्थामा रहेको र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सम्पन्न हुनुपर्ने एक मात्र माइलस्टोन सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ।

तालिका: ९- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	४६	२	२	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२५	२	२	१००.०	०	०.०	०	०.०
३	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३४	४	२	५०.०	२	५०.०	०	०.०
४	अर्थ	५५	१४	६	४२.९	७	५०.०	१	७.१
५	लगानी बोर्डको कार्यालय	३३	१०	२	२०.०	८	८०.०	०	०.०
६	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	५४	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
७	वन तथा वातावरण	३३	१	०	०.०	०	०.०	१	१००.०
कुल		२८०	३४	१४	४९.२	१८	५२.९	२	५.९

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूका मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत २०८१ मङ्सिरको तुलनामा ९.२ अङ्कले घटेको र चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोन १७.२ अङ्कले बढेको देखिएको छ। यद्यपि, कार्य सुरु नभएका माइलस्टोनको प्रतिशत गत वर्षको तुलनामा ८ अङ्कले घटेको देखिएको छ।

लेखाचित्र: ८- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र



[Handwritten signatures and dates are present below the chart.]



आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका मडिसर महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने १०० वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ६४ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेका, ३३ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेका र ३ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छन्। लक्ष्य प्राप्त स्थितिलाई निकायगत रूपमा तुलना गर्दा लगानी बोर्डको कार्यालयको शतप्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको ८० प्रतिशत माइलस्टोनले मडिसर महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ३७.५ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने बन तथा बातावरण मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै १३.३ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ।

तालिका: १०- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	लगानी बोर्डको कार्यालय	३३	४	४	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२५	१०	८	८०.०	२	२०.०	०	०.०
३	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	२४	३०	२१	७०.०	९	३०.०	०	०.०
४	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	४६	१३	८	६१.५	५	३८.५	०	०.०
५	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३४	२०	१२	६०.०	७	३५.०	१	५.०
६	बन तथा वातावरण	३३	१५	८	५३.३	५	३३.३	२	१३.३
७	अर्थ	५५	८	३	३७.५	५	६२.५	०	०.०
कुल		२८०	१००	६४	६४.०	३३	३३.०	३	३.०

आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको मडिसर मसान्तसम्म सम्पन्न वा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने १३४ वटा माइलस्टोनमध्ये ५१ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका छन्। चालु अवस्थाका माइलस्टोनहरूलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभिन्न पाँच चरणहरूमा बाँडेर विश्लेषण गर्दा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये २.२ प्रतिशत माइलस्टोनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। त्यसैगरी, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ४.५ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ९ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ३ प्रतिशत, २० भन्दा कम प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन १९.४ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

  २४  



तालिका: ११- चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय / निकाय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल	सम्पन्न/ लक्ष्य प्राप्त	चालु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन प्रतिशत						सुरु नभएको
				८०-१००	६०-८०	४०-६०	२०-४०	०-२०	कुल चालु	
१	अर्थ	२२	९	१	२	६	०	३	१२	१
२	उद्योग	१५	१०	०	१	१	०	३	५	०
३	कृषि	३१	२१	२	२	३	१	९	१०	०
४	भूमि	१२	१०	०	०	०	२	०	२	०
५	वन	१६	८	०	१	०	०	४	५	३
६	संस्कृति	२४	१४	०	०	२	१	६	९	१
७	संगानी बोर्ड	१४	६	०	०	०	०	८	८	०
कुल		१३४	७८	३	६	१२	४	२६	५१	५
प्रतिशत			५८.२	२.२	४.५	९.०	३.०	१९.४	३८.१	३.७



५.२ पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति

५.२.१ पूर्वाधार क्षेत्रको क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल ५ क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा शहरी विकास, खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सबै क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप देखिदैन।

तालिका: १२- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	शहरी विकास	४४	३	०	०.०	३	१००.०	०	०.०
२	खानेपानी	२६	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
३	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	३१	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
४	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ	२७	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
५	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	४६	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
कुल		२०४	५	०	०.०	५	१००.०	०	०.०

५.२.२ पूर्वाधार क्षेत्रको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने २७ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा १४.८ प्रतिशत सम्पन्न, ६६.७ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र १८.५ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ५० प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १४.३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन रहेको छैन।




तालिका: १३- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	७६	२	१	१०.०	०	०.०	१	१०.०
२	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	४६	९	२	२२.२	५	११.१	२	२२.२
३	शहरी विकास	६३	७	१	१४.३	५	७.९	१	१४.३
४	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ	१२४	७	०	०.०	७	१००.०	०	०.०
५	खानेपानी	३६	२	०	०.०	१	१०.०	१	१०.०
कुल		३४५	२७	४	१४.८	१८	१६.७	५	१८.५

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत २०८१ मङ्सिरको तुलनामा २७.९ अड्कले घटेको, चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोन १५.९ अड्कले बढेको र सुरु नभएका माइलस्टोन १२ अड्कले बढेको देखिन्छ।

लेखाचित्र: ९- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

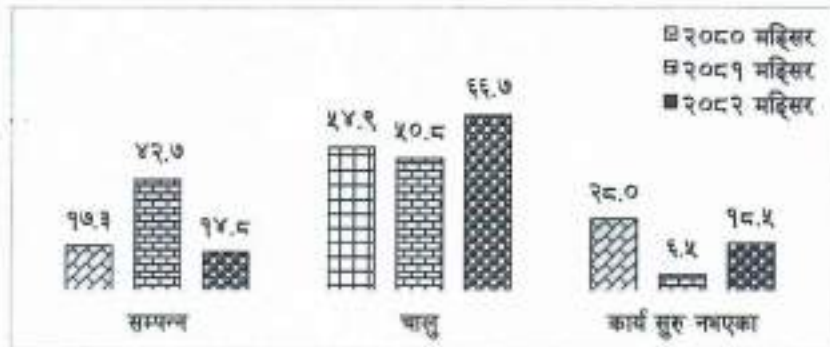

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मङ्सिर महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने १३३ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५२.६ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गरेका, ४२.९ प्रतिशतले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका र ५.३ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सवैभन्दा बढी ७७.३ प्रतिशत माइलस्टोनले मङ्सिर महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने खानेपानी मन्त्रालयको सवैभन्दा कम ३१.३ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेका छन्।

(Three handwritten signatures are present at the bottom of the page.)



तालिका: १४- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	७६	२२	१३	७३.३	४	१८.२	१	४.५
२	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	४६	९	६	६६.७	३	३३.३	०	०.०
३	शहरी विकास	६३	१८	९	५०.०	९	५०.०	०	०.०
४	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ	१२४	६८	३३	४८.५	३०	४४.१	५	७.४
५	खानेपानी	३६	१६	५	३१.३	१०	६२.५	१	६.३
कुल		३४५	१३३	७०	५२.६	५६	४२.१	७	५.३

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न वा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने १६० वटा माइलस्टोनमध्ये ७४ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका छन्। चालु अवस्थाका माइलस्टोनहरूलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभिन्न पाँच चरणहरूमा बाँडेर विश्लेषण गर्दा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये ६.३ प्रतिशत माइलस्टोनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। त्यसैगरी, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ११.९ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ७.५ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ६.९ प्रतिशत, २० भन्दा कम प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन १३.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

तालिका: १५- चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय /निकाय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल	सम्पन्न/ लक्ष्य प्राप्त	चालु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन प्रतिशत						सुरु नभएको
				८०-१००	६०-८०	४०-६०	२०-४०	०-२०	कुल चालु	
१	ऊर्जा	७५	३३	६	१५	३	६	७	३१	५
२	खानेपानी	१८	५	२	२	६	१	०	११	२
३	भौतिक	२४	१८	०	२	०	०	२	४	२
४	सञ्चार	१८	८	०	०	२	०	६	८	२
५	शहरी	२५	१०	२	०	१	४	७	१४	१
कुल		१६०	७४	१०	१९	१२	११	२२	७४	१२
प्रतिशत			४६.३	६.३	११.९	७.५	६.९	१३.८	४६.३	७.५



५.३ शासकीय सुधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति

५.३.१ शासकीय सुधार क्षेत्रको क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

शासकीय सुधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल १९ क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा ४२.१ प्रतिशत सम्पन्न, ४७.४ प्रतिशत चालु र १०.५ प्रतिशत सुरु नभएको देखिन्छ। क्रियाकलाप सम्पादनको निकायगत रूपमा तुलना गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्रालयको मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी निर्धारित १-१ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १-१ वटा क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा क्रियाकलाप सम्पन्न र बाँकी २ वटा क्रियाकलाप सुरु नै हुन नसकेको देखिन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल ट्रेडको कार्यालयको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप देखिएको छैन।

तालिका: १६- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	१२	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	रक्षा	१४	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
३	गृह	२७	२	१	५०.०	१	५०.०	०	०.०
४	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	१८	२	१	५०.०	१	५०.०	०	०.०
५	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	१६	२	१	५०.०	१	५०.०	०	०.०
६	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२०	६	२	३३.३	४	६६.७	०	०.०
७	राष्ट्रिय योजना आयोग	१५	३	१	३३.३	०	०.०	२	६६.७
८	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	८	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
९	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	७	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
१०	परराष्ट्र	१४	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
११	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	८	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
१२	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
१३	नेपाल ट्रेडको कार्यालय	५	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
कुल		१७१	१९	८	४२.१	९	४७.४	२	१०.५



५.३.२ शासकीय सुधार क्षेत्रका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको मद्दिसर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ३८ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ४४.७ प्रतिशत सम्पन्न, ३९.५ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र १५.८ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा परराष्ट्र र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको समान ६६.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा माइलस्टोन सम्पन्न भएको र २ वटा माइलस्टोन सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन देखिएको छैन।


तालिका: १७- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	परराष्ट्र	२९	३	२	६६.७	१	३३.३	०	०.०
२	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	२२	३	२	६६.७	१	३३.३	०	०.०
३	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	२९	६	४	६६.७	२	३३.३	०	०.०
४	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३२	९	५	५५.६	४	४४.४	०	०.०
५	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	२५	२	१	५०.०	१	५०.०	०	०.०
६	गृह	२९	२	१	५०.०	१	५०.०	०	०.०
७	रक्षा	३०	२	१	५०.०	१	५०.०	०	०.०
८	राष्ट्रिय योजना आयोग	२१	३	१	३३.३	०	०.०	२	६६.७
९	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	१०	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
१०	नेपाल ट्रेडको कार्यालय	७	२	०	०.०	२	१००.०	०	०.०
११	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	१९	५	०	०.०	१	२०.०	४	८०.०
१२	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	११	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
१३	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
कुल		२७१	३८	१७	४४.७	१५	३९.५	६	१५.८



शासकीय सुधार क्षेत्रका मन्त्रालय/ निकायहरूको मडिसर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत २०८१ मडिसरको तुलनामा ११.६ अड्कले घटेको, चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रतिशत ११.४ अड्कले बढेको र सुरु नभएका माइलस्टोनको प्रतिशत ०.२ अड्कले बढेको देखिएको छ।

लेखाचित्र: १०- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

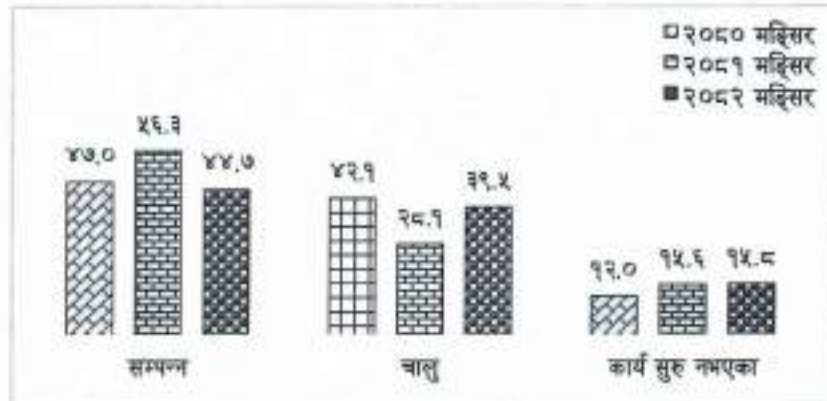

शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/ निकायहरूको मडिसर महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने ११५ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५६.५ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गरेका, ३२.२ प्रतिशतले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका र ११.३ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको शतप्रतिशत माइलस्टोनले मडिसर महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयका कुनै पनि माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

तालिका: १८- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मडिसर महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	१०	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	५	५	१००.०	०	०.०	०	०.०
३	परराष्ट्र	२९	१६	१३	८१.३	३	१८.८	०	०.०
४	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	११	४	३	७५.०	१	२५.०	०	०.०



क्र.सं.	मन्त्रालय /निकाय	सम्पन्न क लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल	सम्पन्न/ लक्ष्य प्राप्त	चासु नभएसम्मको रकम लक्ष्य प्राप्त नभएको माइलस्टोन प्रतिशत						सुरु नभएको
				८०- ९००	६०-८०	४०- ६०	२०- ४०	०-२०	कुल चासु	
१	रक्षा	२०	१३	१	१	०	२	२	६	१
६	सङ्घीय मामिला	११	७	०	०	०	०	४	४	०
७	योजना आयोग	१२	३	०	०	०	१	०	१	८
८	तथ्याङ्क कार्यालय	९	६	०	०	०	०	२	२	१
९	सतर्कता केन्द्र	४	३	०	०	१	०	०	१	०
१०	सार्वजनिक खरिद	१६	४	०	०	१	१	३	५	७
११	नेपाल ट्रेड	५	०	०	०	०	०	५	५	०
१२	महालेखा	२	१	०	०	०	०	१	१	०
१३	महान्यायाधिवक्ता	५	५	०	०	०	०	०	०	०
कुल		१५३	८२	४	४	३	६	३५	५२	१९
प्रतिशत			५३.६	२.६	२.६	२.०	३.९	२२.९	३४.०	१२.४



५.४ सामाजिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति

५.४.१ सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल १५ वटा क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा २० प्रतिशत सम्पन्न, ६६.७ प्रतिशत चालु र १३.३ प्रतिशत कार्य सुरु नभएको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। क्रियाकलापको सम्पादनको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ३३.३ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सबै क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको देखिएका छन्।

तालिका: २०- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	२७	३	१	३३.३	२	६६.७	०	०.०
२	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१२	३	१	३३.३	१	३३.३	१	३३.३
३	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	४०	४	१	२५.०	३	७५.०	०	०.०
४	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	२१	२	०	०.०	२	१००.०	०	०.०
५	युवा तथा खेलकुद	१६	३	०	०.०	२	६६.७	१	३३.३
कुल		११६	१५	३	२०.०	१०	६६.७	२	१३.३

५.४.२ सामाजिक क्षेत्रका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने २७ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ३७ प्रतिशत सम्पन्न, ४८.१ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र १४.८ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। माइलस्टोनको सम्पन्न स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सबैभन्दा कम २५ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ।




तालिका: २१- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१५	५	३	६०.०	१	२०.०	१	२०.०
२	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	५७	९	३	३३.३	६	६६.७	०	०.०
३	धर्म, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	३३	३	१	३३.३	२	६६.७	०	०.०
४	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	४१	६	२	३३.३	२	३३.३	२	३३.३
५	युवा तथा खेलकुद	१९	४	१	२५.०	२	५०.०	१	२५.०
कुल		१६५	२७	१०	३७.०	१३	४८.१	४	१४.८

सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रालयहरूको मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थितिलाई तुलना गर्दा सम्पन्न प्रतिशत २०८० मङ्सिरको तुलनामा ९.३ अङ्कले र २०८१ मङ्सिरको तुलनामा ०.१ अङ्कले घटेको देखिएको छ। त्यसैगरी, २०८१ मङ्सिरको तुलनामा चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रतिशत १.९ अङ्कले घटेको र सुरु नभएका माइलस्टोन १.९ अङ्कले बढेको देखिएको छ।

लेखाचित्र: ११- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

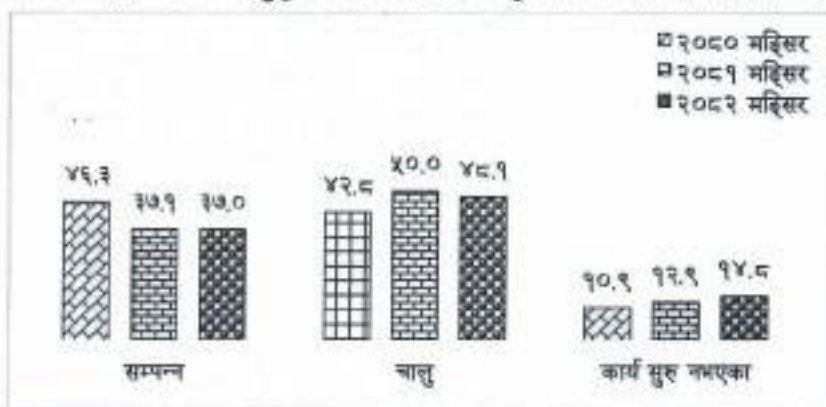

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका मङ्सिर महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने ५९ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ६२.७ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गरेका, ३३.९ प्रतिशतले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका र ३.४ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ। निकायगत रूपमा हेर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको शतप्रतिशत माइलस्टोनले मङ्सिर महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको यस्तो प्रतिशत ५३.३ रहेको छ।

(Signatures and stamps of officials)



तालिका: २२- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ मङ्सिर महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१५	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	५७	१४	११	७८.६	३	२१.४	०	०.०
३	पुर्वा तथा खेलकुद	१९	५	३	६०.०	२	४०.०	०	०.०
४	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	३३	२४	१४	५८.३	१०	४१.७	०	०.०
५	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	४१	१५	८	५३.३	५	३३.३	२	१३.३
कुल		११५	५९	३७	६२.७	२०	३३.९	२	३.४

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको मङ्सिर मसान्तसम्म सम्पन्न वा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने ८६ वटा माइलस्टोनमध्ये ३३ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका छन्। चालु अवस्थाका माइलस्टोनहरूलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभिन्न पाँच चरणहरूमा बाँडेर विश्लेषण गर्दा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये ५.८ प्रतिशत माइलस्टोनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। त्यसैगरी, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ३.५ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन २.३ प्रतिशत, २० भन्दा कम प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन २६.७ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

तालिका: २३- चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय /निकाय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल	सम्पन्न/ लक्ष्य प्राप्त	चालु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन प्रतिशत						सुरु नभएको
				६०-१००	६०-८०	४०-६०	२०-४०	०-२०	कुल चालु	
१	महिला	६	४	०	०	०	०	१	१	१
२	पुर्वा	९	४	०	१	०	०	३	४	१
३	शिक्षा	२३	१४	२	०	०	१	६	९	०
४	श्रम	२७	१५	०	०	०	१	११	१२	०
५	स्वास्थ्य	२१	१०	३	२	०	०	२	७	४
कुल		८६	४७	५	३	०	२	२३	३३	६
प्रतिशत			५४.७	५.८	३.५	०.०	२.३	२६.७	३८.४	७.०



६. मन्त्रालय/ निकायगत माइलस्टोनको २०८२ मडिसरसम्मको प्रगति

२०८२ मडिसर महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण भएका १२६ वटा र सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने ४०७ वटा गरी कुल ५३३ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५२.७ प्रतिशत सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त भएका, ३९.४ प्रतिशत चालु अवस्थामा रही लक्ष्य हासिल हुन नसकेका र ७.९ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेका छन्। निकायगत रूपमा तुलना गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको शतप्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ८३.३ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयको ७८.९ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न वा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको देखिएको छ। त्यसैगरी, नेपाल ट्रेडको कार्यालयको यस्तो प्रतिशत शून्य रहेको देखिएको छ।

तालिका: २४- सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल	मडिसरसम्म सम्पन्न/सुरु हुनुपर्ने	सम्पन्न/लक्ष्य प्राप्त		लक्ष्य प्राप्त नभएका		सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	५	५	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२५	१२	१०	८३.३	२	१६.७	०	०.०
३	परराष्ट्र	२९	१९	१५	७८.९	४	२१.१	०	०.०
४	राष्ट्रिय सर्तर्कता केन्द्र	११	४	३	७५.०	१	२५.०	०	०.०
५	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	७६	२४	१८	७५.०	४	१६.७	२	८.३
६	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	५४	३१	२१	६७.७	१०	३२.३	०	०.०
७	उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति	४६	१५	१०	६६.७	५	३३.३	०	०.०
८	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	२९	९	६	६६.७	२	२२.२	१	११.१
९	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१५	६	४	६६.७	१	१६.७	१	१६.७
१०	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३२	२३	१५	६५.६	६	२६.१	२	६.३
११	रक्षा	३०	२०	१३	६५.०	६	३०.०	१	३.३
१२	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	२२	११	७	६३.६	४	३६.४	०	०.०
१३	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	५७	२३	१४	६०.९	९	३९.१	०	०.०
१४	गृह	२९	१५	९	६०.०	६	४०.०	०	०.०



क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल	सम्पन्न/सुर सम्पन्न/सुर हुनुपर्ने	सम्पन्न/लक्ष्य प्राप्त		लक्ष्य प्राप्त नभएका		सुर नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१५	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३४	२४	१४	५८.३	९	२७.५	१	४.९
१६	धर्म, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	३३	२७	१५	५५.६	१२	४४.४	०	०.०
१७	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	१०	२	१	५०.०	१	५०.०	०	०.०
१८	वन तथा वातावरण	३३	१६	८	५०.०	५	३१.३	३	१८.८
१९	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	४१	२१	१०	४७.६	७	३३.३	४	१९.०
२०	युवा तथा खेलकुद	१९	९	४	४४.४	४	४४.४	१	११.१
२१	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	४६	१८	८	४४.४	८	४४.४	२	११.१
२२	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई	१२४	७५	३३	४४.०	३७	४९.३	५	६.७
२३	लगानी बोर्डको कार्यालय	३३	१४	६	४२.९	८	५७.१	०	०.०
२४	अर्थ	१५	२२	९	४०.९	१२	५४.५	१	४.५
२५	शहरी विकास	६३	२५	१०	४०.०	१४	५६.०	१	४.०
२६	खानेपानी	३६	१८	५	२७.८	११	६१.१	२	११.१
२७	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	१९	१६	४	२५.०	५	३१.३	७	४३.८
२८	राष्ट्रिय योजना आयोग	२१	१२	३	२५.०	१	८.३	८	६९.७
२९	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	२५	१२	१	८.३	११	९१.७	०	०.०
३०	नेपाल ट्रेडको कार्यालय	७	५	०	०.०	५	१००.०	०	०.०
कुल		१०६१	५३३	२८१	५२.७	२१०	३९.४	४२	७.९



७. समस्या र कारणहरूको विश्लेषण

- २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने १२६ वटा र मङ्सिर महिनाभित्र निर्धारित लक्ष्य हासिल गरी चालु अवस्थामा रहेका ४०७ गरी जम्मा ५३३ वटा माइलस्टोनको विषयानुसार अवस्था अध्ययन गर्दा लगानी मोडालिटी तथा वित्तीय ढाँचा तयारीसँग सम्बन्धित ६६.७ प्रतिशत माइलस्टोन २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न भएको वा यस अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्य हासिल गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी, कानुनी तयारीसँग सम्बन्धित ६८.८ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनन् भने खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित ५० प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिन्छ।

तालिका: २५- निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको विषय

क्र.सं.	माइलस्टोनको विषय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		सुरु नभएका		कुल
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
१	लगानी मोडालिटी तथा वित्तीय ढाँचा तयार	२	६६.७	१	३३.३	०	०.०	३
२	कार्यक्रम सञ्चालन	१६४	४८.४	९६	३४.०	२१	७.४	२८१
३	निर्माण/खरिद कार्य	९२	४४.४	६७	३९.६	१०	४.९	१६९
४	वातावरणीय अध्ययन	२	४०.०	२	४०.०	०	०.०	४
५	सम्भाव्यता अध्ययन	५	३४.७	८	४७.१	१	७.१	१४
६	कानुनी तयारी	१०	३९.३	२२	६८.८	०	०.०	३२
७	जग्गा प्राप्ति तथा साइट क्लियरेन्स	३	२३.१	८	६९.४	२	१४.४	१३
८	खरिद प्रक्रिया	२	१२.४	६	३७.४	८	४०.०	१६
कुल		२८१	४२.७	२१०	३९.४	४२	७.९	५३३

- २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने ५३३ वटा माइलस्टोनमध्ये २१० वटा अर्थात ३९.४ प्रतिशत माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका र यस अवधिसम्मका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकेका छैनन्। उक्त माइलस्टोनलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभाजन गर्दा ८०-९९.९९ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ४.१ प्रतिशत, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ६ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ५.१ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ५.१ प्रतिशत र २० भन्दा कम प्रगति हासिल गर्ने १९.९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।




तालिका: २६- निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्नेमा चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

क्र.सं.	मन्त्रालय /निकाय	सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने कुल	चालु अवस्थामा रहेको		चालु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन प्रतिशत				
			संख्या	प्रतिशत	८०-१००	६०-८०	४०-६०	२०-४०	०-२०
१	नेपाल ट्रष्ट	४	४	१००.०	०.०	०.०	०.०	०.०	१००.०
२	क्रान्त	१२	११	९१.७	०.०	८.३	०.०	८.३	७५.०
३	लगानी बोर्ड	१४	८	५७.१	०.०	०.०	०.०	०.०	५७.१
४	महालेखा	२	१	५०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	५०.०
५	धन	२३	१२	५२.२	०.०	०.०	०.०	३.३	४०.७
६	सङ्घीय मामिला	११	४	३६.४	०.०	०.०	०.०	०.०	३६.४
७	युवा	९	४	४४.४	०.०	११.१	०.०	०.०	३३.३
८	सञ्चार	१८	८	४४.४	०.०	०.०	११.१	०.०	३३.३
९	बाहरी	२४	१४	५८.०	८.०	०.०	४.०	१६.०	२८.०
१०	शिक्षा	२३	९	३९.१	८.७	०.०	०.०	४.३	२६.१
११	वन	१६	४	२५.३	०.०	६.३	०.०	०.०	२५.०
१२	संस्कृति	२४	९	३७.५	०.०	०.०	८.३	४.२	२५.०
१३	तथ्याङ्क कार्यालय	९	२	२२.२	०.०	०.०	०.०	०.०	२२.२
१४	उद्योग	१४	५	३५.७	०.०	६.७	६.७	०.०	२०.०
१५	सार्वजनिक खरिद	१६	४	२५.३	०.०	०.०	६.३	६.३	१८.८
१६	प्र.म.तथा म.प.का.	२३	६	२६.१	४.३	०.०	४.३	०.०	१७.४
१७	महिला	६	१	१६.७	०.०	०.०	०.०	०.०	१६.७
१८	परराष्ट्र	१९	४	२१.१	४.३	०.०	०.०	०.०	१५.८
१९	अर्थ	२२	१२	५४.५	४.५	९.१	२७.३	०.०	१३.६
२०	गृह	१४	६	४०.०	६.७	१३.३	०.०	६.७	१३.३
२१	रक्षा	२०	६	३०.०	४.०	४.०	०.०	१०.०	१०.०
२२	स्वास्थ्य	२१	७	३३.३	१४.३	९.५	०.०	०.०	९.५
२३	ऊर्जा	७४	३७	४९.३	८.०	२०.०	४.०	८.०	९.३
२४	नैतिक	२४	४	१६.७	०.०	८.३	०.०	०.०	८.३
२५	कृषि	३१	१०	३२.३	६.५	६.५	९.७	३.२	६.५
२६	खानेपानी	१८	११	६१.१	११.१	११.१	३३.३	४.६	०.०
२७	भूमि	१२	२	१६.७	०.०	०.०	०.०	१६.७	०.०
२८	योजना आयोग	१२	१	८.३	०.०	०.०	०.०	८.३	०.०
२९	सतर्कता केन्द्र	४	१	२५.०	०.०	०.०	२५.०	०.०	०.०
३०	महान्यायाधिवक्ता	५	०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०
कुल		४३३	२१०	४९.४	४.१	६.०	४.१	४.३	१९.९



- २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने ५३३ वटा माइलस्टोनमध्ये मध्ये ४२ वटा माइलस्टोनको कार्य सुरु हुन सकेको छैन। कार्य सुरु नभएका माइलस्टोनको अवस्था विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्य सुरु हुन नसकेका माइलस्टोनको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ६६.७ रहेको देखिएको छ भने दोस्रोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ४३.८ प्रतिशत र तेस्रोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय १९ प्रतिशत रहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला; कृषि तथा पशुपन्छी विकास; गृह; परराष्ट्र; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय गरी १४ वटा मन्त्रालय/निकायको यस अवधिमा सुरु नभएका माइलस्टोन रहेको देखिएको छैन।

लेखाचित्र: १२- सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सुरु नभएको प्रतिशत

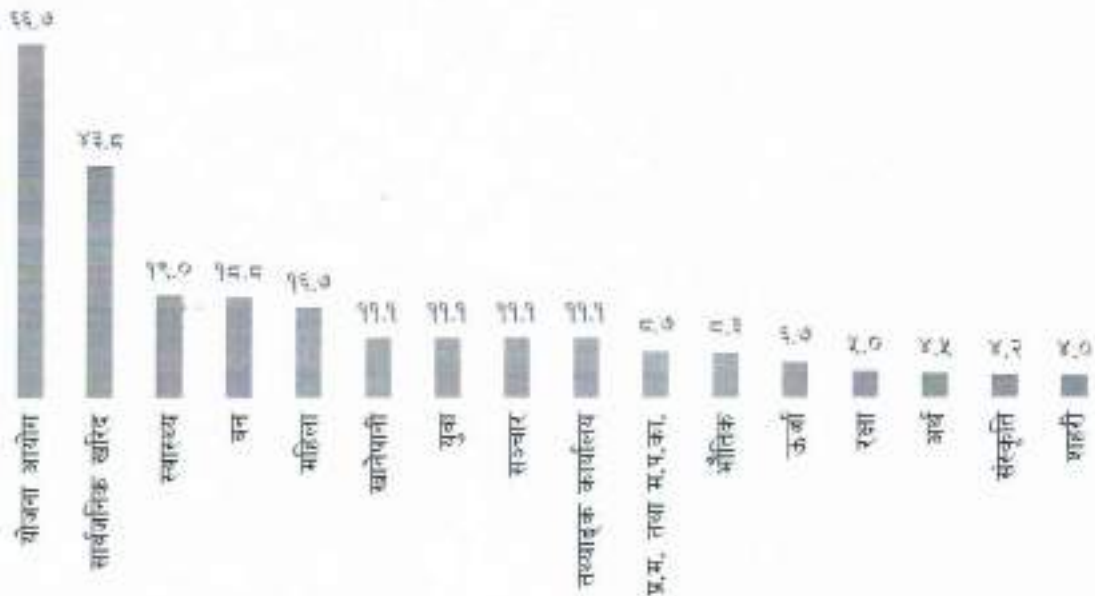

- २०८२ मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये चालु अवस्थामा रही यस अवधिसम्म निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका २१० वटा र कार्य सुरु हुन नसकेका ४२ वटा गरी २५२ वटा माइलस्टोनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका मन्त्रालय/निकायहरूले दर्शाएका कारण/समस्याहरू तल तालिकामा देखाइएको छ।








तालिका: २७- लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारण/ समस्या

क्र.सं.	लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारण/समस्या	माइलस्टोन संख्या	प्रतिशत
१	लक्ष्य उन्मुख रहेको	१६४	६४.२
२	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी पूरा नभएको	३०	११.९
३	जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन	१०	४.०
४	बजेट व्यवस्थापन/ खोत सुनिश्चितता नभएको	१०	४.०
५	अन्तर तह/ मन्त्रालय/ निकाय समन्वय र स्वीकृति	६	२.४
६	विपद्	६	२.४
७	निर्माण सामग्रीको अभाव	३	१.२
८	विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलता	२	०.८
९	कानून तर्जुमा / संशोधन हुन नसकेको	१	०.४
१०	कार्यक्रमको पुनःसंरचना / पुनः प्रक्रिया आरम्भ गर्नु परेको	१	०.४
११	स्थान छनोट / जग्गा प्राप्ति नभएको	१	०.४
१२	अन्य	१८	७.१
कुल		२५३	१००

नोट: १ वटा माइलस्टोनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुमा २ वटा कारण उल्लेख भएको



- मन्त्रालय/निकायहरूले दर्शाए अनुसार भन्दा बढी निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारण/समस्याहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्-

तालिका: २८- लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका मन्त्रालय/निकायगत कारण

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरू												कुल
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	प्र.म. तथा म.प.का.	३	४	१										८
२	अर्थ	१३												१३
३	उद्योग	२		१			१				१			५
४	ऊर्जा	२९	१			२	२	२	१				५	४२
५	कानून	१९												१९
६	कृषि	९	१											१०
७	खानेपानी	१											१२	१३
८	गृह	४	१							१				६
९	परराष्ट्र	४												४
१०	भूमि	२												२
११	भौतिक	२	१	१	१		०							७
१२	महिला	१										१		२
१३	युवा	३	१						१					५
१४	रक्षा	६			१									७
१५	वन	३	४		१									८
१६	शिक्षा		३	२										५
१७	श्रम	१३												१३
१८	संस्कृति	७			२			१						१०
१९	सङ्घीय मामिला	४												४
२०	सञ्चार	३	२	३	१	१								१०
२१	गहरी	११			२	१							१	१५
२२	स्वास्थ्य	६	४			१								११
२३	योजना कार्यक्रम	९												९
२४	तथ्याङ्क कार्यालय			१	१	१								३
२५	सतर्कता केन्द्र	१												१
२६	सार्वजनिक छरिद	१३												१३
२७	तयारी बोर्ड	७					१							८
२८	नेपाल ट्रस्ट		४	१										५
२९	महाशेखा				१									१
कुल		१६५	३०	१०	१०	६	६	३	२	१	१	१	१८	२५३

१. लक्ष्य उन्मुख रहेको २. कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी पूरा नभएको ३. जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन ४. बजेट व्यवस्थापन/खोन सुनिश्चितता नभएको ५. अन्तर तह/मन्त्रालय/निकाय समन्वय र स्वीकृति ६. विषय ७. निर्माण सामग्रीको अभाव ८. विवाद तथा प्रक्रियागत ऋटिलता ९. कानून तर्जुमा/संशोधन हुन नसकेको १०. कार्यक्रमको पुन:संरचना / पुन: प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपरेको ११. स्थान छनोट / जग्गा प्राप्ति नभएको १२. अन्य

४३



- माथिको तालिका विश्लेषण गर्दा लक्ष्य उन्मुख रहेको माइलस्टोन १६५ वटा रहेका छन्। लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा हुन नसक्नु प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ। स्पेसिफिकेशन र लागत अनुमान तयारीमा बिलम्ब, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा बिलम्ब, लगत ईष्टिमेट स्वीकृत हुन बाँकी जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेकोले कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। समीक्षा अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकेका कारण ३० वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ।
- मङ्सिर महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा २०८० मङ्सिरमा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत ३४.१ रहेको थियो। २०८१ मङ्सिरमा उक्त प्रतिशत १२.५ अङ्कले वृद्धि भएता पनि २०८२ मङ्सिरमा १०.९ अङ्कले घट्न गई ३५.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिन्छ। २०८२ भाद्र महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र चालु आर्थिक वर्षमा प्रकृयागतभन्दा नतिजामूलक माइलस्टोनको बाहुल्यताको कारण माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत घट्न गएको देखिन्छ। साथै अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ११६, मिति २०८२/०६/०७ गतेको पत्रबाट कार्यक्रम/आयोजनाको बजेट रोक्का भएका कारणलेसमेत माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत कम देखिएको छ।
- कर्मचारीको अभाव हुनु, नेतृत्व परिवर्तन हुनु जस्ता कारणबाट १० वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ।
- बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितता नभएका कारण २०८० मङ्सिरमा १२१ वटा, २०८१ मङ्सिरमा २७ वटा र २०८२ मङ्सिरमा १० वटा माइलस्टोन प्रभावित भएको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि बजेट कटौति तथा रोक्का हुँदै आएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७९/१०/१७ गते, मिति २०८१/१०/२८ गते र मिति २०८२/०६/०७ गते को पत्रानुसार विभिन्न खर्च शीर्षकमा बजेट कटौति भएको देखिन्छ। त्यसैगरी, विगत ३ आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा भएको राजस्वको लक्ष्य क्रमशः २५.५५ प्रतिशत, २८.१५ प्रतिशत र २७.४५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ। यसरी उल्लिखित तथ्याङ्कबाट बजेट तर्जुमा प्रक्रिया (स्रोत अनुमान) नै ऋटीपूर्ण रहेको देखिएकोले कार्ययोजनाका माइलस्टोनहरू बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितताका कारण प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ। साथै गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनामै बजेट आएता पनि चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्मसमेत स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय एवम् स्रोत सुनिश्चितताको कार्य अर्थ मन्त्रालयले अगाडी बढाउन सकेको देखिएन।



- कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रयासले मात्र सम्पादन हुन नसक्ने कार्यहरूमा अन्तरसम्बन्धित निकायहरूको सहयोग आवश्यक पर्दछ। राय सहमति प्राप्ति मा ढिलाइ, समन्वयको अभाव, EIA/IEE स्वीकृतिमा ढिलाइजस्ता अन्तर तह/मन्त्रालय/निकाय समन्वय र स्वीकृतिमा विलम्ब हुँदा ६ वटा माइलस्टोन प्रभावित भएका छन्।
- प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का कारण ६ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ।
- निर्माण सामग्रीको अभावका कारण ३ वटा, विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलताका कारण २ वटा, कानुन तर्जुमा/संशोधन हुन नसकेको १ वटा, कार्यक्रमको पुनःसंरचना/पुनः प्रक्रिया आरम्भ गर्नु परेका कारण १ वटा र स्थान छनोट/जग्गा प्राप्ति नभएका कारण १ वटा माइलस्टोनले तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ।
- लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुको प्रष्ट कारण उल्लेख नगरिएका वा नुटीपूर्ण प्रतिवेदन गरिएका वा सम्बन्धित विषयमा प्रतिवेदन नै नगरिएकाले प्रारम्भ हुन नसकेका भनी वर्गीकरण भएका माइलस्टोनको संख्या १८ रहेको छ।



८. सुझावहरू

माथि उल्लेखित तथ्याङ्क एवम् विश्लेषण समेतबाट मन्त्रालय/निकायहरूले मुख्यतः निम्न विषयहरूमा ध्यान दिएमा कार्यसम्पादनलाई थप नतिजामुखी र परिणाममुखी बनाउन सक्ने देखिन्छः

- आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने, लागत अनुमान तयार पार्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने तथा अध्ययन र अनुसन्धान जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। तोकिएको समयमा यस्ता कार्यहरू सम्पन्न हुन नसक्दा पछिल्ला चरणमा कार्यभार बढ्ने हुँदा बैकल्पिक कार्ययोजना तयार गरी मूल कार्ययोजनामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी ती कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्छ।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय आयोजना बैकको कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक देखिएको छ। मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्ताव गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको स्वीकृति चरणमै स्रोत सुनिश्चितता कायम गर्ने तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका वा सम्भाव्यता अध्ययन, बातावरणीय अध्ययन, स्थान छनोट र जग्गा प्राप्तिजस्ता पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्दछ।
- बजेटमा घोषणा गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी कार्य अगाडि बढाउने सहमति प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव हुने अवस्थाको निराकरण गर्न स्रोतको पूर्वमूल्याङ्कन गरी मात्र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउन उपयुक्त हुन्छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा सुरु हुने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता समयमै गरिनु पर्दछ। साथै बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोत अनुमान वास्तविक र यथार्थ नजिक हुनुपर्दछ।
- स्रोत सुनिश्चितता र सीमित बजेटको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा सर्वप्रथम अनिवार्य दायित्वहरूको भुक्तानी तथा विकास सहायता प्राप्त कार्यक्रमहरू र मुख्य प्रभाव पार्ने क्रमागत आयोजनाहरूका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनुपर्दछ। त्यसपश्चात् मात्र नयाँ प्रस्तावित तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ। साथै, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेट अवण्टा राख्ने प्रवृत्तिमा नियमन, रकमान्तर, बजेट रोक्का तथा समर्पणजस्ता विषयहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ।
- वर्षात् वा महामारीजस्ता प्रतिकूल अवस्थामा समेत आयोजना/कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित नभई कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलापहरूका आधारभूत कार्यहरू आर्थिक



वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमै सम्पन्न गरी स्थलगत कार्यान्वयन हुने समयमा कार्यचाप न्यून गर्दै समग्र कार्यान्वयन प्रभावकारितालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

- आयोजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने, छनोट भएका सबै आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा-अवरोधहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएमा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
- अन्तर-तह, मन्त्रालय तथा निकायबीचको समन्वयको अभावमा सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका राय, सहमति आदि समयमै प्राप्त नहुनु, स्वीकृति वा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरूमा ढिलाइ हुनु तथा अन्य निकायबाट सहमति नमिल्नुजस्ता कारणले कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रचलित ऐन-कानूनमा व्यवस्था भएका समन्वयकारी संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील बनाउने तथा समन्वयको तहगत व्यवस्था कायम गरी अन्तर-तह र अन्तर-निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
- स्थान छनोट तथा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका प्रक्रियागत ढिलाइको समस्या विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको छ। आयोजना छनोट गर्दा स्थान निकर्गोल नगरी नै स्वीकृति दिने प्रचलनले विकास व्यवस्थापनको कमजोर अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
- मन्त्रालयहरूले समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासहरू तथा मातहत निकायहरूलाई जारी गरेका निर्देशनहरूको जानकारी अनुगमनकारी उच्च निकायहरू (जस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग आदि) लाई नियमित रूपमा प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले विषयगत जानकारी उच्च तहमा पुग्ने, सबैमा एकरूप बुझाइ कायम हुने तथा संस्थागत अभिलेखीकरण हुने लाभ प्राप्त हुन्छ।
- आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएका र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने समस्याहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तत्काल समस्या समाधान तथा विपद् समन्वय शाखा र सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने महाशाखा/शाखामा जानकारी गराई समस्या निराकरणको पहल गर्नुपर्छ।
- सार्वजनिक व्यवस्थापन र सुशासनको क्षेत्रमा तत्काल सुधारको कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको कडाइका साथ पालना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गर्दा कार्यसम्पादन र नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरी नतिजामुखी कार्यसम्पादन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्दछ।

8008
