



आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रमुख कार्यक्रम र बजेटको  
कार्ययोजना कार्यान्वयनको २०८२ पुस महिनासम्मको

## प्रगति प्रतिवेदन (सारांश)



नेपाल सरकार  
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  
(नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा)  
सिंहदरवार, काठमाडौं



## विषयसूची

विषयसूची.....	i
तालिका सूची.....	ii
लेखाचित्र/वृत्तचित्र सूची.....	iii
सङ्क्षेपीकरणको सूची.....	iv
वाक्य विश्लेषण.....	v
१. पृष्ठभूमि.....	१
२. कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगति स्थिति.....	५
३. राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति.....	१९
३.१ राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति.....	१९
३.२ खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति.....	२०
३.३ मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको विवरण.....	२१
४. क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको प्रगति स्थिति.....	२३
४.१ क्रियाकलापको प्रगति स्थिति.....	२३
४.२ माइलस्टोनको प्रगति स्थिति.....	२४
५. क्षेत्रगत प्रगति स्थिति.....	२७
५.१ आर्थिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति.....	२७
५.२ पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति.....	३१
५.३ शासकीय सुधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति.....	३४
५.४ सामाजिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति.....	३९
६. मन्त्रालय/ निकायगत माइलस्टोनको २०८२ पुससम्मको प्रगति.....	४२
७. समस्या र कारणहरूको विश्लेषण.....	४४
८. सुझावहरू.....	५१

२०८२/११/१५



तारिका नं.	विषय	पेज नं.
१	प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकको प्रगति स्थिति	५
२	राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति	१९
३	सरकारी खर्चको प्रगति स्थिति	२०
४	मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्च	२१
५	क्रियाकलापहरूको प्रगति स्थिति	२३
६	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको क्षेत्रगत प्रगति स्थिति	२४
७	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	२६
८	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२७
९	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२८
१०	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२९
११	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	३०
१२	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	३१
१३	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	३२
१४	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	३३
१५	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	३३
१६	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३४
१७	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३५
१८	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३७
१९	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३८
२०	क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	३९
२१	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	४०
२२	सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	४१
२३	चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	४१
२४	सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगतिस्थिति	४२
२५	निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको विषय	४४
२६	निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्नेमा चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	४५
२७	लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारण/ समस्या	४७
२८	लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका मन्त्रालय/निकायगत कारण	४८
२९	लक्ष्य उन्मुख कारण उल्लेख भएका माइलस्टोनको प्रगति	४९

ii



## लेखाचित्र/वृत्तचित्र सूची

विषय नं.	विषय	पृष्ठ नं.
१	लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन	१९
२	लक्ष्यको तुलनामा कुल खर्च	२०
३	मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च	२२
४	सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलापको प्रगति स्थिति	२३
५	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	२४
६	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति	२४
७	सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति	२५
८	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र	२८
९	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र	३२
१०	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र	३६
११	सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र	४०
१२	सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सुरु नभएको प्रतिशत	४६

  
सङ्घोपीकरणको सूची

(क) नेपाली

आ.व.	आर्थिक वर्ष
कि.मी.	किलोमिटर
क्र.सं.	क्रम सङ्ख्या
क्यू.फि.	क्यूबिक फिट
प्र.म.तथा म.प.का.	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
मे.ट.	मेट्रिक टन
मे.वा.	मेगावाट
स.कि.मी.	सर्किट किलोमिटर

(ख) अङ्ग्रेजी

COPOMIS	Co-operative and Poverty-Related Management Information System
DPR	Detailed Project Report
EIA	Environmental Impact Assessment
IEE	Initial Environmental Examination
IT	Information Technology



३१/५/१६/१८





## वाक्यविश्लेषण

१. **क्रियाकलाप-** कुनै विशेष उद्देश्य वा लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिने मुख्य कामको गतिविधि
२. **माइलस्टोन-** कुनै क्रियाकलाप प्राप्तिको क्रममा निश्चित समयसीमाभित्र पुग्नु पर्ने लक्ष्य निर्धारण सहितको महत्त्वपूर्ण मापनयोग्य प्रगति वा उपलब्धि जनाउने बिन्दु।
३. **पुस महिनासम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप/माइलस्टोन -** पुस महिनासम्ममा सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएका क्रियाकलाप/माइलस्टोन।
४. **पुस महिनासम्ममा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोन-** साउन महिनादेखि पुस महिनासम्ममा सुरु भई क्रमशः निश्चित लक्ष्य हासिल गर्दै पछिल्ला महिनाहरूमा सम्पन्न हुनेगरी निर्धारण गरिएका माइलस्टोन।
५. **लक्ष्य प्राप्त भएका-** तोकिएको महिनामा सुरु भई निर्धारित लक्ष्य प्राप्त भइसकेका चालु अवस्थाका माइलस्टोन।
६. **लक्ष्य प्राप्त नभएका-** तोकिएको महिनामा सुरु भई निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेका चालु अवस्थाका माइलस्टोन।
७. **सुरु नभएका-** तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने वा निश्चित लक्ष्यसहित सुरु हुनुपर्नेमा सुरु हुन नसकेका क्रियाकलाप/माइलस्टोन।



## १. पृष्ठभूमि

नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटद्वारा निर्धारित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू, तिनसँग जोडिएका प्रक्रियागत तथा नतिजामुखी माइलस्टोनहरू र कार्यान्वयनपछि मन्त्रालय/निकायहरूले आवधिक रूपमा हासिल गर्ने नतिजा सूचकहरूको रूपरेखासमेत निर्धारण गरिन्छ। यसरी सम्पादित क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनहरूको प्रगति प्रतिवेदन गर्न एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणाली लागु गरिएको छ, जसमा प्राप्त विवरणहरूका आधारमा आवधिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने गरिएको छ।

एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीले अनुगमन पद्धतिलाई नतिजामुखी बनाई लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुऱ्याएको छ। यसले कार्यसम्पादन गर्ने निकायहरूबाट विभिन्न निकायहरूमा छुट्टाछुट्टै पेस हुने प्रतिवेदनहरूलाई एउटै प्रणालीमार्फत एकीकृत गर्दै अनुगमन गर्ने निकायहरूले प्राप्त गर्ने सूचनामा एकरूपता कायम गरेको छ, साथै यस्ता सूचना तथा प्रतिवेदनहरूलाई सुरक्षित राखी दीर्घकालीन प्रयोगमा ल्याउन मदत गरेको छ। यसबाहेक, कार्यसम्पादनको वस्तुगत जानकारी, देखिएका समस्या र तिनका समाधानका उपायहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने अनुगमनको अनुगमन कार्यका साथै निर्णायक तहसम्म निर्णय निर्माणमा पनि सघाउ पुऱ्याएको छ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई संवत् २०८२ साल वैशाख १९ गते गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधन तथा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत सबै मन्त्रालयहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्डको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र चालु आर्थिक वर्षबाट अनुगमनका लागि थप गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय गरी ३० वटा मन्त्रालय/निकायहरूको कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीबाट अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि माइलस्टोन तयार गर्दा मन्त्रालयहरूले स्वीकृत गरी लागु गर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, मार्गदर्शन संशोधन र स्वीकृति, लागत अनुमान तयार, बोलपत्र आह्वान बाहेकका सूचना प्रकाशन, कुनै कार्य गर्न कार्यदल/समिति गठन,



ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, मर्मिर्देश, अध्ययन प्रतिवेदन आदिका मस्यौदा तयार, मन्त्रालयस्तरीय समीक्षा, कार्यशाला, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम प्रदान गर्ने मुख्य कार्यक्षेत्र भएका निकायहरू बाहेक अन्य निकायहरूबाट प्रदान हुने कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि तालिम, कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य, वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त नभएका एवम् स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त नभएका कार्यहरूलाई माइलस्टोनमा समावेश नगरी प्रक्रियागतभन्दा नतिजामुखी माइलस्टोनलाई प्राथमिकता दिइएको थियो।

घोषित नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि ती नीतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूलाई आवद्ध गर्दै समयतालिकासहितको कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने क्रममा आ.व. २०८२/०८३ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गर्दा विभिन्न चरणहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको उपस्थितिमा आवश्यक छलफल गरी अन्तिम रूप दिइएको थियो। यस क्रममा मन्त्रालय तथा निकायगत वार्षिक बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादात्म्यता विश्लेषण गरी एकअर्कासँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो। कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा यस कार्यालयबाट मन्त्रालय/निकायहरूलाई पठाइएको कार्ययोजना तर्जुमा मार्गदर्शन तथा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनलाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो। उक्त मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालय तथा निकायहरूले कानुनी तयारीका रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू जस्तै नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तर्जुमा, विद्यमान कानून संशोधन, आयोजना तथा क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि बोलपत्र सूचना प्रकाशन, बोलपत्र सम्झौताजस्ता माइलस्टोनको समय सामान्यतः प्रथम त्रैमासिकमा निर्धारण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो।

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका र बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र माननीय मन्त्रीज्यूहरूबीच मिति २०८२/०४/२९ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्ययोजनामा कुल क्रियाकलाप ९९६ र माइलस्टोन १,९०० रहेकोमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको प्राथमिकता र नतिजासमेतलाई ध्यानमा राखी प्रक्रियागत रूपमा रहेका माइलस्टोनलाई हटाइएको तथा नतिजामा बढी केन्द्रित गरिएको हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ७०३ क्रियाकलाप र १,०८८ माइलस्टोन निर्धारण गरिएका छन्। साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालय र लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल ट्रष्टको कार्यालय,

२०८२/०४/२९



महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसमेतका ३९२ वटा नतिजा सूचकहरूमा कार्ययोजनालाई व्यवस्थित गरी एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको थियो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८२/०६/०५ मा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरूत्थान र राहतसमेतका लागि आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/गराउने भनी अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ११६, मिति २०८२/०६/०७ गतेको पत्रबाट उल्लेख भई आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को माइलस्टोन तथा प्रमुख कार्य सम्पादन सूचक, आयोजनाको ठेक्काको विवरण, आयोजनाको भौतिक र वित्तीय लक्ष्य स्वदेशी/विदेशी स्रोत रोकका/कटौती भएका कारण प्रभावित भएका माइलस्टोन तथा सूचक अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०८२/०६/३० को नेपाल सरकार मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त विवरणअनुसार २० वटा क्रियाकलाप र २७ वटा माइलस्टोन प्रणालीबाट हटाई जम्मा ६८३ क्रियाकलाप र १,०६१ माइलस्टोनहरू कायम गरिएको छ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा मन्त्रालय/निकायहरूका क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको क्षेत्रगत प्रगति स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको बजेट खर्च स्थिति समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्याङ्क एवम् विवरणहरू विषयगत मन्त्रालय/निकायहरूबाट एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएका, नेपाल राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरणमा आधारित छन्।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०६/०५ को निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमातहत राख्ने निर्णय भएको हुँदा उक्त विभागहरूको वार्षिक कार्ययोजनालाई चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनादेखि सम्बन्धित मन्त्रालयमातहत राखिएको छ।

एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा गरिएको मन्त्रालय/निकायहरूको कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति अबस्थालाई विश्लेषण गर्न मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई कार्यप्रकृतिका आधारमा ४ वटा प्रमुख क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। प्रमुख क्षेत्र र ती क्षेत्र अन्तर्गत रहने मन्त्रालय/निकायहरू देहायअनुसार छन्-



- क. **आर्थिक क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, वन तथा बातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गरी ६ वटा मन्त्रालयहरू र लगानी बोर्डको कार्यालयसमेत गरी ७ वटा निकायहरू समावेश छन्।
- ख. **पूर्वाधार क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय गरी ५ वटा मन्त्रालयहरू समावेश छन्।
- ग. **शासकीय सुधार क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय गरी १३ वटा मन्त्रालय/निकायहरू समावेश छन्।
- घ. **सामाजिक क्षेत्र:** यस क्षेत्र अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गरी ५ वटा मन्त्रालयहरू समावेश छन्।



## २. कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगति स्थिति

- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयहरू र लगानी बोर्डको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल ट्रेडको कार्यालयसमेतका ३९२ वटा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरू एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको थियो। प्रणालीमा प्रविष्ट सूचकमध्ये पुस महिनासम्मका लागि ३१४ वटा सूचकहरूको लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा १२१ वटा सूचकहरूले लक्ष्य प्राप्त गरेका र १९३ वटा सूचकहरूले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। पुस महिनासम्ममा निश्चित लक्ष्य तोकिएका केही प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकहरूको प्रगति स्थिति देहाय बमोजिम रहेको छ।

तालिका:१- प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकको प्रगति स्थिति

क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
१	चलु आ.ब.मा हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासो फछ्यौट	प्रतिशत	५४	६०	३०	४१	४१	प्र.म. तथा म.प.का.
२	मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	प्र.म. तथा म.प.का.
३	हेलो सरकारमा हालसम्म प्राप्त गुनासोको औसत फछ्यौट	प्रतिशत	६४	१५	७०	६५.६७	०.६७	प्र.म. तथा म.प.का.
४	वैदेशिक सहायता प्राप्ति	रु अर्ब	१५८.२	२८७	१३४	६१.०७	६१.०७	अर्थ
५	राजस्व परिचालन (चौटफाट हुने राजस्व समेत)	रु अर्ब	११९६.१९	१४८०	७११.१	४७७.३९९	४७७.४	अर्थ
६	औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति*	प्रतिशत	४.०६	५.५	५.५१	२.४२	२.४२	अर्थ
७	भुक्तानी सन्तुलन*	रु अर्ब	४९.४.४४	२००	१००	४०१.२४	४०१.२४	अर्थ
८	चालुखाता सन्तुलन*	रु अर्ब	४०९.२	११६	४८	४२९.९९	४२९.९९	अर्थ
९	विदेशी विनिमय सञ्चितिको न्यूनतम पर्याप्तता (यस्तु तथा सेवा)*	महिना	१५.४	७	७	१८.१	१८.१	अर्थ
१०	साना किसान विकास लघुवित्त किर्तीय सन्ध्यामा लगानी/ अनुदानबाट रोजगारी सङ्ख्या	कार्यदिन (हजारमा)	०	२७६७	११०७	१५६४	१५६४	अर्थ

x



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक सक्य	२०८२ पुससम्मको सक्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनवेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
११	पुँजी बजारमा पहुँच (डिभ्याट खाता)	सङ्ख्या (लाख)	६८.८	४.८	७१.८	७०.८६	२.०६	अर्थ
१२	कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण	प्रतिशत	४३.६४	४३.९	४३.२४	४३.९४	४४.९४	अर्थ
१३	बीमाको पहुँच विस्तार (बाथरामा आएको जनसङ्ख्या)	प्रतिशत	४९	४	४९	४०	९	अर्थ
१४	सङ्घीय पुँजीगत खर्चमा सहजीकरण	प्रतिशत	०	१००	१००	१००	१००	अर्थ
१५	कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान	प्रतिशत	४.९८	५.९	५.९			उद्योग
१६	कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा व्यापार घाटा	प्रतिशत	२४	२४.२	२४.२			उद्योग
१७	कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निर्यात	प्रतिशत	४.४४	४	४			उद्योग
१८	टुला उद्योग दर्ता	बटा	१४८७	६०	१४१७	१४२१	३४	उद्योग
१९	उद्योगहरूमा वैदेशिक लगानी स्वीकृति	रु. अर्ब	६४१	६४	३०	३८.४९	३८.४९	उद्योग
२०	राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा बन्धनमा खाद्यान्न मौज्जात	मे.टन (हजारमा)	२४	२४	२४	२९	२९	उद्योग
२१	सरकै खाद्य बैकमा खाद्यान्न मौज्जात	मे.टन (हजारमा)	८	८	८	८	८	उद्योग
२२	पेटेन्ट दर्ता	बटा	८९	४	९९	८९	०	उद्योग
२३	कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना तथा घरेलु उद्योगको योगदान	प्रतिशत	०	९	९			उद्योग
२४	कानून, न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान	बटा	१७	९	१९	१७	०	कानून
२५	न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि तथा गाउँसभा/नगरसभामा कानून तर्जुमा शालिस	बटा	४३	१४	६	२	२	कानून
२६	नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त व्यक्ति	बटा	१७००	३००	१२४	२४७	२४७	कानून
२७	राजपत्र सम्पादन	बटा	२६६	२६०	१३०	३९	३९	कानून

६



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक संख्य	२०८२ पुससम्मको संख्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
२८	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २० दिनभित्र राय सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	कानून
२९	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २० दिनभित्र नयाँ विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	कानून
३०	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २५ दिनभित्र नयाँ विधेयक तथा नियममा तर्जुमा सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	कानून
३१	सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको २० दिनभित्र संशोधन विधेयक तथा नियममा तर्जुमा सहमति प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	कानून
३२	नेपाल भूसूचना प्रणाली (NeLIS) मार्फत सेवा प्रवाह हुने नयाँ कार्यालयको सङ्ख्या	कार्यालय	९२	४३	११०	११४	२३	भूमि
३३	पूर्ण स्वचालित विपुनीय भूसूचना प्रणाली (LRIMS) लागू भएका मालबोल कार्यालयको सङ्ख्या	कार्यालय	७	३८	१३	७	०	भूमि
३४	जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गरिएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा जन्मकालिन बसोबासी	सङ्ख्या (हजारमा)	५	५००	२५	९,०१२	४,०१२	भूमि
३५	COPOMIS प्रणाली सञ्चालन भएका सहकारी सङ्ख्या	सङ्ख्या (हजारमा)	१९,१८९	०,८११	१९,४८	१९,६११	०,४२२	भूमि
३६	रासायनिक मल आपूर्ति	मे.टन (हजारमा)	३९३	४४०	३००	३७८,७८८	३७८,७९	कृषि
३७	किसान सुसीकरण	सङ्ख्या (हजारमा)	२३७०	२४०	२४००	२३८३	१३	कृषि
३८	दुध उत्पादन	मे.टन (हजारमा)	२७५१	२७५१	१३४१,८	१३७७	१३७७	कृषि
३९	माछा भुरा उत्पादन	क्यु.फिट (लाखमा)	७८१,६	७८२	१४४,६८	१७६,४१	१७६,४१	कृषि



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ भसारको स्थिति	२०८३/२०८३ को वार्षिक सक्य	२०८२ पुससम्मको सक्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनबैथि पुससम्मको प्रगति	निकाय
४०	मासु उत्पादन	मे.टन (हजारमा)	४६४	४०३	२४१	२२६	२२६	कृषि
४१	अण्डा उत्पादन	गोटा (लाखमा)	१६०००	१६०००	८३००	८४६३	८४६३	कृषि
४२	पशुपन्छीको संक्रामक रोगविरुद्धको खोप उत्पादन	टोन (लाखमा)	४३४	४१३	२२६	४३.२	४३.२	कृषि
४३	कृत्रिम गर्भाधान	सङ्ख्या (हजारमा)	७३३	८४०	३०४	३०२.४६	३०२.४६	कृषि
४४	पशुपन्छी तथा माछा बीमालेख	सङ्ख्या (हजारमा)	१६६	१००.४	१०	०	०	कृषि
४५	बाली बीमालेख	सङ्ख्या (हजारमा)	१.६३४	२.४	१	१.०३१	१.०३१	कृषि
४६	विभिन्न बालीको जात उन्मोचन/पञ्जीकरण	सङ्ख्या	२४	२४	२	१०	१०	कृषि
४७	कृषि प्रविधि विकास	सङ्ख्या	७४	४०	४	४	४	कृषि
४८	अन्नबालीको खेत चीउ उत्पादन	मे.टन,	१००	१००	१००	१२४	१२४	कृषि
४९	खाद्य वस्तुमा विषारी अवशेषको परीक्षण	सङ्ख्या (हजारमा)	९४	९४	४०.११४	४२.८६४	४२.८६४	कृषि
५०	साना सिंचाइबाट सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	६०२०	६१००	६८३०.४	६८३०.३	२.२	कृषि
५१	निर्माण भएका सुरक्षित नागरिक आवास	बटा (हजारमा)	९२.९९८	४	९४.९९८	९४.९९८	२	शहरी
५२	शहरी सडक निर्माण तथा स्तरान्निति	कि.मि.	३०००	४६२	३९६८.६	३९३०	१३०	शहरी
५३	निर्माण भएकाले छापीण कानोपथ सडक	कि.मि.	४०९३	३००	४१८३	४०९.८	४	शहरी
५४	निर्माण भएका स्थानीय सडक पुल	बटा	७२२	४०	७३४	७२२	०	शहरी
५५	निर्माण भएका झोतुदगे पुल	बटा	११२२४	२००	११२८४	११२४१	१६	शहरी
५६	निर्माण भएका स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन	बटा	३६७	६०	३८४	३८०	१३	शहरी
५७	साना सिंचाइबाट सिंचित क्षेत्रफल	हेक्टर	३९४०४	३७००	४०६९४	४००८८	४०६	शहरी



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ बसारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
४८	विभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट रङ्गशाला कीर्तिपुर निर्माण	भौतिक प्रगति प्रतिशत	१२	२०	२२	२२	१०	शहरी
४९	आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या	प्रतिशत	९७	९	९७.३	९७.०५	०.०५	खानेपानी
५०	सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या	प्रतिशत	२९	२	३०	२९.०५	०.०५	खानेपानी
५१	शहरी क्षेत्रमा प्रशोधन सहितको दल प्रणालीमा जोडिएको जनसङ्ख्या	प्रतिशत	३.०२	०.४८	३.०६	३.०६	०.०४	खानेपानी
५२	WASH Plan तयार भएका स्थानीय तह	स्थानीय तह	३११	५९	३३०	३२५	१४	खानेपानी
५३	एक घर एक धाराको नक्शसङ्केतन भएका घर- परिवार	सङ्ख्या (हजारमा)	११२४	२००	१२००	११५३	२९	खानेपानी
५४	अपराधका घटनाको अनुसन्धान प्रतिशत	प्रतिशत	८३.०६	७९	७६.५	६९.३	६९.३	गृह
५५	सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका व्यक्ति	जना	२५४९	१५२४	६००	१२८१	१२८१	गृह
५६	सडक दुर्घटनाबाट घाइते भएका व्यक्ति	जना (हजारमा)	४४.२५९	२२.३१४	९७	२६.१	२६.१	गृह
५७	पँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता	प्रतिशत	७७.४३	८०	७८.७	८८.०६	८८.०६	गृह
५८	विपद्का घटनाबाट मृत्यु हुने व्यक्ति	सङ्ख्या (प्रति लाख)	२.२	१	०.४	०.५२१	०.५२१	गृह
५९	विपद्का घटनाबाट प्रभावित परिवार सङ्ख्या	सङ्ख्या	१७६१६	३७००	२४००	११७३	११७३	गृह
७०	राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN) प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक	प्रतिशत	७५	१०	७९	९५.४१	२०.४१	गृह
७१	बीपमूलक/रोजगारमूलक तालिम प्राप्त कैदी बन्दी	प्रतिशत	२४	४	२६	२०.२	२६.२	गृह
७२	विपद्बाट विस्थापितहरूका लागि आवास निर्माण	सङ्ख्या	३३६२	२२०००	१२५००	४६५	४६५	गृह






क्र.सं.	सूचक	इकाई	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनवेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
७३	राष्ट्रिय परिधायन वितरण	सङ्ख्या (हजारमा)	३०००	२०००	४०००	३८२४.९७	३२४.९७	गृह
७४	सिँचाइ सुविधा (सङ्घीयस्तर माथि)	हेक्टर (हजारमा)	१४८६.३४	६.७४	१४८७.७	१४८७.९१	१.४७	ऊर्जा
७५	सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षैभर सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि	हेक्टर (हजारमा)	४३२.०९१	०.१४	४३२.०९१	४३२.०९१	०	ऊर्जा
७६	लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ कार्यक्रमबाट सिंचित क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर	४४४१	४४०	४६४१	४६७१	१२०	ऊर्जा
७७	ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण	कि.मि.	११७७.४९	४७.२	१४८१.२	१४९४.७१	१७.१२	ऊर्जा
७८	तटबन्ध निर्माणबाट जग्गा उत्कास	हेक्टर	१३६७१.९	१४०	१३६८७	१३७२१.९	४०	ऊर्जा
७९	सतह सिँचाई आयोजनाहरूबाट सिंचित क्षेत्रफल विस्तार	हेक्टर (हजारमा)	१०३४.३७	६.०४	१०३४.७	१०३४.८२	१.४४	ऊर्जा
८०	विद्युत जडित क्षमता	मे.वा.	३९६०	६६६	४२९३	४०८४.२४	१२४.२४	ऊर्जा
८१	६६ के.भि. भन्दा बढी प्रसारण लाइन निर्माण	सर्किट कि.मि.	७६९	६६८	७४९४	७२४७.२	८६.२	ऊर्जा
८२	३३ के.भि. प्रसारण लाइन विस्तार	सर्किट कि.मि.	८०४८	२८१	८१९८.४	८२१९.२२	१६१.२२	ऊर्जा
८३	विद्युत निर्यात	मिगावाट आवर	२३२२	४९२९	३७२०	२७७४.१७	२७७४.२	ऊर्जा
८४	सौर विद्युत उत्पादन क्षमता	मे.वा.	४६.८९१	७	४६.९९१	६२.७०१	४.८१	ऊर्जा
८५	लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन	मे.वा.	४०.६४२	०.७	४०.७१	४०.७१४	०.०६२	ऊर्जा
८६	विद्युत आपात	मिगावाट आवर	१७१२	१२६०	१४४	१२३.८	१२३.८	ऊर्जा
८७	नियोगमार्फत आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन	सङ्ख्या	२००	२७०	८०	१००	१००	परराष्ट्र
८८	द्विपक्षीय परामर्श संवन्धको बैठक आयोजना/सहभागिता	सङ्ख्या	४	४	१	१	१	परराष्ट्र
८९	विद्युतीय राहदानी वितरण	सङ्ख्या (प्रति हजार)	४७३४	११००	४४०	४७१	४७१	परराष्ट्र

१०

३१५५१४



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक संख्य	२०८२ पुससम्मको संख्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनसम्मको पुससम्मको प्रगति	निकाय
९०	कन्सुलर सेवा अन्तर्गत कागजगत प्रमाणीकरण	सदरूपा (हजारमा)	७४७५८८	५००	२४०	३६५	३६५	परराष्ट्र
९१	विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारमा सहजीकरण	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	परराष्ट्र
९२	विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कानुनी सहायता एवं परामर्श प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	परराष्ट्र
९३	कालोपत्रे सडक (दुई लेन)	कि.मि.	१९,४२१.७	८००	१९,४९५	१९,७५९.९	३०३.४	भौतिक
९४	कालोपत्रे सडक (चार लेन वा भार लेन भन्दा बढी)	कि.मि.	५८७.६९	१०८.५	५९८	६३५.९९	४८.३	भौतिक
९५	पुल निर्माण	वटा	३५३७	१६२	३५७८	३६०३	६६	भौतिक
९६	सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण	सदरूपा (लाखमा)	४०,७१६	६	४३,६	४०,६९	०,१७४	भौतिक
९७	इम्बोसड नम्बर प्लेट वितरण	सदरूपा (हजारमा)	७४४,०४५	२५०	८२०	८३९,०५९	८७,०९४	भौतिक
९८	कर्णाली कोरिडोर (लालिचगर- डुम्लिकुला र घाटपारीचौर- बडीगाउँ-मुढाखोला खण्ड) सडक आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कि.मि.	१६	०.५	१६,२४	१६,२४	०,२४	रक्षा
९९	उत्तर दक्षिण राजमार्ग, कोशी कोरिडोर, खैरवारी - किमाथ्याङ्ग सडक। प्यम्ताङ्ग- घोडुप्पा खण्ड। टुवाक स्तरोन्नति	कि.मि.	०	४.३१	२.७	२.७	२.७	रक्षा
१००	महाकाली कोरिडोर वार्जुला- टिङ्गर। तुषारपानी-टिङ्गर खण्ड। सडक आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कि.मि.	१७५	२.३	१९,६५	१८,४९	०,९९	रक्षा
१०१	बेनीघाट-आरुघाट- साकेभन्ज्याङ्ग सडक आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति	कि.मि.	४०	०.८	४०,७८	४०,८	०,८	रक्षा
१०२	राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विद्यालय (NOU) निर्माण कार्यको समष्टिगत भौतिक प्रगति	प्रतिशत	७४.०४	२५.९६	८६.०४	८६.०४	१२	रक्षा

३०/०१/१८



क्र.सं.	सूचक	इकाई	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
१०३	सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम	जना	४३६२४	१४०००	४०६०४	४६४२३	१४७९८	रसा
१०४	काठमाडौं-तराई/मधेश त्रुटमार्ग सडक आयोजनाको सर्वांगीण भौतिक प्रगति	प्रविशत	४२९३	१४	४९९३	४४९६	३०३	रसा
१०५	बनलेखबाट सडकलिन (मु.अ. कर बाहेकको) राजस्व रकम	रु.अर्ब	१.४	१.४	०.६	१.९१	१.९१	जग
१०६	काठ उत्पादन	क्यु.फिट (लाखमा)	३९९.८४	३००	१३०	१३१.९६	१३१.९६	बन
१०७	शउरा उत्पादन	बट्टा (हजारमा)	४८.९१	४२	०.३	१९.३६	१९.३६	बन
१०८	उत्पादित काठ विक्री	क्यु.फिट (लाखमा)	३८१.०४	३४०	१३४	१४३.९८	१४३.९८	बन
१०९	दिगो व्यवस्थापन भएको बनको क्षेत्रफल	हेक्टर (हजारमा)	२६६	४	२६८	२६६	०	बन
११०	घाँसे मैदान व्यवस्थापन	हेक्टर	४८४४९	७९०	१४४	४४९.९८	४४९.९८	बन
१११	घाँसे मुहान र पोखरी संरक्षण	सङ्ख्या	३६४	२४३	३०	१९	१९	बन
११२	सिमेन्टसरोज व्यवस्थापन	बट्टा	०	४३	७	७	७	बन
११३	गल्छी, खहरे, पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथाम	सङ्ख्या	३६४	४३	९०	७	७	बन
११४	शहरी हरित उद्यान निर्माण तथा व्यवस्थापन	सङ्ख्या	१८०	७०	२००	२२९	४९	बन
११५	कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बनक्षेत्रको योगदान	प्रतिशत	३	३.२४	३.१	३	३	बन
११६	स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयारी तथा कार्यान्वयन भएका स्थानीय तह	सङ्ख्या	२६४	१०	२६६	२६४	०	बन
११७	उद्योग प्रतिष्ठानको वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी निरीक्षण एवम् अनुगमन	सङ्ख्या	१०३	२४	८	१४	१४	बन



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ वसन्तको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक सङ्ख्या	२०८२ पुससम्मको सङ्ख्या	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनवेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
११८	वातावरणीय प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नदीनाला, तालतलोयाको पानी तथा उपयोग, कलकारखानाबाट निष्कासित फोहोर पानी लगायतका नमुना सङ्कलन तथा विश्लेषण	सङ्ख्या	११	२०	२०	४३	४३	वन
११९	राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना	बटा	०	३०	१०	२७	२७	युवा
१२०	अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना	बटा	०	११	४	४	४	युवा
१२१	युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत स्वरोजगार सिर्जना	जना (हजारमा)	१०९	११	१११	१०९	०	युवा
१२२	खेताडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण	जना	१०४	१०४	१०४	१२०	१२०	युवा
१२३	स्वयम्सेवी कार्यमा सहभागी युवा र स्काउट	जना (हजारमा)	२४	२२	१०	८,९४४	८,९४४	युवा
१२४	सिप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण	सङ्ख्या (प्रति हजार)	४१९.४	४०	४४४	४३०.६७	११.२७	शिक्षा
१२५	अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासका राष्ट्रिय उत्कृष्ट केन्द्रहरू	सङ्ख्या	०	२	१	०	०	शिक्षा
१२६	नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन संस्थाहरू (विज्ञान शहर/पार्क, इन्क्यूबेटर, एन्ग्लेटर, ग्रामीण नव प्रवर्तनशाला, प्रविधि पार्क) स्थापना, नियमन	सङ्ख्या	०	४०	२४	१	१	शिक्षा
१२७	दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा मुलकी महिलाहरूको तबाडउद्धार	जना	८४४	१००	८९४	८९१	४६	महिला

३१/११/२०



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
१२८	महिला, बालबालिका, उद्येष्ठ नागरिक, अपांडगता भएका व्यक्ति सम्बन्धी छपडीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने सामाजिक सुचना व्यवस्थापन प्रणाली (SAMS) पोर्टल कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह	वटा	१५०	६०	१८०			महिला
१२९	संघीय मन्त्रालयहरूको भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्तता परीक्षण गर्ने	वटा	१७	५	१९			महिला
१३०	सडक बालबालिकाको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना संरक्षण तथा व्यवस्थापन	जना	५५५९	५००	५८०९	५९७७	४९८	महिला
१३१	बेवारिस तथा असहाय बालबालिकाको बालगृहमा पुनर्स्थापना	जना	७११८	३५०	७२९२	७१६०	४२	महिला
१३२	हराएकामध्ये फेला परेका बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलन	प्रतिशत	९२.८५	९२	९२	८२.०१	८२.०१	महिला
१३३	लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अडिट	सङ्ख्या	०	३	१	०	०	महिला
१३४	सीप विकास तालिम प्राप्त महिला	सङ्ख्या	४२८९	७०६४	५७१४	५०३९	५०३९	महिला
१३५	सूचीकृत बेरोजगारमध्ये रोजगार सहायता कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउने व्यक्ति (वार्षिक)	जना	५०३०८	१७३००	३०००	०	०	धर्म
१३६	सामाजिक सुरक्षा कोषमा आषड्क लाभग्राहीको सङ्ख्या	जना (लाखमा)	२३.८०१८	३.२१८२	२५.३	२७.४०९१	३.६०७३	धर्म
१३७	सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुने प्रतिष्ठान/रोजगारदाताको सङ्ख्या	जना (हजारमा)	२०.९७६	२.०२४	२२	२२.७४३	१.७६७	धर्म
१३८	छोटो अर्धको रोजगारउन्मुख व्यावसायिक सीपमूलक तालिम लिने व्यक्तिको सङ्ख्या	जना (हजारमा)	२४.०८४	२६.७	१०	४१३	४१३	धर्म

१४ ३१/५/१८



क्र.सं.	सूचक	इकाई	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
१३९	वैदेशिक रोजगारीमा जाने सीपयुक्त व्यक्तिको सङ्ख्या	प्रतिशत	७०.६२५	८०	८०	७६.६३	७६.६३	धम
१४०	धम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुक सङ्ख्या	सङ्ख्या	१२	५	१३	१२	०	धम
१४१	पुनः एकीकरण कार्यक्रमबाट लाभग्नित हुने व्यक्तिको सङ्ख्या	जना	५०००	५०००	२०००	३६०१	३६०१	धम
१४२	धम अडिट गर्ने प्रतिष्ठानको सङ्ख्या	सङ्ख्या	४२७४	५०००	१५००	१२०९	१२०९	धम
१४३	पर्यटक आगमन	सङ्ख्या (लाखमा)	१९.२८	१२.५	६	३.४३	३.४३	संस्कृति
१४४	अन्तर्राष्ट्रिय उडान गन्तव्य (शहर)मा विस्तार	स्थान	२८	१	२९	२८	०	संस्कृति
१४५	भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माण	सङ्ख्या	८१२	१०	८१७	८१५	०	संस्कृति
१४६	ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण	कि.मि.	६४०	२०	६४९	६४९	९	संस्कृति
१४७	पर्यटन क्षेत्रको शैक्षिक/तालिम प्राप्त जनशक्ति	सङ्ख्या (हजारमा)	६.५७१	५.३	२.१	३.९५८	३.९५८	संस्कृति
१४८	प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण दर्ता	सङ्ख्या	३०३४	३००	३१८४	३२२४	१९०	संस्कृति
१४९	अभिलेखको डिजिटाइजेसन	पृष्ठ (लाख)	१२	६	१४.९	१४	२	संस्कृति
१५०	पर्यटक स्तरको तारेहोटलमा उपलब्ध बेड सङ्ख्या	सङ्ख्या (हजारमा)	२०.३४	०.४६	२०.६४	२०.५१९	०.१७९	संस्कृति
१५१	कल्चरल ट्रेल	कि.मि.	३२९.२५	१५	३४६.२५	३४८	८.७५	संस्कृति
१५२	कुल अन्तर्राष्ट्रिय उडान सङ्ख्या	सङ्ख्या (हजारमा)	३३.५५	३३.६	१९	१८.५७४	१८.५७४	संस्कृति
१५३	सेवाप्राप्ती सन्तुष्टि सर्वेक्षण	निकाय सङ्ख्या	२०	२०	१०	१५	१५	सङ्घीय मामिला
१५४	व्यवस्थापन परीक्षण गरेका निकाय	निकाय सङ्ख्या	२६	३०	१५	११	११	सङ्घीय मामिला
१५५	स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना (MTEF) तर्जुमामा सहजीकरण र पृष्ठपोषण	स्थानीय तह	२८७	११०	३०९	३०९	२२	सङ्घीय मामिला

१५ ३१/११/१८



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
१५६	स्थानीय तहबाट प्राप्त भएका आयधिक योजनामा पुष्टपोषण तथा सुझाव प्रदान	प्रतिशत	१००	१००	१००	१००	१००	सदृधीय मामिला
१५७	निजामती कर्मचारी अस्पतालमा बहिरदुग सेवा प्रदान (औसत प्रतिदिन)	जना	१११५	१११५	१११५	१०८०	१०८०	सदृधीय मामिला
१५८	कर्मचारी प्रशिक्षण/तालिम (अधिकृत स्तर)	जना	२७५९	२२००	१३२५	१२७८	१२७८	सदृधीय मामिला
१५९	कर्मचारी सेवाकालीन तालिम (राजपत्र अनधिकृत तथा स्थानीय तहका अधिकृतसमेत)	जना	६६०	५७५	४००	४७८	४७८	सदृधीय मामिला
१६०	रेडियोको राष्ट्रिय पहुँच (डिजिटल प्लेटफर्म समेत)	प्रतिशत	९४	३	९५	९४	०	सञ्चार
१६१	२५ कोर माथिको अष्टिकल फाइबर विस्तार	कि.मि.	१८१५९	२३५१	१९१४५	१८८८२.१	७२३.१४	सञ्चार
१६२	१२ कोर माथिको अष्टिकल फाइबर विस्तार	कि.मि.	३१०००	९०००	३२०००	३२०८७.३	४०८७.३	सञ्चार
१६३	फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा विस्तार	प्रतिशत	४८.९८	२.०७	४९.६८	४०.९९	२.३१	सञ्चार
१६४	टेलिभिजन पहुँच (डिजिटल प्लेटफर्म समेत)	प्रतिशत	७२	१३	७३	८२	१०	सञ्चार
१६५	नागरिक एममा आयुद्ध सरकारी सेवा	बटा	६५	५	६९	६७	२	सञ्चार
१६६	फोर जी/एल.टी.ई. सेवा विस्तार	प्रतिशत	८७.९	५.१	९०.५	९०.३७	२.४७	सञ्चार
१६७	Government Integrated Office Management System (GIOMS) लागु भएका सरकारी कार्यालय	बटा	१४०	८६०	५६६	२१०	७०	सञ्चार
१६८	एकीकृत वेबसाइट प्रणाली लागु भएका कार्यालय	बटा	१५०	१८५०	१०५०	५७०	४२०	सञ्चार
१६९	द्रुत डाँक सेवा (EMS) सञ्चालन	जिल्ला सदृध्या	४५	१५	५९	४५	०	सञ्चार
१७०	द्रुत डाँक सेवा (EMS) सञ्चालन हुने देश	सदृध्या	३९	३	४०	३९	०	सञ्चार

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

१६ ३१/५/१६

*[Handwritten signature]*



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८१ वसन्तको स्थिति	२०८१/०८२ को वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको लक्ष्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
१७१	सूचना प्रविधि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान	प्रतिशत	१.९४	२	१.९६	१.९४	१.९४	सञ्चार
१७२	स्वास्थ्य सस्थाबाट प्रसुति सेवा लिने महिला	प्रतिशत	७८	८०	४०	३३.२	३३.२	स्वास्थ्य
१७३	शैथिल्य पटकसम्म गर्भवती जीव गर्ने महिला	प्रतिशत	८९	९०	४४	३७.६	३७.६	स्वास्थ्य
१७४	होमिएथेप्योसिस सन्तुष्टि प्राप्त बालबालिका	प्रतिशत	९४	९४	४७	३१	३१	स्वास्थ्य
१७५	सन्तुष्टि पश्चात् पहिचान दर	जना (लाखमा)	१२४	१३०	६२	४१	४१	स्वास्थ्य
१७६	शय्याबाट उपचार सफलता दर	प्रतिशत	९३	९४	९४	८६.९१	८६.९१	स्वास्थ्य
१७७	आयुर्वेद सेवा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या	जना (हजारमा)	२४१०	२४२०	१२४०	८७०	८७०	स्वास्थ्य
१७८	निःशुल्क निगौला प्रत्यारोपण भएका व्यक्ति	सङ्ख्या	३४६	४००	२००			स्वास्थ्य
१७९	निःशुल्क मुटु रोग उपचार पाएका व्यक्ति	जना	८१९६	८२००	४१००			स्वास्थ्य
१८०	विपन्न नागरिकहरूको उपचार सेवा	जना (हजारमा)	२९,४८३	४०	२०			स्वास्थ्य
१८१	स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसङ्ख्या	प्रतिशत	३२	३८	४०	३४.६८	२.६८	स्वास्थ्य
१८२	आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तह	वटा	२९	६०	४०	६२	३३	स्वास्थ्य
१८३	रु. ५ हजार प्रदान गरिएका मुगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, जसन्सर भएका व्यक्तिहरू र मेरुदण्ड पतनबाट भएका विरामी सङ्ख्या	जना (हजारमा)	३४.४	०.४	३४.७			स्वास्थ्य
१८४	सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकास	जना	११३३	१२००	६००	७४७	७४७	सार्वजनिक खरिद
१८५	सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी घोलपत्रदाताको क्षमता विकास	जना	४६	२००	१००	०	०	सार्वजनिक खरिद

१७ ३१/५/१९



क्र.सं.	सूचक	इकाइ	२०८२ असारको स्थिति	२०८२/०८३ को वार्षिक सङ्ख्य	२०८२ पुससम्मको सङ्ख्य	२०८२ पुससम्मको प्रगति	२०८२ साउनदेखि पुससम्मको प्रगति	निकाय
१८६	SBO/निर्देशिका संशोधन	बटा	२	१०	७	२	०	सार्वजनिक खरिद
१८७	SBO/निर्देशिका निर्माण	बटा	१९	७	२३	२०	१	सार्वजनिक खरिद
१८८	SBO/निर्देशिका नेपालीकरण	बटा	०	२	१	०	०	सार्वजनिक खरिद
१८९	सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन/अध्ययन विश्लेषण	पटक	१७	३३	१६	१३	१३	सार्वजनिक खरिद
१९०	नयाँ परिचोजना पहिचान - (PIN) तयारी	बटा	१२७	३०	१५०	१६१	३४	लगानी बोर्ड
१९१	पूर्व सम्भाव्यता/सम्भाव्यता अध्ययन	बटा	०	५	५	०	०	लगानी बोर्ड
१९२	MoU/लगानी स्वीकृति	रु अर्ब	१६१४	३००	१८१४	१७१७	१०३	लगानी बोर्ड
१९३	PDA/PIA सम्झौता	रु अर्ब	४५८	३००	६०८	४५८	०	लगानी बोर्ड
१९४	वित्तीय व्यवस्थापन/निर्माण कार्य प्रालनी	रु अर्ब	२०४	२००	२४४	२५५	४१	लगानी बोर्ड
१९५	लगानी प्रबर्द्धन कार्यक्रम (राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय)	बटा	१५	१७	५	५	४	लगानी बोर्ड
१९६	त्रैमासिक राष्ट्रिय लेखाको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक	पटक	४	४	२	२	२	तथ्याङ्क कार्यालय
१९७	मूल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक	पटक	४	४	२	२	२	तथ्याङ्क कार्यालय
१९८	गणना/सर्वेक्षणका नतिजा तथा विश्लेषण प्रकाशन/सार्वजनिक	सङ्ख्या	२१	९	४	४	४	तथ्याङ्क कार्यालय
१९९	२०८२ असार बसन्त सम्म कायम रहेको शोधभर्ना (रु १५.२ अर्ब) प्रालनी	प्रतिशत	३१	१००	५०	६२.१	६२.१	महालेखा
२००	सम्पत्ति सञ्चन रूपमा खोजविन कार्य सम्पन्न जिल्ला	जिल्ला सङ्ख्या	४५	४	४७	४५	०	नेपाल टुट
२०१	हालसाविक गरिएको स्थान	स्थान	०	२	१	०	०	नेपाल टुट
२०२	सिमाङ्कन गरिएको जग्गा	स्थान	१	२	२	१	०	नेपाल टुट

स्रोत: एकीकृत अन्लाइन अनुगमन प्रणाली

\*नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित पुस महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन अनुसार

१८



### ३. राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति

#### ३.१ राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरणअनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक कर राजस्व लक्ष्यको ३८.९३ प्रतिशत, वार्षिक गैरकर राजस्व लक्ष्यको ३९.६९ प्रतिशत र कुल राजस्व लक्ष्यको ३९.०१ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ।


तालिका:२- राजस्व सङ्कलनको प्रगति स्थिति (रु. अर्बमा)

राजस्व	वार्षिक लक्ष्य	२०८२ पुस मसान्तसम्म सङ्कलित राजस्व	प्रगति प्रतिशत
कर राजस्व	१३२४.२८४	४९६.९९४	३८.९३
गैरकर राजस्व	१४४.४९६	६१.२८४	३९.६९
कुल	१४८०.०००	५५८.२७८	३९.०१

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २०८१ पुस मसान्तसम्ममा कर राजस्व ३८.११ प्रतिशत, गैरकर राजस्व ४१.९७ प्रतिशत र कुल राजस्व ३९.४३ प्रतिशत सङ्कलन भएको देखिन्छ। त्यस्तै यो सङ्कलन प्रतिशत २०८० पुस मसान्तसम्ममा क्रमशः ३३.९८, ४५.२३ र ३४.९० रहेको देखिन्छ।

लेखाचित्र: १ - लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन (प्रतिशत)



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## ३.२ खर्चसम्बन्धी प्रगति स्थिति

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरणअनुसार नेपाल सरकारद्वारा विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यसमध्ये चालुतर्फ ४१.२५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १२.१२ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४०.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ।


तालिका: ३- सरकारी खर्चको प्रगति स्थिति (रु. अर्बमा)

विषय	चालु	पुँजीगत	वित्तीय	कुल
कुल बजेट	११००.९००	४०७.८८८	३७५.२४२	१९६४.११
२०८२ पुससम्मको खर्च	४०७.१४३	४९.४२५	१५३.६४७	६९०.२१५
खर्च प्रतिशत	४१.२५	१२.१२	४०.९५	३५.१४

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

विगत २ वर्षमा वार्षिक विनियोजनका आधारमा प्रथम ६ महिनाको अवधिसम्म भएको सरकारी खर्च अध्ययन गर्दा चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत खर्च घट्दै गएको देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ २०८० पुस महिनासम्ममा २६.०२ प्रतिशत खर्च भएकोमा २०८१ पुससम्ममा ४३.२० प्रतिशत खर्च भई खर्च प्रतिशतमा सुधार भएको देखिन्छ। तर, २०८२ पुस महिनासम्ममा खर्च प्रतिशतमा केही हास आई यस्तो प्रतिशत ४०.९५ मात्र भएको देखिन्छ। २०८०, २०८१ र २०८२ साल पुस मसान्तसम्मको कुल खर्च प्रतिशत क्रमशः ३२.३५, ३५.८९ र ३५.१४ रहेको देखिन्छ।

लेखाचित्र: २ - लक्ष्यको तुलनामा कुल खर्च (प्रतिशत)

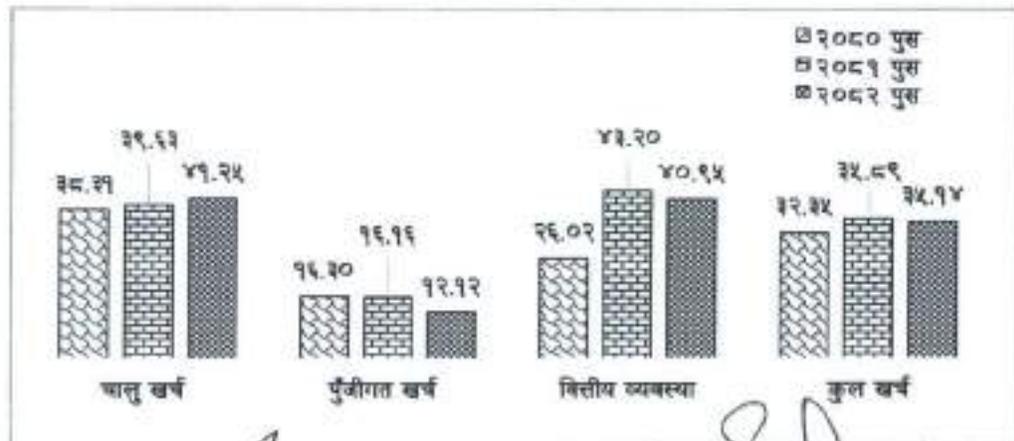

Handwritten signatures and a date '२०' are visible at the bottom of the page.



### ३.३ मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको विवरण

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरण अनुसार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयहरूमध्ये पुँजीगत खर्चको ५२.१६ प्रतिशत भार रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १७.७४ प्रतिशत, ११.८६ प्रतिशत भार रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १५.१३ प्रतिशत र १०.३४ प्रतिशत भार रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको ५.७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रगति देखिएको छ।

तालिका: ४- मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च


क्र.सं.	मन्त्रालय	पुँजीगत खर्च प्रतिशत	भार (पुँजीगत खर्चमा)
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	१७.७४	५२.१६
२	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ	१५.१३	११.८६
३	शहरी विकास	५.७३	१०.३४
४	गृह	१९.१९	६.०३
५	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	१५.१२	५.२४
६	सानेपानी	११.०१	४.४४
७	अर्थ	१७.१५	३.३१
८	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	९.४७	१.३१
९	रक्षा	८.२४	१.०८
१०	परराष्ट्र	२७.१३	०.८०
११	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	६.८७	०.६१
१२	युवा तथा खेलकुद	७.९९	०.२९
१३	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	३१	०.४४
१४	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	९.७५	०.३८
१५	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	२१.६४	०.३३
१६	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	३.४९	०.२८
१७	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	२.७४	०.२७
१८	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२१.१२	०.२६
१९	वन तथा वातावरण	२.६३	०.२०
२०	धर्म, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	६.७	०.०३
२१	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	२.११	०.०२
२२	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	२०.०५	०.००४
<b>कुल</b>			<b>१००.००</b>

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय



महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रकाशित विवरण अनुसार २०८२ पुस महिनासम्म नेपाल सरकारको कुल पुँजीगत खर्चको प्रगति १२.१२ प्रतिशत रहेकोमा उक्त राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण; परराष्ट्र; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक; प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला; गृह; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; अर्थ; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गरी १० वटा मन्त्रालय रहेका छन् भने बाँकी रहेका १२ वटा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएको देखिएको छ।

लेखाचित्र: ३- मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च (प्रतिशत)

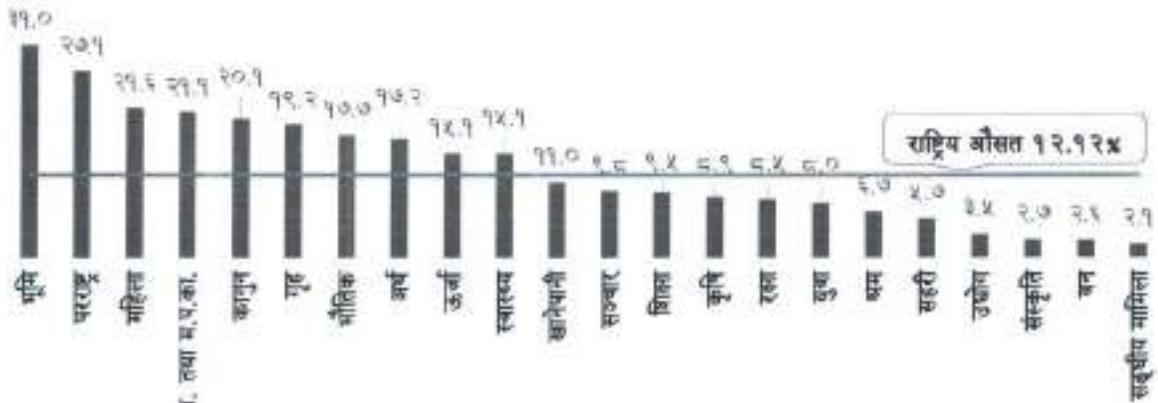

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

२०८२/११/०९

*[Handwritten signature]*

स्रोत: महालेखा नियन्त्रक कार्यालय




## ४. क्रियाकलाप तथा माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

### ४.१ क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

आ.व. २०८२/०८३ का लागि विभिन्न ३० वटा मन्त्रालय/निकायको कार्ययोजनामा समावेश भएका कुल ६८३ वटा क्रियाकलापमध्ये २०८२ पुस मसान्तसम्ममा २.९३ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छन्। आ.व. २०८१/०८२ र २०८०/०८१ को यही अवधिमा यस्तो प्रतिशत क्रमशः ४.२ र ८.५ रहेको थियो। पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी निर्धारित ८९ वटा क्रियाकलापमध्ये यस अवधिसम्ममा २२.५ प्रतिशत सम्पन्न, ६७.४ प्रतिशत चालु र १०.१ प्रतिशत सुरु हुन नसकेको देखिएका छन्।

लेखाचित्र: ४- पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

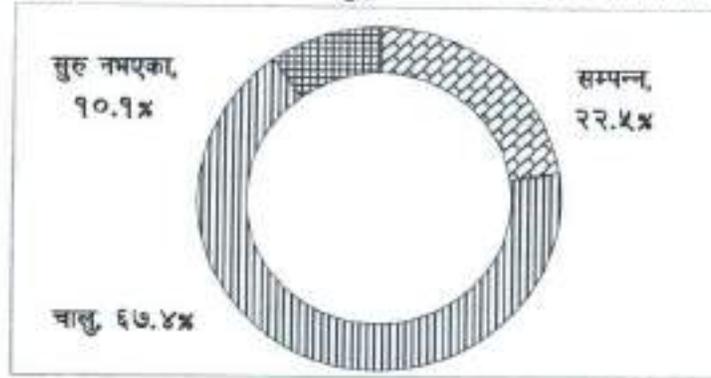

सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलापको प्रगति स्थिति क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा शासकीय सुधार क्षेत्रको सबैभन्दा बढी २९ प्रतिशत सम्पन्न भएको देखिन्छ भने पूर्वाधार क्षेत्रको कुनै पनि क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छैन। त्यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रका सबै क्रियाकलाप चालु अवस्थामा देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै सुरु नभएका क्रियाकलाप शासकीय सुधार क्षेत्रको १६.१ प्रतिशत रहेको छ।

तालिका:५- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

क्षेत्र	कुल क्रियाकलाप	सम्पन्न हुनुपर्ने	२०८२ पुस महिनासम्म					
			सम्पन्न		चालु		सुरु नभएका	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शासकीय सुधार	१७१	३१	९	२९.०	१७	५४.८	५	१६.१
आर्थिक	१९१	२८	७	२५.०	१८	६४.३	३	१०.७
सान्त्विक	११६	२०	४	२०.०	१५	७५.०	१	५.०
पूर्वाधार	२०५	१०	०	०.०	१०	१००.०	०	०.०
<b>कुल</b>	<b>६८३</b>	<b>८९</b>	<b>२०</b>	<b>२२.५</b>	<b>६०</b>	<b>६७.४</b>	<b>९</b>	<b>१०.१</b>


Handwritten signatures and dates are present below the table, including a date of २३/१०/२०८२.



## ४.२ माइलस्टोनको प्रगति स्थिति


आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निर्धारित कुल १,०६१ वटा माइलस्टोनमध्ये पुस महिनासम्ममा ५.७५ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन्। पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएका १८८ वटा माइलस्टोनमध्ये २८.७ प्रतिशत सम्पन्न, ५९.६ प्रतिशत चालु र ११.७ प्रतिशत सुरु नभएको अवस्थामा देखिएका छन्।

लेखाचित्र: ५- पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

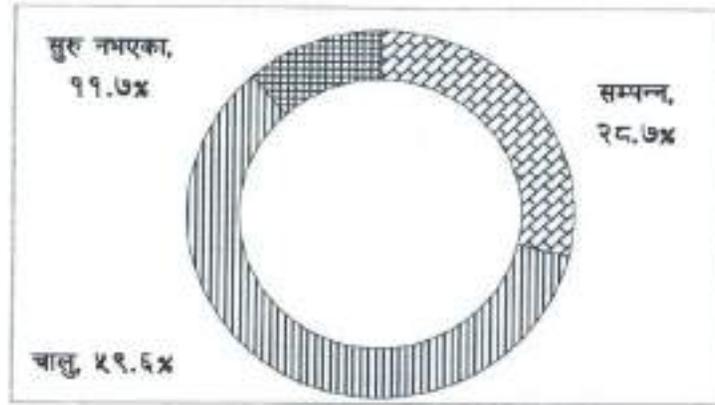

पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा २०८० पुसमा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत ३५.५ रहेको थियो। २०८१ पुसमा उक्त प्रतिशत ११.४ अङ्कले बृद्धि भएता पनि २०८२ पुसमा १८.२ अङ्कले घट्न गई २८.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिन्छ। २०८० र २०८१ सालमा प्रक्रियागत माइलस्टोनको बाहुल्यता रहेको र २०८२ सालमा नतिजामूलक माइलस्टोनको बाहुल्यता रहेकाले पनि २०८२ सालमा सम्पन्न प्रतिशतमा कमी आएको देखिन्छ।

लेखाचित्र: ६- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति (प्रतिशत)

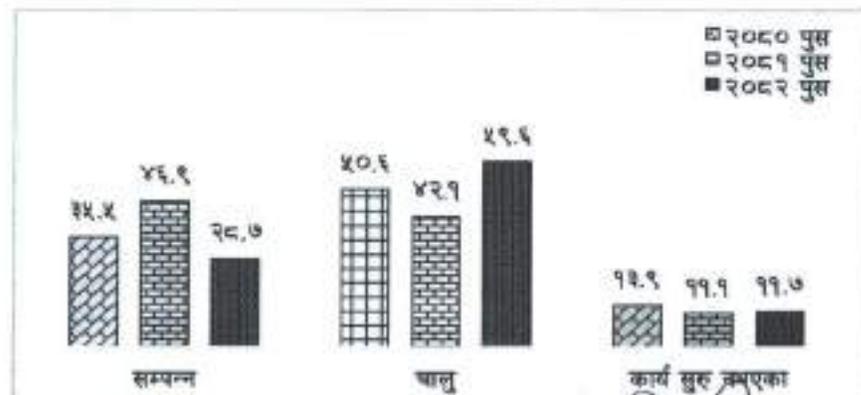

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

२४

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा शासकीय सुधार क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै ३३.३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएका छन् भने सबैभन्दा कम पूर्वाधार क्षेत्रको २०.५ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। शासकीय सुधार क्षेत्रको १६.७ प्रतिशत र सामाजिक क्षेत्रको १३.९ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नै हुन सकेका छन्।

तालिका: ६- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको क्षेत्रगत प्रगति स्थिति

क्षेत्र	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनाभित्र						
		सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चासु		सुरु नभएका	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
शासकीय सुधार	२७१	१४	१८	३३.३	२७	१०.०	९	१६.७
सामाजिक	१६४	३६	११	३०.६	२०	४१.६	४	१३.९
आर्थिक	२८०	१९	१७	२८.८	३७	६२.७	४	८.५
पूर्वाधार	३४५	३९	८	२०.५	२८	७.८	३	७.७
<b>कुल</b>	<b>१०६१</b>	<b>१०८</b>	<b>५४</b>	<b>२८.७</b>	<b>११२</b>	<b>४९.६</b>	<b>२२</b>	<b>११.७</b>

त्यसैगरी, पुस महिनासम्ममा सुरु भई क्रमशः निश्चित लक्ष्य हासिल गर्दै पछाडिको महिनामा सम्पन्न हुने भनी निर्धारण गरिएका ४७७ वटा माइलस्टोनमध्ये ५०.९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएका, ४२.८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नभएका र ६.३ प्रतिशत सुरु हुन सकेका छन्।

लेखाचित्र: ७- पुस महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

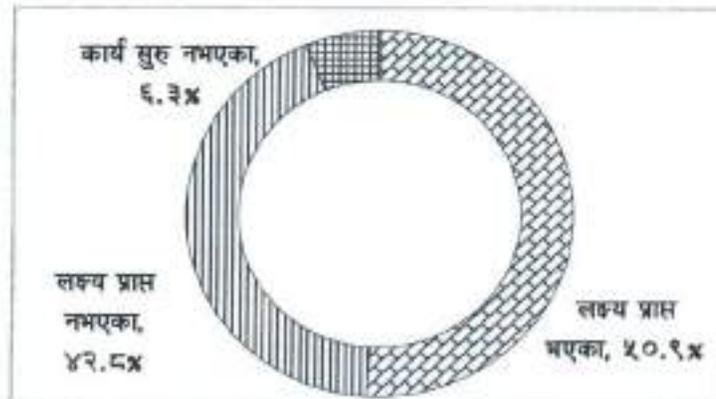

पुस महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने ४७७ वटा माइलस्टोनको प्रगति क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा सामाजिक क्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५४.७

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

२५

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



प्रतिशत र पूर्वाधार क्षेत्रको सबैभन्दा कम ४८.२ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेको देखिन्छ भने शासकीय सुधार क्षेत्रको १४.१ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नै नभएको देखिन्छ।

तालिका: ७- पुस महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

क्षेत्र	कुल माइलस्टोन	सुरु हुनुपर्ने	२०८२ पुस महिनाभित्र					
			लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		सुरु नभएका	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामाजिक	१६५	६४	३५	५४.७	२८	४३.८	१	१.६
भार्षिक	२८०	११७	६१	५२.१	५६	४८.४	४	३.४
शासकीय सुधार	२७१	१२८	६६	५१.६	४४	३४.४	१८	१४.१
पूर्वाधार	३४५	१६८	८१	४८.२	८०	४७.६	७	४.२
<b>कुल</b>	<b>१०६१</b>	<b>४७७</b>	<b>२४३</b>	<b>५०.९</b>	<b>२०४</b>	<b>४२.८</b>	<b>३०</b>	<b>६.३</b>



## ५. क्षेत्रगत प्रगति स्थिति

### ५.१ आर्थिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति

#### ५.१.१ आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने २८ वटा क्रियाकलापहरूको प्रगति स्थिति हेर्दा २५ प्रतिशत सम्पन्न, ६४.३ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेको र १०.७ प्रतिशत कार्य सुरु नभएको देखिएको छ। क्रियाकलाप सम्पादनको निकायगत तुलना गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शतप्रतिशत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६६.७ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय तथा लगानी बोर्डको कार्यालयका सबै क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको देखिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्धारित एक मात्र क्रियाकलाप सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ।

तालिका: ८- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	३२	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२२	३	२	६६.७	१	३३.३	०	०.०
३	अर्थ	२५	८	४	५०.०	४	५०.०	०	०.०
४	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	४२	१	०	०.०	३	१००.०	०	०.०
५	लगानी बोर्डको कार्यालय	१९	७	०	०.०	७	१००.०	०	०.०
६	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	२६	५	०	०.०	३	६०.०	२	४०.०
७	वन तथा वातावरण	२५	१	०	०.०	०	०.०	१	१००.०
कुल		१९१	२८	७	२५.०	१८	६४.३	३	१०.७

#### ५.१.२ आर्थिक क्षेत्रको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ५९ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा २८.८ प्रतिशत सम्पन्न, ६२.७ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ८.५ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। पुस महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको सम्पन्न स्थितिलाई निकायगत रूपमा तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा

२७




गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६६.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सबै माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेको र वन तथा बातावरण मन्त्रालयको सम्पन्न हुनुपर्ने एक मात्र माइलस्टोन सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ।

तालिका: ९- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२५	३	२	६६.७	१	३३.३	०	०.०
२	उद्योग, कृषि तथा आपूर्ति	४६	६	३	५०.०	३	५०.०	०	०.०
३	अर्थ	५५	११	८	४२.१	११	५३.९	०	०.०
४	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३४	११	२	१८.२	७	६३.६	२	१८.२
५	लगानी बोर्डको कार्यालय	३३	१५	२	१३.३	११	७३.३	२	१३.३
६	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	५४	४	०	०.०	४	१००.०	०	०.०
७	वन तथा बातावरण	३३	१	०	०.०	०	०.०	१	१००.०
<b>कुल</b>		<b>२८०</b>	<b>५९</b>	<b>१७</b>	<b>२८.८</b>	<b>३७</b>	<b>६२.७</b>	<b>५</b>	<b>८.५</b>

आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूका पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत २०८१ पुसको तुलनामा २२.५ अड्कले घटेको र चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोन २४.६ अड्कले बढेको देखिएको छ। यद्यपि, कार्य सुरु नभएका माइलस्टोनको प्रतिशत गत वर्षको तुलनामा २.१ अड्कले घटेको देखिएको छ।

लेखाचित्र: ८- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति (प्रतिशत): आर्थिक क्षेत्र

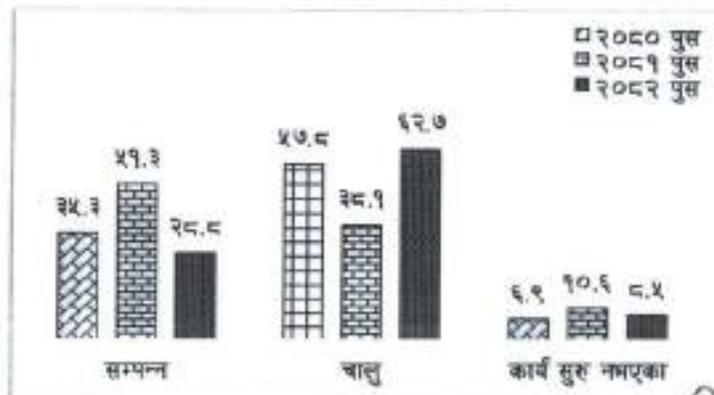

Handwritten signatures and dates are present at the bottom of the page, including the date '२० ३१/५/२०८२'.




आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका पुस महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने ११७ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५२.१ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेका, ४४.४ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेका र ३.४ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। लक्ष्य प्राप्त स्थितिलाई निकायगत रूपमा तुलना गर्दा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७४.३ प्रतिशत माइलस्टोनले पुस महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा कम २० प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको सबैभन्दा धेरै ११.१ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु नै हुन नसकेको देखिएको छ।

तालिका: १०- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	५४	३५	२६	७४.३	९	२५.७	०	०.०
२	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२२	१०	७	७०.०	३	३०.०	०	०.०
३	तगानी बोर्डको कार्यालय	३३	६	४	६०.०	४	२०.०	०	०.०
४	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३४	१०	९	२०.०	७	३६.९	२	११.१
५	बन तथा बलावरण	३३	२२	९	४०.९	११	३०.०	२	९.१
६	उद्योग, बणिज्य तथा आपूर्ति	४६	१४	४	२८.६	१०	७१.४	०	०.०
७	अर्थ	१५	१०	२	२०.०	६	६०.०	०	०.०
कुल		२८०	११७	६१	५२.१	५२	४४.४	४	३.४

\* निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको १ वटा माइलस्टोनमध्ये लक्ष्य प्राप्तमा समावेश गरिएको

आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न वा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने १७६ वटा माइलस्टोनमध्ये ८९ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका छन्। चालु अवस्थाका माइलस्टोनहरूलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभिन्न पाँच चरणहरूमा बाँडेर विश्लेषण गर्दा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये ४.५ प्रतिशत माइलस्टोनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। त्यसैगरी, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ९.७ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ८ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ६.३ प्रतिशत, २० भन्दा कम प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन २२.२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

  २९  



तालिका: ११- चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: आर्थिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/ निकाय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल संख्या	सम्पन्न/ लक्ष्य प्राप्त		चालु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन संख्या						सुरु नभएको संख्या
			संख्या	प्रतिशत	८०- ९९.९९%	६०- ८०%	४०- ६०%	२०- ४०%	०- २०%	कुल चालु	
१	भूमि	१३	९	६९.२	०	२	०	१	१	४	०
२	कृषि	३९	२६	६६.७	३	३	३	०	४	१३	०
३	वन	२३	९	३९.१	२	३	२	१	३	११	३
४	संस्कृति	२९	११	३७.९	०	४	१	२	७	१४	४
५	उद्योग	२०	७	३५.०	२	२	१	३	५	१३	०
६	व्यय	२९	१०	३४.४	१	३	७	३	५	१९	०
७	सगानी बोर्ड	२३	६	२६.१	०	०	०	१	५	१७	२
<b>कुल</b>		<b>१७६</b>	<b>७८</b>	<b>४४.३</b>	<b>८</b>	<b>१७</b>	<b>१४</b>	<b>११</b>	<b>३९</b>	<b>८९</b>	<b>९</b>
<b>प्रतिशत</b>				<b>४४.३</b>	<b>४.५</b>	<b>९.७</b>	<b>८.०</b>	<b>६.३</b>	<b>२२.२</b>	<b>५०.६</b>	<b>५.१</b>



## ५.२ पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति

### ५.२.१ पूर्वाधार क्षेत्रको क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल १० क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा शहरी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सबै क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको देखिन्छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप देखिदैन।

तालिका: १२- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	शहरी विकास	४५	६	०	०.०	६	१००.०	०	०.०
२	खानेपानी	२९	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
३	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	४६	१	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
४	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	३१	२	०	०.०	२	१००.०	०	०.०
५	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ	५७	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
कुल		२०५	१०	०	०.०	१०	१००.०	०	०.०

### ५.२.२ पूर्वाधार क्षेत्रको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ३९ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा २०.५ प्रतिशत सम्पन्न, ७१.८ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ७.७ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३३.३ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा कम १० प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ।




तालिका: १३- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	सानेपानी	३६	३	१	३३.३	२	१६.७	०	०.०
२	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	७६	३	१	३३.३	१	३.३	१	३.३
३	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	४६	१०	३	३०.०	७	७०.०	०	०.०
४	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ	१२४	१३	२	१५.४	१०	७६.९	१	७.७
५	राहरी विकास	५३	१०	१	१०.०	८	८०.०	१	१०.०
<b>कुल</b>		<b>३४५</b>	<b>३९</b>	<b>८</b>	<b>२०.५</b>	<b>२८</b>	<b>७९.८</b>	<b>३</b>	<b>७.७</b>

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत २०८१ पुसको तुलनामा २०.५ अडकले घटेको, चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोन २१.२ अडकले बढेको र सुरु नभएका माइलस्टोन ०.७ अडकले घटेको देखिन्छ।

लेखाचित्र: ९- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति (प्रतिशत): पूर्वाधार क्षेत्र

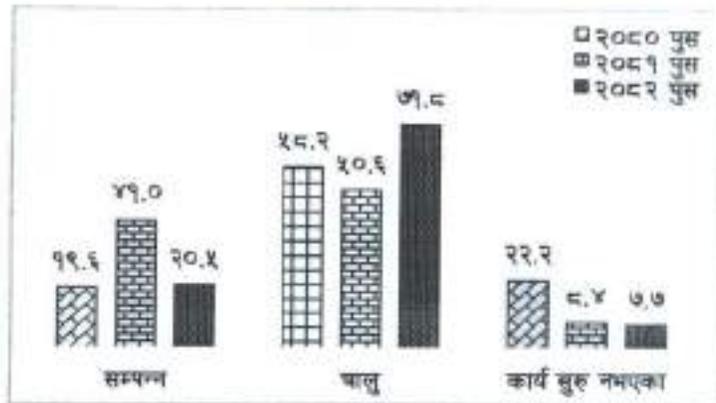

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका पुस महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने १६८ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ४८.२ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गरेका, ४७.६ प्रतिशतले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका र ४.२ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत माइलस्टोनले पुस महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सबैभन्दा कम ३८.५ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गरेका छन्।

*(Handwritten signatures and marks)*



तालिका: १४- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	७६	३०	१८	६०.०	१०	३३.३	२	६.७
२	शहरी विकास	६३	२४	१२	२०.०	१२	३०.०	०	०.०
३	खानेपानी	३६	१८	९	५०.०	८	४४.४	१	५.६
४	ऊर्जा, नलप्रयोग तथा सिंचाइ	१२४	८३	३७	४४.६	४२	५०.६	४	४.८
५	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	४६	१३	४	३०.४	८	६१.५	०	०.०
कुल		३४५	१९८	८१	४८.२	८०	४०.६	७	४.२

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न वा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने १७६ वटा माइलस्टोनमध्ये ८९ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका छन्। चालु अवस्थाका माइलस्टोनहरूलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभिन्न पाँच धरणहरूमा बाँडेर विश्लेषण गर्दा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये ५.८ प्रतिशत माइलस्टोनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। त्यसैगरी, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन १२.१ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ७.२ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ७.२ प्रतिशत, २० भन्दा कम प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन १९.८ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

तालिका: १५- चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: पूर्वाधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल संख्या	सम्पन्न/लक्ष्य प्राप्त		चालु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन संख्या					सुरु नभएको संख्या	
			संख्या	प्रतिशत	६०-	६०-	४०-	२०-	०-		
					९९.९९%	८०%	६०%	४०%	२०%		कुल चालु
१	भौतिक	३३	१९	५७.६	१	३	१	२	४	११	३
२	खानेपानी	२९	१०	४३.६	१	३	२	२	०	१०	१
३	ऊर्जा	९६	३९	४०.६	७	१९	८	८	१३	४२	४
४	शहरी	३४	१३	३८.२	३	२	२	२	११	२०	१
५	सञ्चार	२३	८	३४.८	०	१	२	१	११	१२	०
कुल		२०७	८९	४३.०	१२	२५	१५	१५	४९	१०८	१०
प्रतिशत				४४.३	५.८	१२.१	७.२	७.२	१९.८	५२.२	४.८



## ५.३ शासकीय सुधार क्षेत्रको प्रगति स्थिति

### ५.३.१ शासकीय सुधार क्षेत्रको क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

शासकीय सुधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल ३१ वटा क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा २९ प्रतिशत सम्पन्न, ५४.८ प्रतिशत चालु र १६.१ प्रतिशत सुरु नभएको देखिन्छ। क्रियाकलाप सम्पादनको निकायगत रूपमा तुलना गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्रालयको पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी निर्धारित १-१ वटा क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल ट्रेडको कार्यालयको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने क्रियाकलाप देखिएको छैन।

तालिका: १६- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	१२	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	रक्षा	१४	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
३	गृह	२७	५	२	४०.०	३	६०.०	०	०.०
४	सदृशीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	१०	३	१	३३.३	२	६६.७	०	०.०
५	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	१६	३	१	३३.३	२	६६.७	०	०.०
६	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	२०	०	२	२५.०	५	६२.५	१	१२.५
७	राष्ट्रिय योजना आयोग	१२	५	१	२०.०	१	६०.०	३	६०.०
८	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	०	२	०	०.०	२	१००.०	०	०.०
९	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	७	२	०	०.०	२	१००.०	०	०.०
१०	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	१	०	०.०	०	०.०	१	१००.०
११	परराष्ट्र	१४	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
१२	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	०	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
१३	नेपाल ट्रेडको कार्यालय	५	०	०	०.०	०	०.०	०	०.०
<b>कुल</b>		<b>१७१</b>	<b>३१</b>	<b>९</b>	<b>२९.०</b>	<b>१७</b>	<b>३४.८</b>	<b>३</b>	<b>१६.१</b>



### ५.३.२ शासकीय सुधार क्षेत्रका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ५४ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ३३.३ प्रतिशत सम्पन्न, ५० प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र १६.७ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ६६.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र नेपाल ट्रेडको कार्यालयका सबै माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेको देखिएको छ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको यस अवधिमा सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन देखिएको छैन।


तालिका: १७- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	परराष्ट्र	२९	३	१६.७	१	३.४	०	०.०	
२	राष्ट्रिय तय्याङ्क कार्यालय	२९	७	२३.९	३	१०.३	०	०.०	
३	रक्षा	३०	२	६.७	१	३.३	०	०.०	
४	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३२	११	३४.४	५	१५.६	१	३.१	
५	गृह	२९	५	१७.२	३	१०.३	०	०.०	
६	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	२९	६	२०.७	३	१०.३	०	०.०	
७	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	२५	३	१२.०	२	८.०	०	०.०	
८	राष्ट्रिय योजना आयोग	२९	५	१७.२	१	३.४	३	१०.३	
९	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	१०	३	३०.०	३	३०.०	०	०.०	
१०	नेपाल ट्रेडको कार्यालय	७	३	४२.९	२	२८.६	०	०.०	
११	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	१९	७	३६.८	३	१५.८	४	२१.१	
१२	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	१	१४.३	०	०.०	१	१४.३	
१३	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	११	०	०.०	०	०.०	०	०.०	
कुल		२७१	५४	१९.९	२७	१०.०	९	३.३	



शासकीय सुधार क्षेत्रका मन्त्रालय/ निकायहरूको पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत २०८१ पुसको तुलनामा २२.९ अडकले घटेको, चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रतिशत १८.५ अडकले बढेको र सुरु नभएका माइलस्टोनको प्रतिशत ४.४ अडकले बढेको देखिएको छ।

लेखाचित्र: १०- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति (प्रतिशत): शासकीय सुधार क्षेत्र

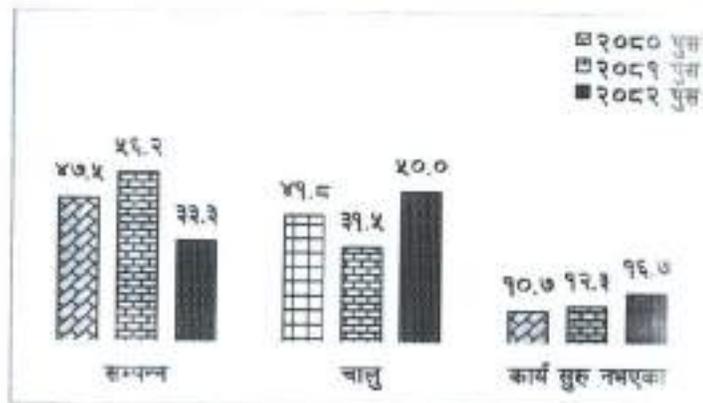

शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/ निकायहरूको पुस महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने १२८ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५१.६ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गरेका, ३४.४ प्रतिशतले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका र १४.१ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको शतप्रतिशत माइलस्टोनले पुस महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरेका छन् भने नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कुनै पनि माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

///

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



तालिका: १८- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाश	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	२१	३	१००.०	०	०.०	०	०.०	
२	महालेखा नियन्त्रक कार्यालय	१०	२	१००.०	०	०.०	०	०.०	
३	परराष्ट्र	२९	१६	५५.०	४	१५.०	०	०.०	
४	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	२२	८	३६.०	२	९.०	०	०.०	
५	गृह	२९	१४	४८.३	४	१३.६	०	०.०	
६	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३२	१६	५०.०	२	६.२	४	१२.५	
७	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	५	७१.४	२	२८.६	०	०.०	
८	रक्षा	३०	२१	७०.०	७	२३.३	२	६.७	
९	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	११	८	७२.७	३	२७.३	१	९.१	
१०	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	१९	११	५७.६	४	२१.०	३	१५.८	
११	राष्ट्रिय योजना आयोग	२१	९	४२.९	१	४.७	७	३३.३	
१२	नेपाल ट्रेडको कार्यालय	७	४	५७.१	४	१००.०	०	०.०	
१३	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	२५	११	४४.०	१०	४०.०	१	४.०	
<b>कुल</b>		<b>२७१</b>	<b>१२८</b>	<b>६९</b>	<b>२५.६</b>	<b>४४</b>	<b>१६.६</b>	<b>१८</b>	<b>६.६</b>

\* निश्चित समय अगावै सम्पन्न भएका गृह मन्त्रालयको ३ वटा र रक्षा मन्त्रालयको २ वटा माइलस्टोनसमेत लक्ष्य प्राप्तमा समावेश गरिएको

शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न वा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने १८२ वटा माइलस्टोनमध्ये ७१ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका छन्। चालु अवस्थाका माइलस्टोनहरूलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभिन्न पाँच चरणहरूमा बाँडेर विश्लेषण गर्दा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये २.२ प्रतिशत माइलस्टोनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। त्यसैगरी, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ५.५ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ३.८ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ३.८ प्रतिशत, २० भन्दा कम प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन २३.६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।



तालिका: १९- चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: शासकीय सुधार क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/ निकाय	सम्पन्न वा सक्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल संख्या	सम्पन्न/ सक्य प्राप्त		चालु अवस्थामा रही सक्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन संख्या						सुरु नभएको संख्या
			संख्या	प्रतिशत	६०- ९९.९९%	६०- ६०%	४०- ६०%	२०- ४०%	०- २०%	कुल बाँच्नु	
१	परराष्ट्र	१९	१४	७३.७	०	१	१	०	३	५	०
२	तथ्याङ्क कार्यालय	१०	७	७०.०	०	०	०	०	३	३	०
३	गृह	१९	१२	६३.२	१	१	०	१	४	७	०
४	सदृशीय मामिला	१३	८	६१.५	१	०	०	०	४	५	०
५	रक्षा	२३	१३	५६.५	२	०	१	२	३	८	२
६	प्र.म. तथा म.प.का	२७	१५	५५.६	०	१	१	०	५	७	५
७	महान्यायाधि वक्ता	६	३	५०.०	०	२	०	०	०	३	१
८	सतर्कता केन्द्र	८	४	५०.०	०	२	०	०	१	३	१
९	महालेखा	५	२	४०.०	०	०	०	०	३	३	०
१०	सार्वजनिक खरिद	१८	३	१६.७	०	१	१	१	५	८	७
११	योजना आयोग	१४	२	१४.३	०	०	१	१	०	२	१०
१२	कानून	१४	१	७.१	०	२	२	२	६	१२	१
१३	नेपाल ट्रेड	६	०	०.०	०	०	०	०	६	६	०
कुल		१८२	८४	४६.२	४	१०	७	७	४३	७१	२७
प्रतिशत				४६.२	२.२	५.५	३.८	३.८	२३.६	३९.०	१४.८

३१/११/१८



## ५.४ सामाजिक क्षेत्रको प्रगति स्थिति

### ५.४.१ सामाजिक क्षेत्रका क्रियाकलापको प्रगति स्थिति

सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायहरूको २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने कुल २० वटा क्रियाकलापको अवस्था हेर्दा २० प्रतिशत सम्पन्न, ७५ प्रतिशत चालु र ५ प्रतिशत कार्य सुरु नभएको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। क्रियाकलापको सम्पादनको तुलनात्मक स्थिति हेर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३३.३ प्रतिशत क्रियाकलाप सम्पन्न भएको देखिएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सबै क्रियाकलाप चालु अवस्थामा रहेको देखिएका छन्।

तालिका: २०- क्रियाकलापको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल क्रियाकलाप	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चालु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	४०	६	२	३३.३	४	६६.७	०	०.०
२	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	२७	४	१	२५.०	३	७५.०	०	०.०
३	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१२	५	१	२०.०	४	८०.०	०	०.०
४	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	२१	२	०	०.०	२	१००.०	०	०.०
५	युवा तथा खेलकुद	१६	३	०	०.०	२	६६.७	१	३३.३
कुल		११६	२०	४	२०.०	१५	७५.०	१	५.०

### ५.४.२ सामाजिक क्षेत्रका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालय/निकायहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने ३६ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ३०.६ प्रतिशत सम्पन्न, ५५.६ प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र १३.९ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। माइलस्टोनको सम्पन्न स्थितिलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ३७.५ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सबैभन्दा कम २२.२ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिएको छ।




तालिका: २१- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनासम्म						
			सम्पन्न हुनुपर्ने	सम्पन्न		चाटु		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१५	८	३	३७.५	५	६२.५	०	०.०
२	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	५७	१२	५	३३.३	८	६६.७	०	०.०
३	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	३२	३	१	३३.३	२	६६.७	०	०.०
४	युवा तथा खेलकुद	१९	४	१	२५.०	२	५०.०	१	२५.०
५	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	४१	९	२	२२.२	३	३३.३	४	४५.४
कुल		१६५	३६	११	३०.६	२०	५५.६	५	१३.६

सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रालयहरूको पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थितिलाई तुलना गर्दा सम्पन्न प्रतिशत २०८० पुसको तुलनामा १८.१ अङ्कले र २०८१ पुसको तुलनामा ८.५ अङ्कले घटेको देखिएको छ। त्यसैगरी, २०८१ पुसको तुलनामा चालु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रतिशत ७.९ अङ्कले बढेको र सुरु नभएका माइलस्टोन ०.७ अङ्कले बढेको देखिएको छ।

लेखाचित्र: ११- सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनको तुलनात्मक प्रगति स्थिति (प्रतिशत): सामाजिक क्षेत्र

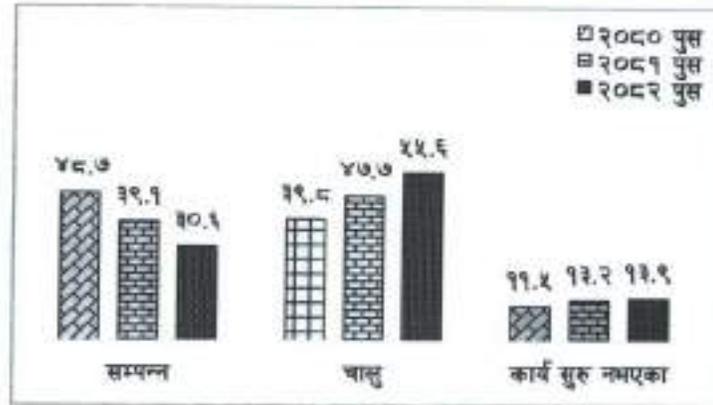

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका पुस महिनाभित्र सुरु भई निश्चित लक्ष्य प्राप्त गरी पछिल्लो महिनामा सम्पन्न हुने ६४ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ५५.७ प्रतिशत माइलस्टोनले लक्ष्य हासिल गरेका, ४३.८ प्रतिशतले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका र १.६ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ। निकायगत रूपमा हेर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको शतप्रतिशत माइलस्टोनले

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



पुस महिनासम्मका लागि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गरिएको भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको यस्तो प्रतिशत ३२ रहेको छ।

तालिका: २२- सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल माइलस्टोन	२०८२ पुस महिनाभित्र						
			सुरु हुनुपर्ने	लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		कार्य सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१५	१	१	१००.०	०	०.०	०	०.०
२	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	५७	१७	१५	८८.२	२	११.८	०	०.०
३	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	४१	१५	८	५३.३	६	४०.०	१	६.७
४	युवा तथा खेलकुद	१९	६	३	५०.०	३	५०.०	०	०.०
५	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	३३	२५	८	३२.०	१७	६८.०	०	०.०
कुल		१५५	६४	३५	५४.७	२८	४३.८	१	१.६

\* निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ वटा माइलस्टोनसमेत लक्ष्य प्राप्तमा समावेश गरिएको

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूको पुस मसान्तसम्म सम्पन्न वा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने १०० वटा माइलस्टोनमध्ये ४८ वटा माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेका छन्। चालु अवस्थाका माइलस्टोनहरूलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभिन्न पाँच चरणहरूमा बाँडेर विश्लेषण गर्दा सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये ५ प्रतिशत माइलस्टोनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। त्यसैगरी, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ६ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ३ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन २ प्रतिशत र २० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ३२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ।

तालिका: २३- चालु अवस्थाका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति: सामाजिक क्षेत्र

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त हुनुपर्ने कुल संख्या	सम्पन्न/लक्ष्य प्राप्त		चालु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन संख्या					सुरु नभएको संख्या	
			संख्या	प्रतिशत	५०-९९.९९%						कुल चालु
					५०%	६०%	७०%	८०%	९०%		
१	शिक्षा	२९	१९	६५.५	१	१	०	०	८	१०	०
२	महिला	९	४	४४.४	०	०	०	०	५	५	०
३	स्वास्थ्य	२४	१०	४१.७	३	१	१	१	३	९	५
४	युवा	१०	४	४०.०	१	०	०	०	५	५	१
५	श्रम	२८	९	३२.१	०	४	२	१	१२	१९	०
कुल		१००	४६	४६.०	५	६	३	२	३२	४८	६
प्रतिशत				४६.०	५.०	६.०	३.०	२.०	३२.०	४८.०	६.०

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a date '११' in the center.



## ६. मन्त्रालय/ निकायगत माइलस्टोनको २०८२ पुससम्मको प्रगति

२०८२ पुस महिनासम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण भएका १८८ वटा र सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने ४७७ वटा गरी कुल ६६५ वटा माइलस्टोनको समग्र स्थिति हेर्दा ४४.७ प्रतिशत सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त भएका, ४७.५ प्रतिशत चालु अवस्थामा रही लक्ष्य हासिल हुन नसकेका र ७.८ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन सकेका छैनन्। निकायगत रूपमा तुलना गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ७३.७ प्रतिशत, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको ७० प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ६९.२ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न वा लक्ष्य हासिल भएको देखिएको छ। त्यसैगरी, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको यस्तो प्रतिशत शून्य रहेको देखिएको छ।

तालिका: २४- सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थिति

क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	कुल	पुससम्म सम्पन्न/सुरु हुनुपर्ने	सम्पन्न/लक्ष्य प्राप्त		लक्ष्य प्राप्त नभएका		सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१	परराष्ट्र	२९	१९	१४	७३.७	५	२९.३	०	०.०
२	राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय	२९	१०	७	७०.०	३	३०.०	०	०.०
३	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण	२५	१३	९	६९.२	४	३०.८	०	०.०
४	कृषि तथा पशुपन्छी विकास	५४	३९	२६	६६.७	१३	३३.३	०	०.०
५	शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि	५७	२९	१९	६५.५	१०	३४.५	०	०.०
६	गृह	२९	१९	१२	६३.७	७	२६.८	०	०.०
७	सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन	२२	१३	८	६१.५	५	३८.५	०	०.०
८	भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात	७६	३३	१९	५७.६	११	३३.३	३	९.१
९	रक्षा	३०	२३	१३	५६.५	८	३४.८	२	८.७
१०	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	३२	२७	१५	५५.६	७	२५.९	५	१८.५
११	राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र	११	८	४	५०.०	३	३७.५	१	१२.५
१२	महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	७	६	३	५०.०	२	३३.३	१	१६.७
१३	स्वामिपानी	३६	२१	१०	४७.६	१०	४७.६	१	४.८
१४	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक	१५	९	४	४४.४	५	५५.६	०	०.०
१५	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या	४१	२४	१०	४१.७	९	३७.५	५	२०.८
१६	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ	१२४	९६	३९	४०.६	५७	४५.२	५	५.२

४२



क्र.सं.	मन्त्रालय/विकास	कुल	पुस्तकसम्म सम्पन्न/सुरु हुनुपर्ने	सम्पन्न/लक्ष्य प्राप्त		सक्य प्राप्त नभएका		सुरु नभएका	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
१७	महालेखा निदन्त्रक कार्यालय	१०	५	२	४०.०	३	६०.०	०	०.०
१८	युवा तथा खेलकुद	१९	१०	४	४०.०	५	४०.०	१	१०.०
१९	वन तथा वातावरण	३३	२३	९	३९.१	११	४७.८	३	१३.०
२०	शहरी विकास	६३	३४	१३	३८.२	२०	५८.८	१	२.९
२१	संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन	३४	२९	११	३७.९	१४	४८.३	४	१३.८
२२	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति	४६	२०	७	३५.०	१३	६५.०	०	०.०
२३	सञ्चार तथा सूचना प्रविधि	४६	२३	८	३४.८	१५	६५.२	०	०.०
२४	अर्थ	४५	२९	१०	३४.५	१९	६५.५	०	०.०
२५	श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा	३३	२८	९	३२.१	१९	६७.९	०	०.०
२६	लगानी बोर्डको कार्यालय	३३	२३	६	२६.१	१५	६५.२	२	८.७
२७	सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय	१९	१८	३	१६.७	६	४४.४	७	३८.९
२८	राष्ट्रिय योजना आयोग	२१	१४	२	१४.३	२	१४.३	१०	७१.४
२९	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला	२५	१४	१	७.१	१२	८५.७	१	७.१
३०	नेपाल टुटको कार्यालय	७	६	०	०.०	१	१००.०	०	०.०
कुल		१०६१	६६५	२९७	४४.७	३१६	४७.५	५२	७.८



## ७. समस्या र कारणहरूको विश्लेषण

- २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने १८८ वटा र पुस महिनाभित्र निर्धारित लक्ष्य हासिल गरी चालु अवस्थामा रहेका ४७७ गरी जम्मा ६६५ वटा माइलस्टोनको विषयानुसार अवस्था अध्ययन गर्दा कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित ५१.२ प्रतिशत माइलस्टोन २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न भएको वा यस अवधिका लागि निर्धारित लक्ष्य हासिल गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी, लगानी मोडालिटी तथा वित्तीय ढाँचा तयारीसँग सम्बन्धित ७८ प्रतिशत माइलस्टोन चालु अवस्थामा रहेको र खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित ३९ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेको देखिएको छ।

तालिका: २५- निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको विषय

क्र.सं.	माइलस्टोनको विषय	सम्पन्न वा लक्ष्य प्राप्त भएका		लक्ष्य प्राप्त नभएका		सुरु नभएका		कुल
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
१	कार्यक्रम सञ्चालन	१९९	४१.२	१३७	४१.५	२४	७.३	३३०
२	निर्माण/खरिद कार्य	१०३	४६.८	१०५	४७.७	१२	५.५	२२०
३	वातावरणीय अध्ययन	२	४०.०	३	६०.०	०	०.०	५
४	सम्भाव्यता अध्ययन	६	३३.३	१०	५२.६	२	११.१	१८
५	कानुनी तयारी	१३	२९.५	२९	६५.९	२	४.५	४४
६	जग्गा प्राप्ति तथा साइट विश्लेषण	२	१२.५	१२	७५.०	२	१२.५	१६
७	लगानी मोडालिटी तथा वित्तीय ढाँचा तयार	१	११.१	७	७७.८	१	११.१	९
८	खरिद प्रक्रिया	१	४.३	१३	५६.५	९	३९.१	२३
कुल		२९७	४४.७	३१६	४७.५	४२	७.८	६५५

- २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने ६६५ वटा माइलस्टोनमध्ये चालु अवस्थामा रही यस अवधिसम्मका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका माइलस्टोन ३१६ वटा अर्थात् ४७.५ प्रतिशत रहेको छ। उक्त माइलस्टोनलाई प्रगति प्रतिशतको आधारमा विभाजन गर्दा ८०-९९.९९ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने माइलस्टोन ४.४ प्रतिशत, ६० देखि ८० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ८.७ प्रतिशत, ४० देखि ६० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ५.९ प्रतिशत, २० देखि ४० प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने ५.३ प्रतिशत र २० भन्दा कम प्रगति हासिल गर्ने २३.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

३१/५/१९



तालिका: २६- निर्धारित लक्ष्य हासिल हुनुपर्नेमा चातु अवस्थामा रहेका माइलस्टोनको प्रगति स्थिति


क्र.सं.	मन्त्रालय/निकाय	सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने कुल	चातु अवस्थामा रहेको		चातु अवस्थामा रही लक्ष्य प्राप्त नभएका माइलस्टोन प्रतिशत				
			संख्या	प्रतिशत	६०-९९.९९	६०-६०	४०-६०	२०-४०	०-२०
१	नेपाल ट्रेड	६	६	१००.०	०.०	०.०	०.०	०.०	१००.०
२	कानुन	१४	१२	८५.७	०.०	१४.३	१४.३	१४.३	४२.९
३	श्रम	२८	१९	६७.९	०.०	१४.३	७.१	३.६	४२.९
४	अर्थ	२९	१९	६५.५	३.४	१०.३	२४.९	१०.३	१७.२
५	सञ्चार	२३	१५	६५.२	०.०	४.३	८.७	४.३	४७.८
६	संग्रहनी बोर्ड	२३	१५	६५.२	०.०	०.०	०.०	४.३	६०.९
७	उद्योग	२०	१३	६५.०	१०.०	१०.०	५.०	१५.०	२५.०
८	महालेखा	५	३	६०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	६०.०
९	शहरी	३४	२०	५८.८	८.८	५.९	५.९	५.९	३२.४
१०	महिला	९	५	५५.६	०.०	०.०	०.०	०.०	५५.६
११	ऊर्जा	९६	५२	५४.२	७.३	१६.७	८.३	८.३	१३.५
१२	युवा	१०	५	५०.०	१०.०	०.०	०.०	०.०	५०.०
१३	संस्कृति	२९	१४	४८.३	०.०	१३.८	३.४	६.९	२४.१
१४	वन	२३	११	४७.८	८.७	१३.०	८.७	४.३	१३.०
१५	खानेपानी	२१	१०	४७.६	४.८	१४.३	९.५	९.५	९.५
१६	सार्वजनिक खरिद	१८	८	४४.४	०.०	५.६	५.६	५.६	२७.८
१७	सङ्घीय मामिला	१३	५	३८.५	७.७	०.०	०.०	०.०	३०.८
१८	स्वास्थ्य	२४	९	३७.५	१२.५	४.२	४.२	४.२	१३.५
१९	सतर्कता केन्द्र	८	३	३७.५	०.०	२५.०	०.०	०.०	१२.५
२०	गृह	१९	७	३६.८	५.३	५.३	०.०	५.३	२१.१
२१	रक्षा	२३	८	३४.८	८.७	०.०	४.३	८.७	१३.०
२२	शिक्षा	२९	१०	३४.५	३.४	३.४	०.०	०.०	२७.६
२३	कृषि	३९	१३	३३.३	७.७	७.७	७.७	०.०	१०.३
२४	भौतिक	३३	११	३३.३	३.०	९.१	३.०	६.१	१२.१
२५	महान्दाराधिपत्ता	६	२	३३.३	०.०	३३.३	०.०	०.०	०.०
२६	भूमि	१३	४	३०.८	०.०	१५.४	०.०	७.७	७.७
२७	तथ्याङ्क कार्यालय	१०	३	३०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	३०.०
२८	परराष्ट्र	१९	५	२६.३	०.०	५.३	५.३	०.०	१५.८
२९	प्र.म. तथा	२७	७	२५.९	०.०	३.७	३.७	०.०	१८.५
३०	योजना आयोग	१४	२	१४.३	०.०	०.०	७.१	७.१	०.०
कुल		६६५	३१६	३९.५	४.५	८.७	५.९	५.३	२३.३

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date '२०७३/०५/१८'.



- २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने ६६५ वटा माइलस्टोनमध्ये मध्ये ५२ वटा माइलस्टोनको कार्य सुरु हुन सकेको छैन। कार्य सुरु नभएका माइलस्टोनको अवस्था विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्य सुरु हुन नसकेका माइलस्टोनको प्रतिशत सबैभन्दा बढी ७१ रहेको देखिएको छ भने दोस्रोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ३९ प्रतिशत र तेस्रोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय २९ प्रतिशत रहेको छ।
- अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल ट्रेडको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय गरी १४ वटा मन्त्रालय/ निकायको यस अबधिमा सुरु नभएका माइलस्टोन रहेको देखिएको छैन।

**लेखाचित्र: १२- सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सुरु नभएको प्रतिशत**

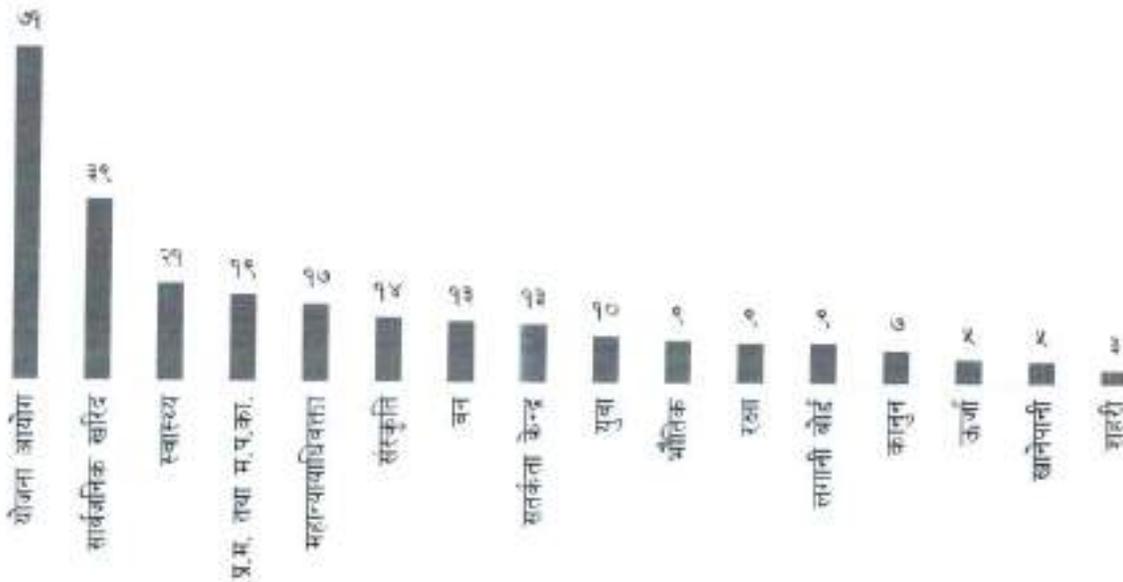

- २०८२ पुस महिनाभित्र सम्पन्न वा सुरु हुनुपर्नेमध्ये चालु अवस्थामा रही यस अबधिसम्म निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका ३१६ वटा र कार्य सुरु हुन नसकेका ५२ वटा गरी ३६८ वटा माइलस्टोनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका मन्त्रालय/निकायहरूले दर्शाएका कारण/समस्याहरू तल तालिकामा देखाइएको छ।

४६



तालिका: २७- लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारण/ समस्या

क्र.सं.	लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारण/समस्या	माइन्स्टोन संख्या	प्रतिशत
१	लक्ष्य उन्मुख रहेको	२३८	६४.५
२	कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्ब तयारी पूरा नभएको	३८	१०.३
३	बजेट व्यवस्थापन/ स्रोत सुनिश्चितता नभएको	२१	५.७
४	विपद	१५	४.१
५	जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन	१२	३.३
६	अन्तर तह/ मन्त्रालय/ निकाय समन्वय र स्वीकृति	८	२.२
७	विबाध तथा प्रक्रियामा जटिलता	८	२.२
८	कानून तर्जुमा / संशोधन हुन नसकेको	२	०.५
९	कार्यक्रमको पुनःसंरचना / पुनः प्रक्रिया आरम्भ गर्नु परेको	२	०.५
१०	निर्माण सामग्रीको अभाव	१	०.३
११	स्थान छुनोट / जग्गा प्राप्ति नभएको	१	०.३
१२	अन्य	२१	६.२
<b>कुल</b>		<b>३६९</b>	<b>१००</b>

नोट: १ वटा माइन्स्टोनको लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुमा २ वटा कारण उल्लेख भएको



- मन्त्रालय/निकायहरूले दर्शाए अनुसार मोडेलस्टोनको निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारण/समस्याहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्-

तालिका: २८- लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका मन्त्रालय/निकायगत कारण

क्र.सं	मन्त्रालय/निकाय	निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका कारणहरू												कुल
		१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१	प्र.म. तथा म.प.का.	३	२	०	१	१	२	०	०	०	०	०	०	१२
२	श्रम	११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	११
३	उद्योग	१	०	०	१	१	०	०	०	१	०	०	१	१३
४	ऊर्जा	३९	१	१	१	०	२	४	१	१	०	०	७	५७
५	कानून	१३	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१३
६	कृषि	१२	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१३
७	खापिपानी	३	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	७	११
८	गृह	४	२	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	७
९	परराष्ट्र	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५
१०	भूमि	०	०	०	१	१	०	२	०	०	०	०	०	४
११	भौतिक	८	१	२	१	१	०	०	०	०	०	०	०	१५
१२	महिला	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५
१३	पुनः	५	१	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	६
१४	रक्षा	१	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१०
१५	वन	३	५	४	०	१	०	१	०	०	०	१	०	१५
१६	शिक्षा	२	७	०	०	१	०	०	०	०	०	०	०	१०
१७	धर्म	१८	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१९
१८	संस्कृति	८	३	७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१८
१९	सङ्घीय मामिला	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५
२०	सञ्चार	७	३	१	०	२	२	०	०	०	०	०	०	१५
२१	राष्ट्री	१३	०	१	१	१	१	०	०	०	१	०	३	२१
२२	स्वास्थ्य	६	५	०	१	१	१	०	०	०	०	०	०	१५
२३	योजना प्रायोग	१२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१२
२४	तटस्थ कार्यलय	२	०	१	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३
२५	सतकंता केन्द्र	०	०	०	४	०	०	०	०	०	०	०	०	४
२६	कार्यक्रमिक क्षरिद	११	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४	१५
२७	लागानी बोर्ड	१७	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१७
२८	नेपाल ट्रेड	०	५	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	६
२९	महालेखा	०	०	१	०	१	०	१	०	०	०	०	०	३
कुल		२३८	३८	२१	१५	१२	८	८	२	२	१	१	२३	३६६

१. लक्ष्य उन्मुख रहेको २. कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्व तयारी पूरा नभएको ३. बजेट व्यवस्थापन/ स्रोत सुनिश्चितता नभएको ४. विपद ५. जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन ६. अन्तर तह/ मन्त्रालय/ निकाय समन्वय र स्वीकृति ७. विवाद तथा प्रक्रियागत जटिलता ८. कानून तर्हुमा / संशोधन हुन नसकेको ९. कार्यक्रमको पुनःसंरचना / पुनः प्रक्रिया आरम्भ गर्न परेको १०. निर्माण सामग्रीको अभाव ११. स्थान छनोट / जग्गा प्राप्ति नभएको १२. अन्य

४८



- माथिको तालिका अध्ययन गर्दा लक्ष्य उन्मुख रहेका माइलस्टोनको संख्या २३८ रहेको छ। निर्धारित लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुको कारणमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले "लक्ष्य उन्मुख रहेको" भनी उल्लेख गरेका माइलस्टोनको प्रगति विश्लेषण गर्दा लक्ष्य १ भई शून्य प्रगति भएका माइलस्टोन ६९ वटा रहेका र लक्ष्य १ भन्दा बढी भई शून्य प्रगति भएका माइलस्टोन ४६ वटा देखिएका छन्। कुल लक्ष्य उन्मुख माइलस्टोनमध्ये १२८ वटा माइलस्टोनको प्रगति २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिएको छ भने ५३ वटा माइलस्टोनको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको देखिएको छ।

तालिका: २९- लक्ष्य उन्मुख कारण उल्लेख भएका माइलस्टोनको प्रगति

प्रगति प्रतिशत	माइलस्टोनसंख्या
० प्रतिशत प्रगति (लक्ष्य १)	६९
० प्रतिशत प्रगति (लक्ष्य १ भन्दा बढी)	४६
२० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति	१३
२०-४० प्रतिशत प्रगति	२२
४०-६० प्रतिशत प्रगति	३२
६०-८० प्रतिशत प्रगति	३९
८० भन्दा बढी प्रतिशत प्रगति	१४
<b>कुल</b>	<b>२३८</b>

- लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा हुन नसक्नु प्रमुख कारणको रूपमा रहेको छ। स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयारीमा विलम्ब, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विलम्ब, लागत इष्टिमेट स्वीकृत हुन बाँकी जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुन नसकेकोले कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। समीक्षा अवधिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकेका कारण ३८ वटा माइलस्टोनले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको देखिएको छ।
- पुस महिनाभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने विगत ३ वर्षको माइलस्टोनको प्रगति स्थिति तुलना गर्दा २०८० पुसमा माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत २४.४३ रहेको थियो। २०८१ पुसमा उक्त प्रतिशत ६.४७ अङ्कले वृद्धि भएता पनि २०८२ पुसमा २.२ अङ्कले घट्न गई २८.७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न भएको देखिन्छ। २०८२ भाद्र महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र चालु आर्थिक वर्षमा प्रकृयागतभन्दा नतिजामूलक माइलस्टोनको बाहुल्यताको कारण माइलस्टोनको सम्पन्न प्रतिशत घट्न गएको देखिन्छ। साथै अर्थ मन्त्रालयको च.नं. ११६, मिति





## ८. सुझावहरू

माथि उल्लेखित तथ्याङ्क एवम् विश्लेषण समेतबाट मन्त्रालय/निकायहरूले मुख्यतः निम्न विषयहरूमा ध्यान दिएमा कार्यसम्पादनलाई थप नतिजामुखी र परिणाममुखी बनाउन सक्ने देखिन्छः

- आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै वार्षिक खरिद योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने, लागत अनुमान तयार पार्ने, बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि वा सञ्चालन ढाँचा तयार गर्ने तथा अध्ययन र अनुसन्धान जस्ता पूर्वतयारीका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्दछ। तोकिएको समयमा यस्ता कार्यहरू सम्पन्न हुन नसक्दा पछिल्ला चरणमा कार्यभार बढ्ने हुँदा बैकल्पिक कार्ययोजना तयार गरी मूल कार्ययोजनामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी ती कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्छ।
- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय आयोजना बैकको कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ गर्न आवश्यक देखिएको छ। मन्त्रालय तथा निकायहरूले वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्ताव गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको स्वीकृति चरणमै स्रोत सुनिश्चितता कायम गर्ने तथा स्रोत सुनिश्चितता नभएका वा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, स्थान छनोट र जग्गा प्राप्तिजस्ता पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्दछ।
- बजेटमा घोषणा गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा स्रोत सुनिश्चितता हुने गरी कार्य अगाडि बढाउने सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव हुने अवस्थाको निराकरण गर्न स्रोतको पूर्वमूल्याङ्कन गरी मात्र कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउन उपयुक्त हुन्छ।
- चालु आर्थिक वर्षमा सुरु हुने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता समयमै गरिनु पर्दछ। साथै बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोत अनुमान वास्तविक र यथार्थ नजिक हुनुपर्दछ।
- स्रोत सुनिश्चितता र सीमित बजेटको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा सर्वप्रथम अनिवार्य दायित्वहरूको भुक्तानी तथा विकास सहायता प्राप्त कार्यक्रमहरू र मुख्य प्रभाव पार्ने क्रमागत आयोजनाहरूका लागि आवश्यक रकम छुट्याउनुपर्दछ। साथै, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेट अवण्टा राख्ने प्रवृत्तिमा नियमन, रकमान्तर, बजेट रोक्का तथा समर्पणजस्ता विषयहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै निरन्तर सुधार गर्नुपर्छ। त्यसपश्चात् मात्र नयाँ प्रस्तावित तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ।
- वर्षात् वा महामारीजस्ता प्रतिकूल अवस्थामा समेत आयोजना/कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित नभई कार्यालयबाट सञ्चालन गर्न सकिने क्रियाकलापहरूका आधारभूत कार्यहरू आर्थिक

४१



वर्षको प्रारम्भिक महिनाहरूमै सम्पन्न गरी स्थलगत कार्यन्वयन हुने समयमा कार्यचाप न्यून गर्दै समग्र कार्यन्वयन प्रभावकारितालाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ।

- आयोजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, खरिद तथा निर्माण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउने, छनोट भएका सबै आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा कार्यन्वयनमा देखिएका बाधा-अवरोधहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवहार, प्रणाली र नीति अवलम्बन गरिएमा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
- अन्तर-तह, मन्त्रालय तथा निकायबीचको समन्वयको अभावमा सम्बन्धित निकायबाट माग गरिएका राय, सहमति आदि समयमै प्राप्त नहुनु, स्वीकृति वा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरूमा ढिलाइ हुनु तथा अन्य निकायबाट सहमति नमिल्नुजस्ता कारणले कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न प्रचलित ऐन-कानूनमा व्यवस्था भएका समन्वयकारी संयन्त्रहरूलाई अनिवार्य क्रियाशील बनाउने तथा विषयगत समन्वयको तहगत व्यवस्था कायम गरी अन्तर-तह र अन्तर-निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
- स्थान छनोट तथा जग्गा प्राप्तिमा देखिएका प्रक्रियागत ढिलाइको समस्या विगतदेखि नै दोहोरिँदै आएको छ। आयोजना छनोट गर्दा स्थान निकयोल नगरी नै स्वीकृति दिने प्रचलनले विकास व्यवस्थापनको कमजोर अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यस्तो प्रक्रियाको अन्त्य हुन जरूरी छ।
- मन्त्रालयहरूले समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासहरू तथा मातहत निकायहरूलाई जारी गरेका निर्देशनहरूको जानकारी अनुगमनकारी उच्च निकायहरू (जस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग आदि) लाई नियमित रूपमा प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले विषयगत जानकारी उच्च तहमा पुग्ने, सबैमा एकरूप बुझाइ कायम हुने तथा संस्थागत अभिलेखीकरण हुने लाभ प्राप्त हुन्छ।
- आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा देखिएका र सम्बन्धित निकायबाट समाधान हुन नसक्ने समस्याहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तत्काल समस्या समाधान तथा विपद् समन्वय शाखा र सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने महाशाखा/शाखामा जानकारी गराई समस्या निराकरणको पहल गर्नुपर्छ।
- सार्वजनिक व्यवस्थापन र सुशासनको क्षेत्रमा तत्काल सुधारको कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरूको कडाइका साथ पालना सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, कार्यजिम्मेवारी निर्धारण गर्दा कार्यसम्पादन र नेतृत्वको मूल्याङ्कन गरी नतिजामुखी कार्यसम्पादन प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्दछ।

8008

४२

21/11/19
